-ACUSE-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

UAEM 0530
09 ABR 2025
RECTORÍA 2023 - 2029

Cuernavaca, Morelos, 07 de abril de 2025
CGPyDS/333/2025

S.E.P. 14324
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
08 ABR. 2025
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL

DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL (DGESUI)

P R E S E N T E

En el marco del **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)**, por este medio hago llegar a Usted, en versión electrónica (USB), en formato Excel y PDF debidamente firmados los reportes descriptivos y fotográficos del informe de avance trimestral correspondientes al **primer trimestre** (enero, febrero y marzo) 2025, de las obras apoyadas con los recursos del fondo, como a continuación se describe:

UAEM DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
09 ABR 2025
RECIBIDO
HORA: 14:23 FOLIO: 159

FAM 2024

1. Reporte descriptivo de avance de obra y reportes fotográficos.
2. Actas Administrativas y Actas de Entrega Recepción del proyecto *"Construcción de barda perimetral y obra complementaria en unidades académicas del Campus Norte y Campus Oriente".*
3. Actas Administrativas de Entrega Recepción del proyecto *"Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos".*
4. Actas Administrativas y Actas de Entrega Recepción del proyecto *"Mejoras de espacios académicos en materia de inclusión y protección civil para el Campus Norte".*

Se incluyen además las líneas de captura de las devoluciones a la TESOFE de capital no ejercido, así como de los rendimientos financieros, lo anterior conforme a las fechas establecidas.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
09 ABR 2025
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

S.E.P. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
08 ABR. 2025
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
1 USB

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

FAM 2025

1. Reporte descriptivo del informe de avance trimestral.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Por una humanidad culta

U A E M

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

DR. JUAN MANUEL RIVAS GONZÁLEZ
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

C.i.p. Dr. Carlos Iván Moreno Arellano. Director General de Educación Superior Universitaria e Intercultural. Para su conocimiento.
Dra. Viridiana Aydeé León Hernández. Rectora. UAEM. Mismo fin.
Dra. María del Carmen Torres Salazar. Directora General de Planeación y Desarrollo Institucional. UAEM. Mismo fin.
Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández. Director General de Infraestructura. UAEM. Mismo fin.
Archivo.

JMRG/MCTS/ANPM/EEZ*dgsv

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

2024

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Autónoma del Estado de Morelos**

Entidad federativa: **Morelos**

Clave 911: 17MSU0017P

RESPONSABLES

Planeación	Obras y Mantenimiento
Nombre: Dr. Juan Manuel Rivas González Cargo: Responsable del Proyecto. Teléfono: (777) 3 29 70 00 Ext. 7033 y 4312 Correo electrónico: cgpyds@uaem.mx	Nombre: Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández Cargo: Director General de Infraestructura Teléfono: (777) 3 29 70 00 Ext. 3136 Correo electrónico: oscar.lastra@uaem.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	ID de acuerdo con el SIFAM	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto: Obra nueva (construcción)	Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable	Monto autorizado (A)	CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: No. (s) de Contrato (s)	Fechas Programadas: INICIO	TÉRMINO	Monto Contratado (B)	Contratista	Monto no Contratado(C) Diferencia entre Autorizado y Contratado C=A-B	Monto ejercido (D)	Remanente (E) =B-D	Espacios físicos/equipamiento (programado/autorizado): Nombre del Espacio/equipo	Cantidad	Metros Cuadrados	Acciones que sustentan el avance	% de avance	Fechas Reales: Inicio	Término	Observaciones	Reintegro a la TESOFE: Línea de Captura	Fecha de pago	Importe	Actas: Entrega-Recepción (Acta finiquito) MONTO	Fecha	Acta Administrativa de Entrega-Recepción (formato DGESUI) MONTO	Fecha
																						GLOBAL DEL PROYECTO										
1	5	**Construcción de barda perimetral y obra complementaria en unidades académicas del Campus Norte y Campus Oriente**	X						$ 8,055,000.00	07-15520-OS-2024	09-ago-24	15-nov-24	$ 785,426.01	Central de Construcciones e Impermeabilizaciones S.A. de C.V, representante legal C. Ramón Alberto Pérez López	$ 6,983.66	$ 8,048,016.34	$ 6,983.66	Facultad de Medicina	1	202.48	1 .- Trabajos preliminares 2 .- Cimentación 3 .- Trabajos de albañilerías en la fabricación de muros 4.- Limpieza en el retiro de materiales	100%	11-jun-24	31-dic-24	En el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2024, la institución realizo las siguientes acciones durante el primer trimestre del año 2025. Proyecto de Construcción de barda perimetral y obra complementaria en unidades académicas del Campus Norte y Campus Oriente una vez concluidos los trabajos físicos y las obligaciones financieras, se formalizaron las Actas Administrativas de Entrega Recepción y las Actas Entrega Recepción (acta finiquito) de las Unidades Académicas beneficiadas.				$8,048,016.34	26/12/2024	$ 8,048,016.34	26/12/2024
											17-jul-24	15-nov-24	$ 2,582,590.33	Central de Construcciones e Impermeabilizaciones S.A. de C.V, representante legal C. Ramón Alberto Pérez López				Facultad de Estudios Sociales de Temixco	1	376.22	5 - Trabajos preliminares 6 - Cimentación 7.- Trabajo de albañilería en la fabricación de muros 9.- Limpieza en retiro de materiales	100%									
										Contrato 02-15520-OS-2024 Convenio modificatorio al contrato 02-15520-OS-2024	17-jul-24	15-nov-24	$ 4,680,000.00	C. Gregorio Alexander Bustos García				Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec	9	320.00	10.- Trabajos preliminares 11.- Cimentación 12.- Trabajos de albañilería en la fabricación de muros 13.- Trabajos de canalización 14.- Retiro de materiales de producto de obra 15.- Trabajos preliminares de excavación en perímetro de base de plataforma 16.- Trabajos de albañilería en la fabricación de zapatas de concreto	100%									

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Autónoma del Estado de Morelos**

Entidad federativa: **Morelos**

Clave 911: 17MSU0017P

RESPONSABLES

Planeación

Nombre: Dr. Juan Manuel Rivas González
Cargo: Responsable del Proyecto.
Teléfono: (777) 3 29 70 00 Ext. 7033 y 4312
Correo electrónico: cgpyds@uaem.mx

Obras y Mantenimiento

Nombre: Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Cargo: Director General de Infraestructura
Teléfono: (777) 3 29 70 00 Ext. 3136
Correo electrónico: oscar.lastra@uaem.mx

| | | |

2024

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración:
31/03/2025

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Nombre: **Universidad Autónoma del Estado de Morelos**

Entidad federativa: **Morelos**

Clave 911: 17MSU0017P

RESPONSABLES

Planeación	Obras y Mantenimiento
Nombre: Dr. Juan Manuel Rivas González Cargo: Responsable del Proyecto. Teléfono: (777) 3 29 70 00 Ext. 7033 y 4312 Correo electrónico: cgpyds@uaem.mx	Nombre: Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández Cargo: Director General de Infraestructura Teléfono: (777) 3 29 70 00 Ext. 3136 Correo electrónico: oscar.lastra@uaem.mx

											GLOBAL DEL PROYECTO	
Mejoras de espacios académicos en materia de incluisión protección civil para el Campus Norte			$ 1,530,000.00			Facultad de Arquitectura	2	22.04	1.- Trabajos preliminares 2.- Trabajos de albañileria y desarrollo de estructura en área de rampas 3.- Colocación de instalación eléctrica para alumbrado, postes y luminarias, así como la señalética correspondiente, realizando al final limpieza de obra, para la Facultad de Arquitectura y la Escuela de Turismo.	100%	El proyecto Mejoras de espacios académicos en materia de inclusión protección civil para el Campus Norte se encuentra concluido financiera y fisicamente por lo que se formalizaron las Actas Administrativas de Entrega Recepción y las actas Entrega Recepción (acta finiquito) de las seis Unidades Académicas beneficiadas.
						Escuela de Turismo	1	18.00				
	Contrato 08-15520-OS-2024		$ 720,000.00			Instituto de Ciencias de la Educación	3	9.36	4.- Delimitación y protección del área de trabajo con tapial de madera, trazo y nivelación, desmantelamiento de estructura metálica (escalera), despalme de terreno en área jardinada 5.- Desarrollar trabajos de albañileria consistentes en la fabricación de excavación para alojar cimentación de concreto armado, y muros de contención con mampostería de piedra de la región, considerando plantillas de concreto pobre como base, reubicación de registros de instalaciones existentes, en cimentación de concreto se fijaran placas de acero para recibir la colocación de escalera metálica considerando además la adecuación de la estructura existente a sus nuevas dimensiones, rellenos con material inerte hasta alcanzar nivel de proyecto, fabricación de firmes de concreto simple, escalones de concreto armado, colocación de barandal de acero con doble pasamanos, para el Instituto de Ciencias de la Educación.	100%	
	Convenio modificatorio al contrato 08-15520-OS-2024	09-ago-24	15-nov-24	-	MC Construcciones y Desarrollos S.A. de C.V, representante legal C. Manuel Castañeda Méndez							

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración:
31/03/2025

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Autónoma del Estado de Morelos**

Entidad federativa: **Morelos**

Clave 911: 17MSU0017P

RESPONSABLES

Planeación	Obras y Mantenimiento
Nombre: Dr. Juan Manuel Rivas González Cargo: Responsable del Proyecto. Teléfono: (777) 3 29 70 00 Ext. 7033 y 4312 Correo electrónico: cgpyds@uaem.mx	Nombre: Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández Cargo: Director General de Infraestructura Teléfono: (777) 3 29 70 00 Ext. 3136 Correo electrónico: oscar.lastra@uaem.mx

3	3		X	$ 4,635,000.00		$ 720,000.00			$ 82,830.73	$ 4,287,845.35	$ 347,154.65	Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería	3	219.32	6.- Trabajos preliminares, delimitación de área de trabajo, nivelación de superficie 7.- Trabajos en rampas considerando excavación, mamposteria de piedra, relleno de material, fabricación y colocación de barandal de herreria	100%	11-jun-24	31-dic-24	Finalmente, en apego al artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera para Entidades federativas y Municipios, durante este periodo la institución realizo los siguientes reintegros a la Tesorería de la Federación (TESOFE) correspondientes al ejercicio fiscal 2024. 1.- Reintegro del capital no ejercido por un monto de $ 354,148.83 (trescientos cincuenta y cuatro mil ciento cuarenta y ocho pesos 83/100 m.n.), mediante la línea de captura 0025AAGF446771132468, la cual contempla los siguientes montos: • $6,983.66 (seis mil noveciento ochenta y tres pesos 66/100 m.n.) de "Construcción de barda perimetral y obra complementaria en unidades académicas del Campus Norte y Campus Oriente". • $10.52 (diez pesos 52/100 m.n.) d "Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos". • $347,154.65 (trescientos cuarenta siete mil ciento cincuenta y cuatro pesos 65/100 m.n.), del proyecto: "Mejoras de espacios académicos en materia de inclusión protección civil para el Campus Norte". 2.- Entero a la TESOFE de los productos financieros generados de la cuenta especifica 1272470193, por un monto de $ 898.00 (ochocientos noventa y ocho pesos 00/100 m.n.), realizado mediante línea de captura 0025AAFG431070975282. (se adjunta). Todas las acciones anunciadas con anterioridad, conllevan al cierre financiero y académico de los proyectos apoyados con los recursos del fondo.	$4,287,845.35	26/12/2024	$ 4,287,845.35	26/12/2024
												Centro de Investigación en Ciencias (CInC)	1	132.60	14.- Trabajos preliminares 15.- Trabajos de albañileria,excavación de terreno, asentamiento de muros de piedra, relleno hasta nivel	100%							
Mejoras de espacios académicos en materia de incluisión protección civil para el Campus Norte		03-15520-OS-2024	18-jul-24	15-nov-24	$ 997,169.27	C. Gregorio Alexander Bustos García						Facultad de Enfermería	1	105.48	8.- Trabajos preliminares 9.- Demoliciones manuales de firme de concreto, trinchera pluvial y muro de piedra 10.- Acarreos en carretilla de producto de la demolición y excavación 11.- Excavaciones a cielo abierto por medios manuales, mejoramiento de suelo con concreto ciclópeo, plantilla de concreto pobre, forjado de cimentación de concreto armado a base de zapatas aisladas, relleno de material 12.- Desarrollar estructura de escalera de emergencia con la habilitación, montaje y nivelado de placas de acero y estructura en perfiles misceláneos 13.- Muros de mampostería, reparación, perfilado y renivelación de piso de concreto, cambio de trayectoria de bajada pluvial existente, conexión y forjado de trinchera pluvial de concreto, reposición de piso de concreto armado con malla, escalones forjados de concreto, forjado de pasillo de concreto con juntas de contracción	100%							
					$16,216,277.00				**$89,824.91**	**$15,862,128.17**	**$354,148.83**											

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD **1**

Nombre de la obra: **Construcción de barda perimetral y obra complementaria en unidades académicas del Campus Norte y Campus Oriente. (Facultad de Medicina)**

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO




CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

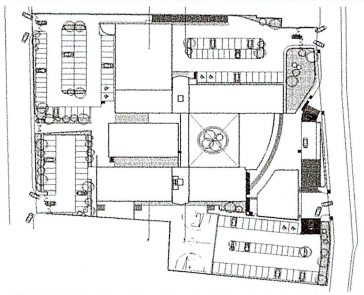

PLANTA DE CONJUTO

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Dirección Postal:
Calle Iztaccíhuatl esq. Leñeros s/n, Col. Los Volcanes Cuernavaca, Mor. CP 62350

FOTOS ANTES



Fachada de la Facultad de Médicina.

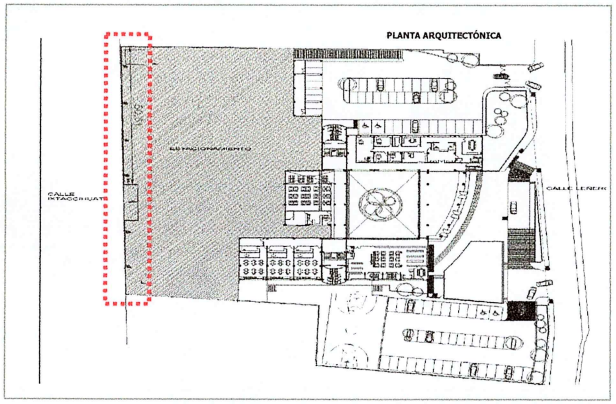

Planta arquitectónica del Área a intervenir donde se sitúan los trabajos para la Construcción de barda perimetral, en la Facultad de Medicina.


Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del primer trimestre 2025, corresponde a los espacios que se intervenieron mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRITPTIVO.



F1: Fachada poniente del sitio en el que se tienen incluidos la realización de trabajos de demolición, trabajos preliminares y trabajos de albañilerías, para la Construcción de barda perimetral, en la Facultad de Medicina.

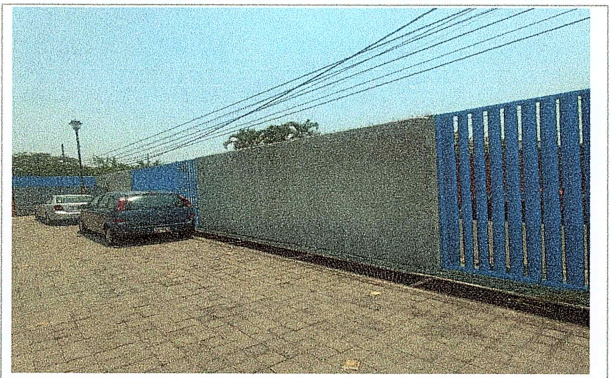

F1: Vista interior del área exterior en el que se ejecutaran trabajos de demolición, preliminares y de albañilerías, para la Construcción de barda perimetral, en la Facultad de Medicina.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD **1**

Nombre de la obra: **Construcción de barda perimetral y obra complementaria en unidades académicas del Campus Norte y Campus Oriente. (Facultad de Medicina)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

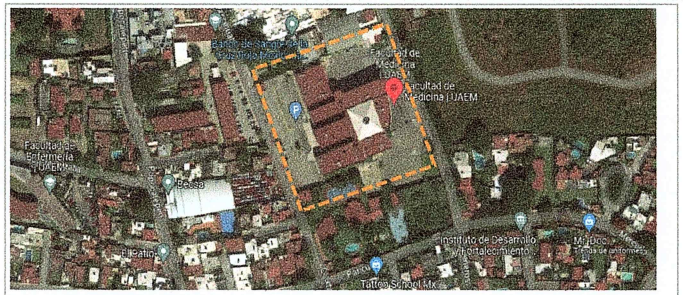

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

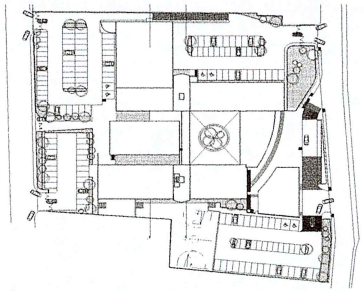

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Calle Iztaccíhuatl esq. Leñeros s/n, Col. Los Volcanes Cuernavaca, Mor. CP 62350

FOTOS DURANTE



F1: Se continuan con los Trabajos de Demolicion de Cimientos de Piedra, en la Facultad de Medicina.




F1: Se continuan con los Trabajos de Colocacion de Plantilla de concreto hecho en obra / Cimentacion, en la Facultad de Medicina.



F1: Se continuan con los Trabajos de Colocacion de concreto y acero de refuerzo para Zapata/Cimentacion, en la Facultad de Medicina.



F1: Se continuan con los Trabajos de Elaboracion de Cimentaciones de Mampostería con piedra de la region, en la Facultad de Medicina.

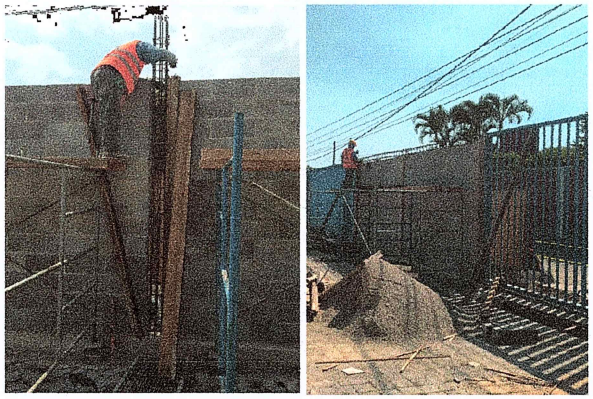

F1: Trabajos de suministro y colocacion de Cimbra Aparente Y Concreto Premezclado para estructura de Castillos y Cadenas, en la Facultad de Medicina.



F1: Trabajos de Suministro y colocacion de relleno de Material linerte, en la Facultad de Medicina.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD 1

Nombre de la obra: **Construcción de barda perimetral y obra complementaria en unidades académicas del Campus Norte y Campus Oriente. (Facultad de Medicina)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

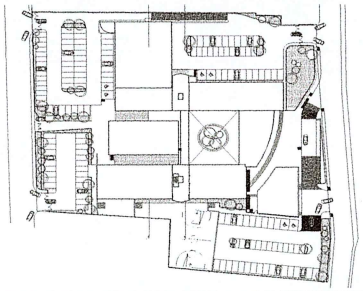


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Dirección Postal:
Calle Iztaccíhuatl esq. Leñeros s/n, Col. Los Volcanes Cuernavaca, Mor. CP 62350




F1: Trabajos Elaboracion de Canal Pluvial de concreto hecho en obra, en la Facultad de Medicina

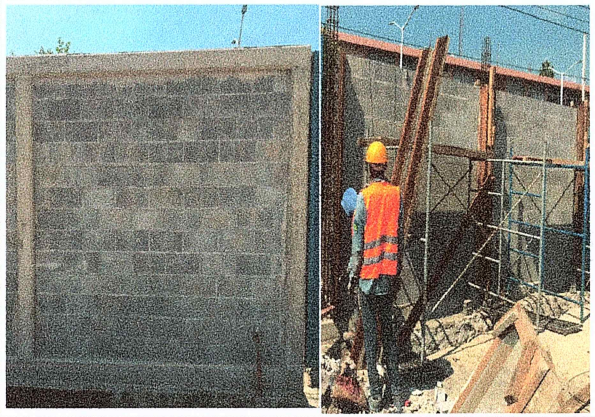

F1: Trabajos de colcoacion de esquinero de mandera de pino, en la Facultad de Medicina.

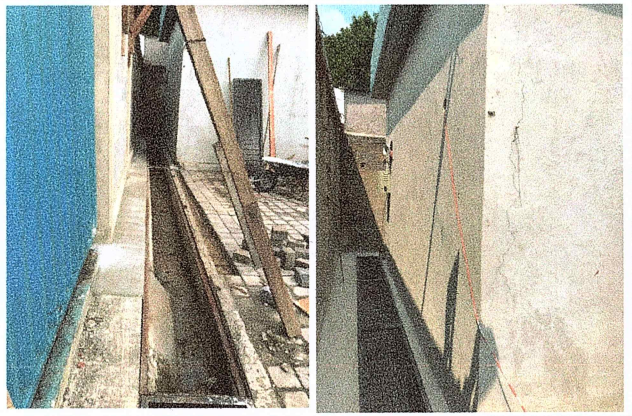

F1: Trabajos de recolocacion de Rejilla Metalica, en la Facultad de Medicina.

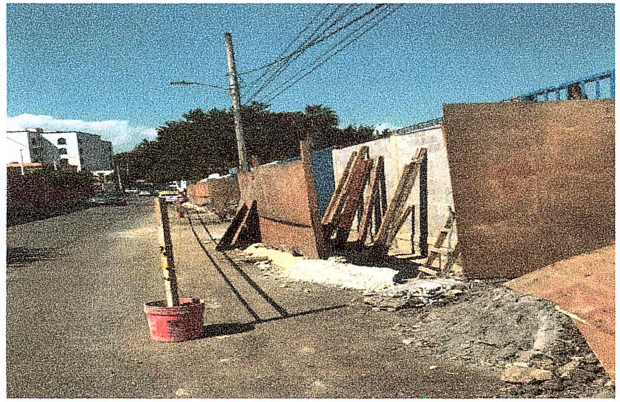

F1: Trabajos de Delimitacion de area de trabajo con Tapial triplay de pino, en la Facultad de Medicina.



F1: Trabajos de Excavacion por medios manuales, habilitado de acero, Cimbrado, Colado con concreto hecho en obra para Cadena de banqueta, en la Facultad de Medicina.



F1: Trabajos de Demolición de guarnición de concreto por medios manuales, en la Facultad de Medicina.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD 1

Nombre de la obra: **Construcción de barda perimetral y obra complementaria en unidades académicas del Campus Norte y Campus Oriente. (Facultad de Medicina)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO




CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

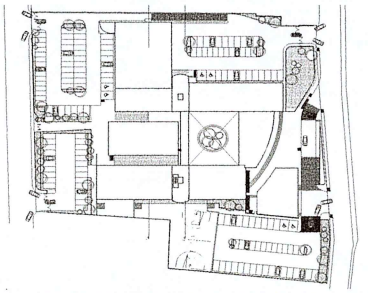

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Calle Iztaccíhuatl esq. Leñeros s/n, Col. Los Volcanes Cuernavaca, Mor. CP 62350

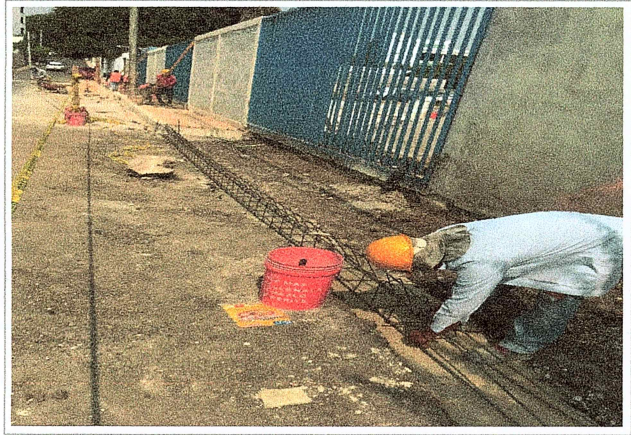

F1: Trabajos de Elaboración de Guarnición de concreto hecho en obra, así como la aplicación de Impermeabilizante integral para concreto, en la Facultad de Medicina.



F1: Trabajos de Bombeo de achique con bomba sumergible, en la Facultad de Medicina.



F1: Trabajos, suminstro, colocacion y compactacion de material inerte en para banqueta, en la Facultad de Medicina.



F1: Trabajos, Suminstro y Elaboracion de concreto reforzado con malla electrosoldada para banqueta, en la Facultad de Medicina.



F1: Se contininuan con los Trabajos de Recolocacion de Rejilla Metalica asi como la hechura y colocacion de rejilla/herreria de 40x60cm, en la Facultad de Medicina.



F1: Trabajos, Suministro y Aplicación de Pintura esmalte en superficies metálicas,en la Facultad de Medicina

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD **1**

Nombre de la obra: **Construcción de barda perimetral y obra complementaria en unidades académicas del Campus Norte y Campus Oriente. (Facultad de Medicina)**

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

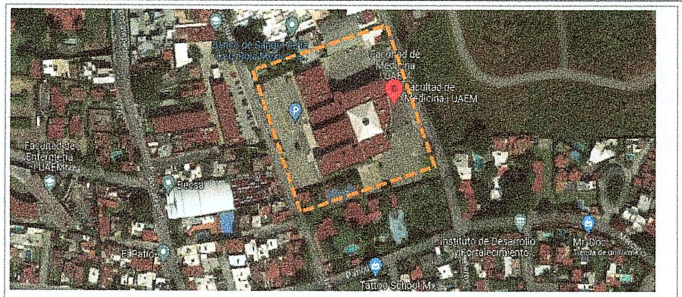


CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

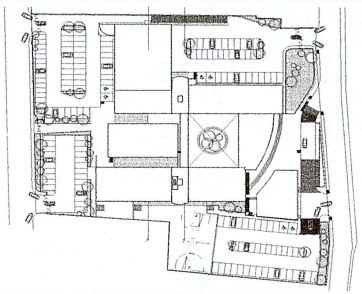

PLANTA DE CONJUTO

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Calle Iztaccíhuatl esq. Leñeros s/n, Col. Los Volcanes Cuernavaca, Mor. CP 62350



F1: Trabajos, Suministro y Aplicación de Pintura esmalte en superficies metálicas,en la Facultad de Medicina



F1: Trabajos de Limpieza Fina de Obra para entrega, en la Facultad de Medicina.


FOTOS DESPUÉS



F1: Vista interior del proyecto de Construcción de la barda perimetral de la Facultad de Medicina.



F1: Vista interior del proyecto de Construcción de la barda perimetral de la Facultad de Medicina.

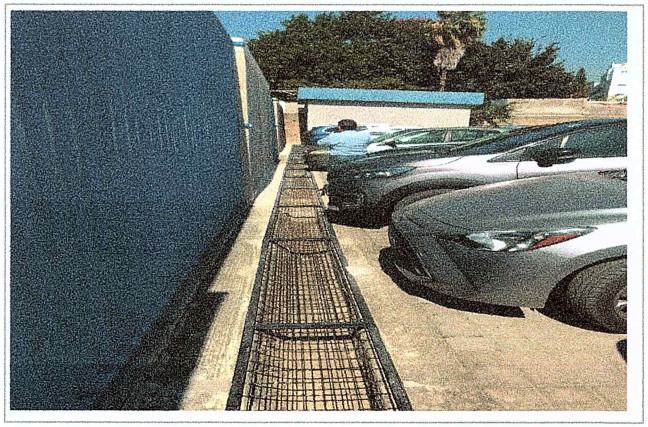

F1: Vista interior del proyecto de Construcción de la barda perimetral de la Facultad de Medicina.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance


100%

PRIORIDAD 1 Nombre de la obra: **Construcción de barda perimetral y obra complementaria en unidades académicas del Campus Norte y Campus Oriente. (Facultad de Medicina)**

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO




CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

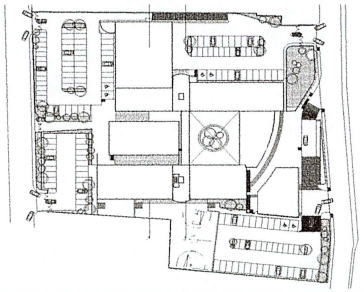


PLANTA DE CONJUTO


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Dirección Postal:
Calle Iztaccíhuatl esq. Leñeros s/n, Col. Los Volcanes Cuernavaca, Mor. CP 62350

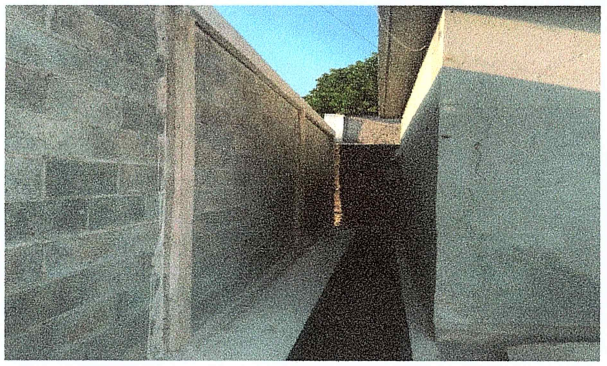


F1: Vista interior del proyecto de Construcción de la barda perimetral de la Facultad de Medicina.

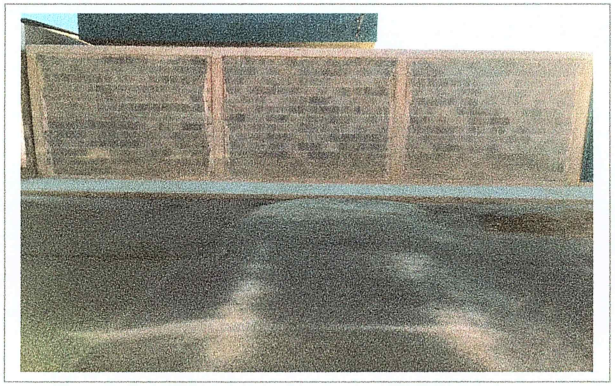

F1: Vista exterior del proyecto de Construcción de la barda perimetral de la Facultad de Medicina.

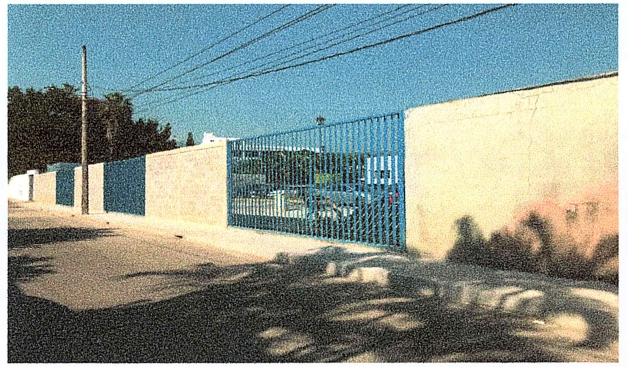


F1: Vista exterior del proyecto de Construcción de la barda perimetral de la Facultad de Medicina.

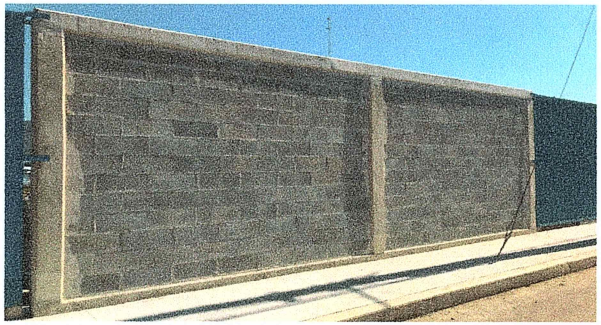

F1: Vista exterior del proyecto de Construcción de la barda perimetral de la Facultad de Medicina.



F1: Vista exterior del proyecto de Construcción de la barda perimetral de la Facultad de Medicina.

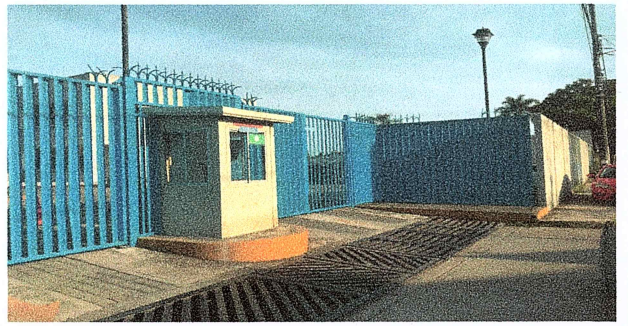

F1: Vista exterior del proyecto de Construcción de la barda perimetral de la Facultad de Medicina.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

100%

PRIORIDAD **1** Nombre de la obra: **Construcción de barda perimetral y obra complementaria en unidades académicas del Campus Norte y Campus Oriente. (Facultad de Estudios Sociales)**

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




[Priv. Xochimilco SN Col. Azteca, Temixco, Morelos

FOTOS ANTES



Fachada de la Facultad de Estudios Sociales

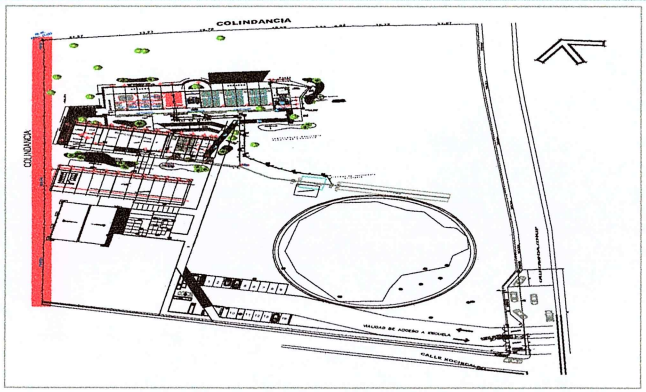

Planta arquitectónica donde se ubican las áreas a intervenir para la Construcción de barda perimetral, en la Facultad de Estudios Sociales de Temixco

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del primer trimestre 2025, corresponde a los espacios que se intervenieron mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRITPTIVO.



F1: Vista Frontal del sitio donde se realizaran parte de los trabajos de demolición, trabajos preliminares y trabajos de albañilerías, para la Construcción de barda perimetral, en la Facultad de Estudios Sociales de Temixco



F1: Imagen del área poniente en el que se ejecutaran parte de las acciones de demolición, preliminares y de albañilerías, en la consecución de la Construcción de barda perimetral, en la Facultad de Estudios Sociales de Temixco



F1: Vista poniente de un tramo del área en el que se realizaran trabajos de demolición, trabajos preliminares y trabajos de albañilerías, para la Construcción de barda perimetral, en la Facultad de Estudios Sociales de Temixco

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2025
EJERCICIO FISCAL	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

100%

PRIORIDAD 1 Nombre de la obra: **Construcción de barda perimetral y obra complementaria en unidades académicas del Campus Norte y Campus Oriente. (Facultad de Estudios Sociales)**

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

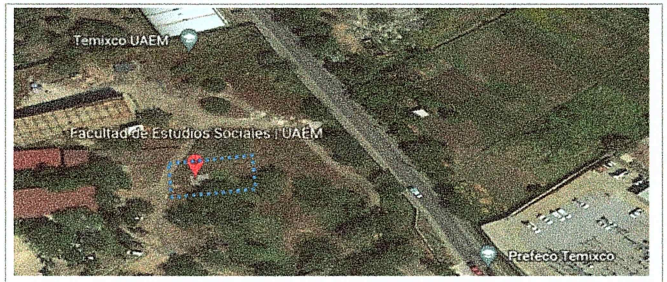

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Priv. Xochimilco SN Col. Azteca, Temixco, Morelos

FOTOS DURANTE



Se Continuan con los Trabajos de trazo por medios manuales estableciendo puntos de referencia, asi como afine de fondo de cepas, en la Facultad de Estudios Sociales de Temixco.

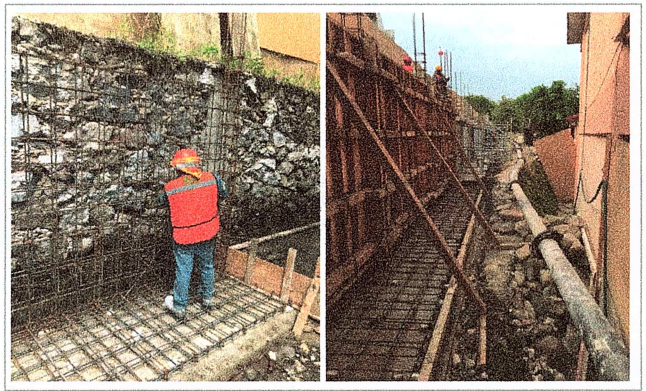

Se Continuan con los Trabajos de trazo por medios manuales estableciendo puntos de referencia, asi como afine de fondo de cepas, en la Facultad de Estudios Sociales de Temixco.




Se Continuan con los Trabajos de trazo por medios manuales estableciendo puntos de referencia, asi como afine de fondo de cepas, en la Facultad de Estudios Sociales de Temixco.



Se Continuan con los Trabajos, elaboracion de Muro de Block Hueco, en la Facultad de Estudios Sociales de Temixco.



Elaboracion de Cadena CD-2 con concreto hecho en obra, y Hechura de Gotero en cada esquina de Muro, en la Facultad de Estudios Sociales de Temixco.

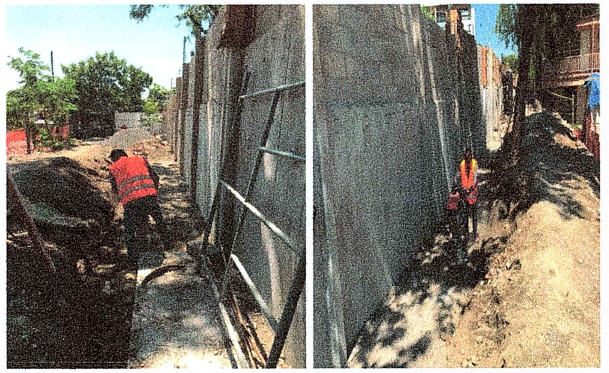

Trabajos de Suministro, Colocacion y Compactacion de Relleno Material Inerte Arenilla, en la Facultad de Estudios Sociales de Temixco.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

PRIORIDAD **1**

Nombre de la obra: **Construcción de barda perimetral y obra complementaria en unidades académicas del Campus Norte y Campus Oriente. (Facultad de Estudios Sociales)**

Porcentaje de avance

100%

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO




CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Priv. Xochimilco SN Col. Azteca, Temixco, Morelos

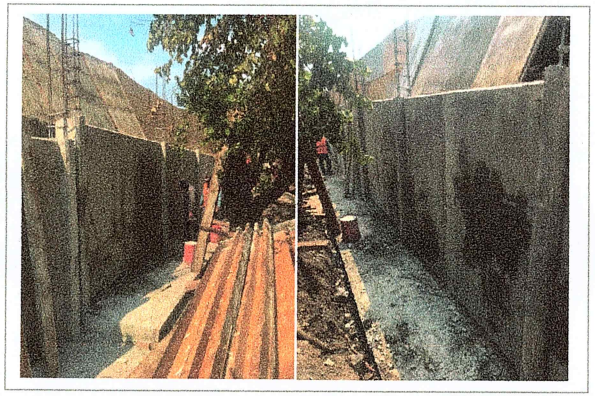


Trabajos de Descimbrado de Castillos, Zapata Corrida y Muro, en la Facultad de Estudios Sociales de Temixco.

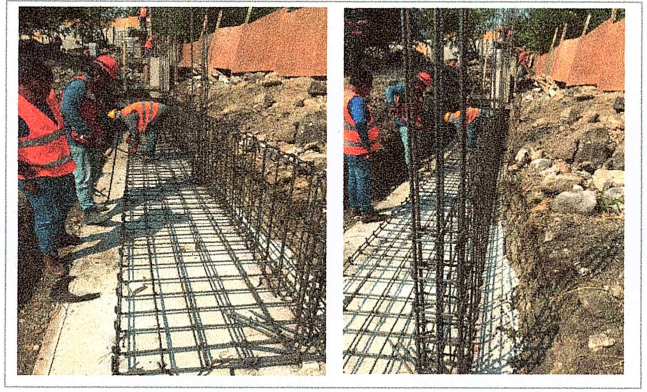

Se Continuan con los trabajos de Habilitacion de acero y Colocacion de Cimbra para Castillos, Zapata Corrida y Muro, en la Facultad de Estudios Sociales de Temixco.




Se Continuan con los trabajos de Elaboracion de Concreto hecho en obra con impermeabilizante integral (aditivo), para Castillos, Zapata Corrida y Muro, en la Facultad de Estudios Sociales de Temixco.

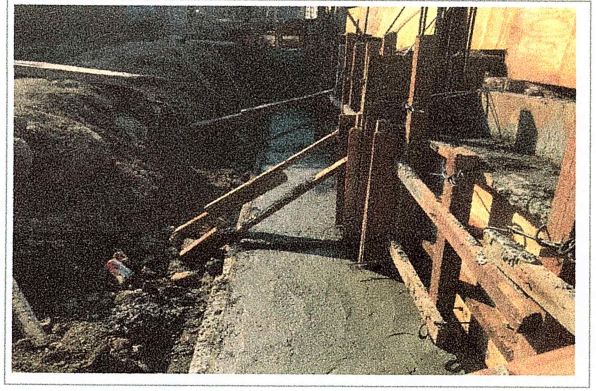

Se Continuan con los trabajos de Elaboracion de Concreto hecho en obra con impermeabilizante integral (aditivo), para Castillos, Zapata Corrida y Muro, en la Facultad de Estudios Sociales de Temixco.



Se Continuan con los Trabajos, elaboracion de Muro de Block Hueco, en la Facultad de Estudios Sociales de Temixco.

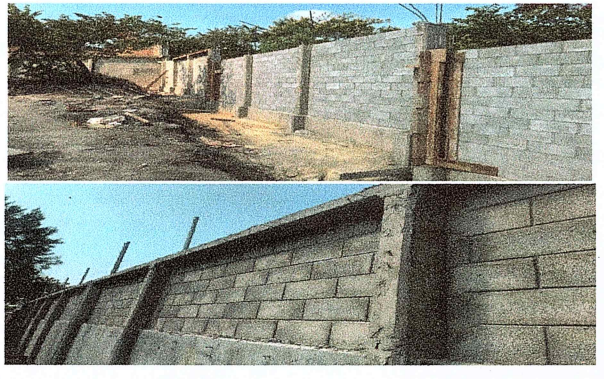

Trabajos Elaboracion de Cadena CD-2 con concreto hecho en obra, y Hechura de Gotero en cada esquina de Muro, en la Facultad de Estudios Sociales de Temixco.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

100%

PRIORIDAD 1 Nombre de la obra: **Construcción de barda perimetral y obra complementaria en unidades académicas del Campus Norte y Campus Oriente. (Facultad de Estudios Sociales)**

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO




CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Priv. Xochimilco SN Col. Azteca, Temixco, Morelos

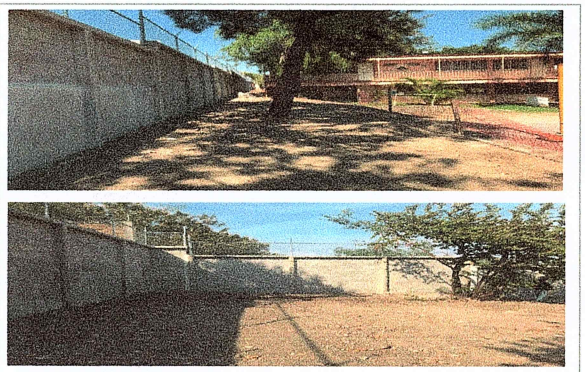

Trabajos de Suministro, Colocación Malla Ciclónica Galvanizada sobre Barda Perimetral, en la Facultad de Estudios Sociales de Temixco.

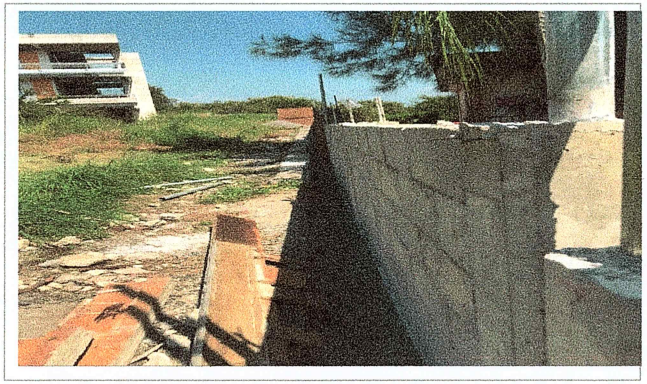


Trabajos de Suministro, Colocación de cama filtrante con Tezontle, en la Facultad de Estudios Sociales de Temixco.



Trabajos de Suministro, Colocacion y Compactacion de Relleno Material Inerte Arenilla, y colocación de relleno con material producto de la excavacion, en la Facultad de Estudios Sociales de Temixco.



Trabajos, Elaboración de Muro de Piedra de la region, en la Facultad de Estudios Sociales de Temixco.

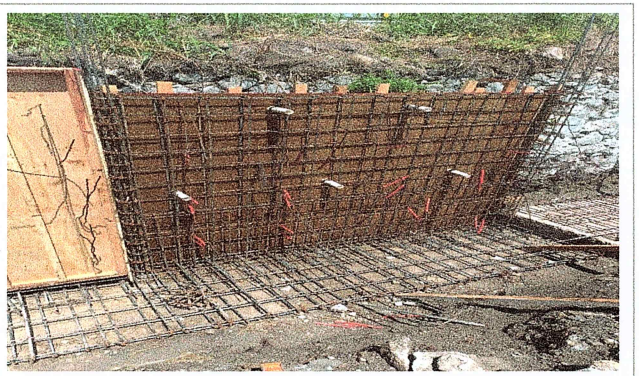

Trabajos, Suministro, Colocación de malla sintetica y Tuberia de PVC Para Dren de muro-concreto, en la Facultad de Estudios Sociales de Temixco.



Trabajos, Suministro, Colocación de Tapial de con malla de polietileno, en la Facultad de Estudios Sociales de Temixco.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2025
EJERCICIO FISCAL	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

100%

PRIORIDAD 1 Nombre de la obra: **Construcción de barda perimetral y obra complementaria en unidades académicas del Campus Norte y Campus Oriente. (Facultad de Estudios Sociales)**

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Priv. Xochimilco SN Col. Azteca, Temixco, Morelos



Trabajos, Bombeo de achique con Bomba sumergible, en la Facultad de Estudios Sociales de Temixco.

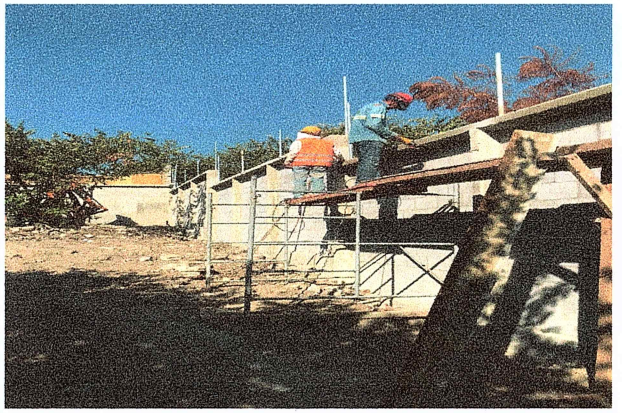


Trabajos, Suministro, Colocación Malla Ciclónica Galvanizada sobre Barda Perimetral, en la Facultad de Estudios Sociales de Temixco.

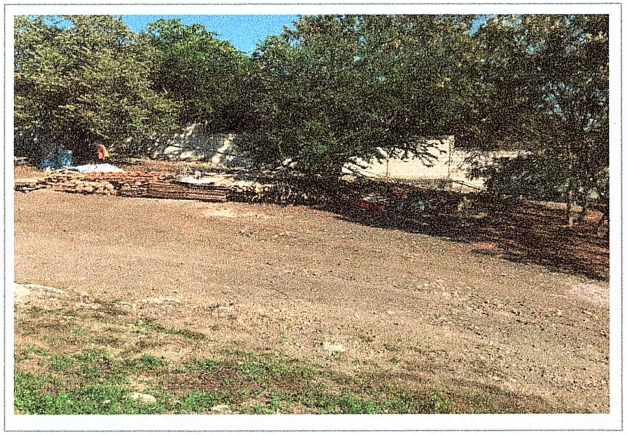

Trabajos de Limpieza fina de obra en sitio de los trabajos realizados para entrega, en la Facultad de Estudios Sociales de Temixco.





Trabajos de Limpieza fina de obra en sitio de los trabajos realizados para entrega, en la Facultad de Estudios Sociales de Temixco.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

100%

PRIORIDAD **1** Nombre de la obra: **Construcción de barda perimetral y obra complementaria en unidades académicas del Campus Norte y Campus Oriente. (Facultad de Estudios Sociales)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

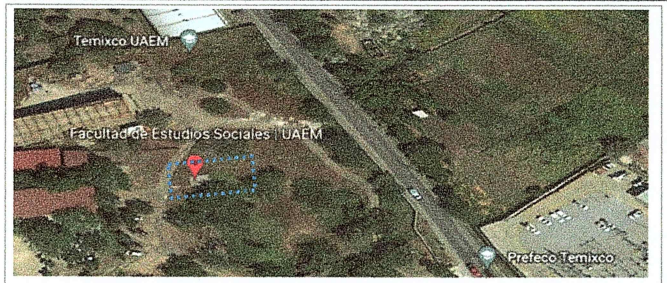

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

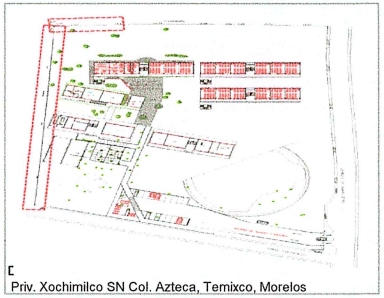

Priv. Xochimilco SN Col. Azteca, Temixco, Morelos


FOTOS DESPUÉS



Vista 1 del proyecto de Construcción de barda perimetral, en la Facultad de Estudios Sociales de Temixco.




Vista 2 del proyecto de Construcción de barda perimetral, en la Facultad de Estudios Sociales de Temixco.

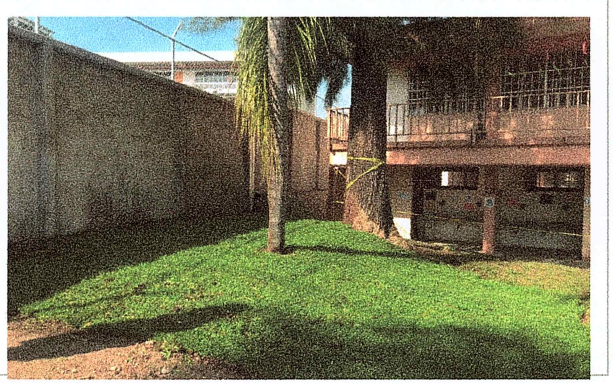


Vista 3 del proyecto de Construcción de barda perimetral, en la Facultad de Estudios Sociales de Temixco.



Vista 4 del proyecto de Construcción de barda perimetral, en la Facultad de Estudios Sociales de Temixco.

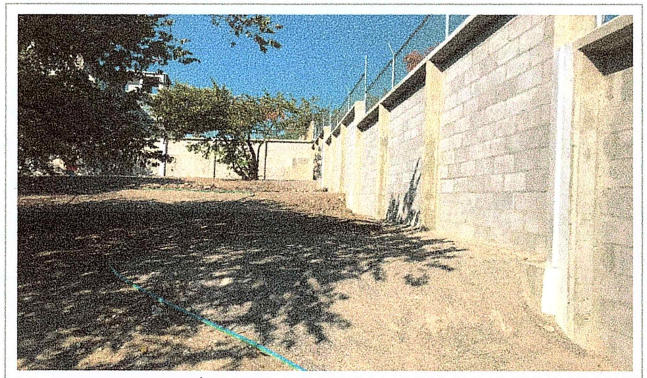

Vista 5 del proyecto de Construcción de barda perimetral, en la Facultad de Estudios Sociales de Temixco.

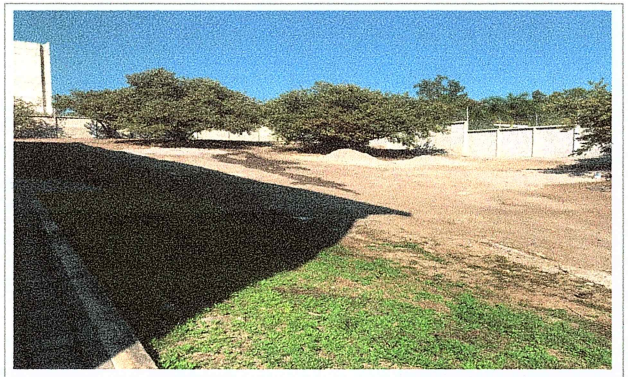

Vista 6 del proyecto de Construcción de barda perimetral, en la Facultad de Estudios Sociales de Temixco.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2025
EJERCICIO FISCAL	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

PRIORIDAD **1** Nombre de la obra: **Construcción de barda perimetral y obra complementaria en unidades académicas del Campus Norte y Campus Oriente. (Facultad de Estudios Sociales)**

Porcentaje de avance

100%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

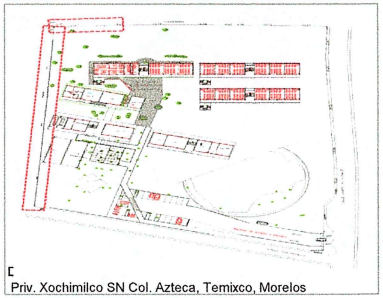


Priv. Xochimilco SN Col. Azteca, Temixco, Morelos



Vista Exterior, del proyecto de Construcción de barda perimetral, en la Facultad de Estudios Sociales de Temixco.



Vista Exterior, del proyecto de Construcción de barda perimetral, en la Facultad de Estudios Sociales de Temixco.

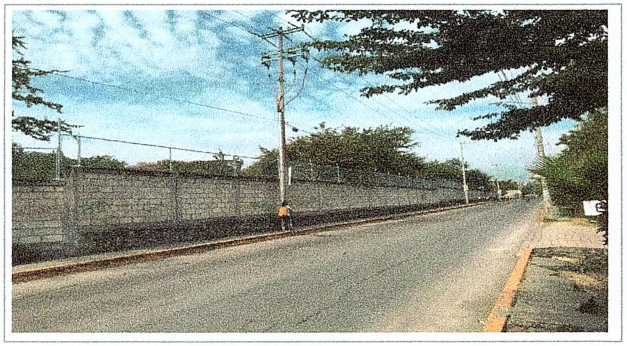

Vistas exteriores, del proyecto de Construcción de barda perimetral, en la Facultad de Estudios Sociales de Temixco.



Vistas exteriores, del proyecto de Construcción de barda perimetral, en la Facultad de Estudios Sociales de Temixco.



Vistas exteriores, del proyecto de Construcción de barda perimetral, en la Facultad de Estudios Sociales de Temixco.



Vistas exteriores, del proyecto de Construcción de barda perimetral, en la Facultad de Estudios Sociales de Temixco.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance


100%

PRIORIDAD **1** Nombre de la obra: **Construcción de barda perimetral y obra complementaria en unidades académicas del Campus Norte y Campus Oriente. (Escuela de Estudios Superiores Jonacatepec)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

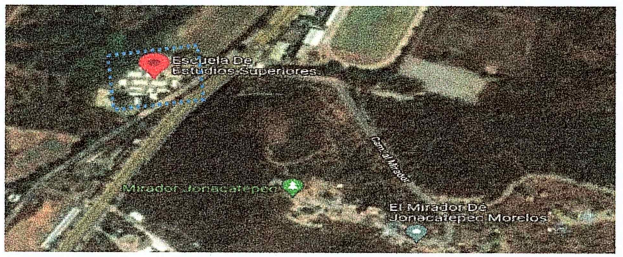

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

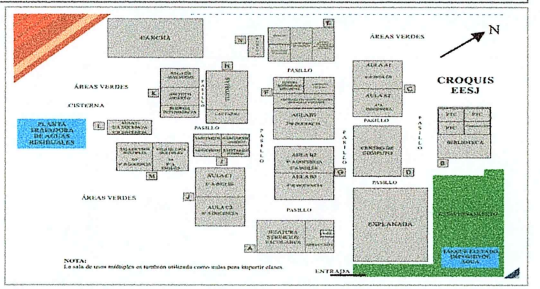

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Dirección Postal:
Esc. Secundaria Técnica #10, Carretera Jonacatepec-Tepalcigo, Jonacatepec, Morelos

FOTOS ANTES



Fachada de la Escuela de Estudios Superiores Jonacatepec

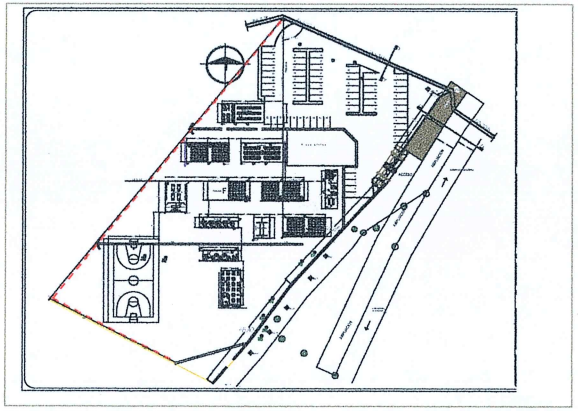

Planta arquitectónica indicando las áreas exteriores a intervenir para la Construcción de barda perimetral, en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del primer trimestre 2025, corresponde a los espacios que se intervenieron mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRITPTIVO.



F1: Vista oeste del área donde se realizaran los trabajos de demolición, trabajos preliminares y trabajos de albañilerías, para la Construcción de barda perimetral, en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.



F1: Imagen del área sur en el que se implementaran acciones de demolición, trabajos preliminares y trabajos de albañilerías, para la Construcción de barda perimetral, en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.



F1: Vista general del tramo poniente donde se realizaran los trabajos de demolición, preliminares y de albañilerías, para la Construcción de barda perimetral, en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD 1

Nombre de la obra: **Construcción de barda perimetral y obra complementaria en unidades académicas del Campus Norte y Campus Oriente. (Escuela de Estudios Superiores Jonacatepec)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

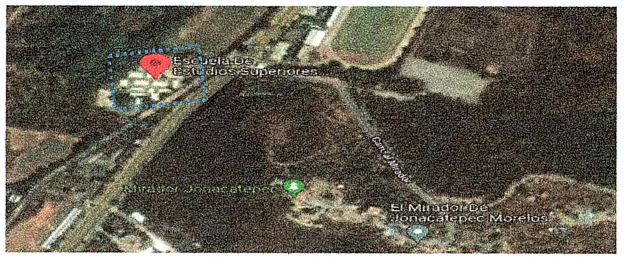


CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

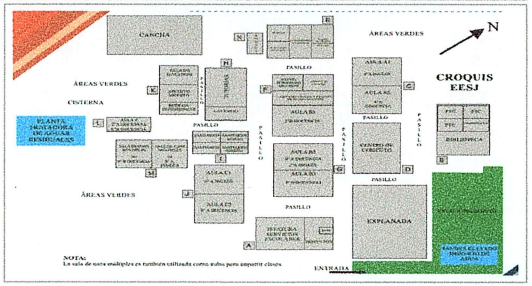


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Esc. Secundaria Técnica #10, Carretera Jonacatepec-Tepalcigo, Jonacatepec, Morelos

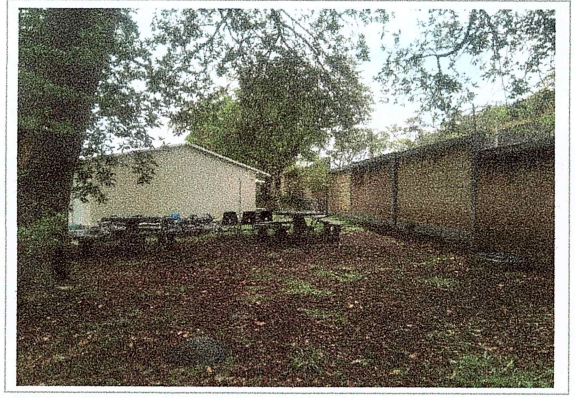

F1: Tramo poniente en el que se realizaran trabajos de demolición, preliminares y albañilerías, para la Construcción de barda perimetral, en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.

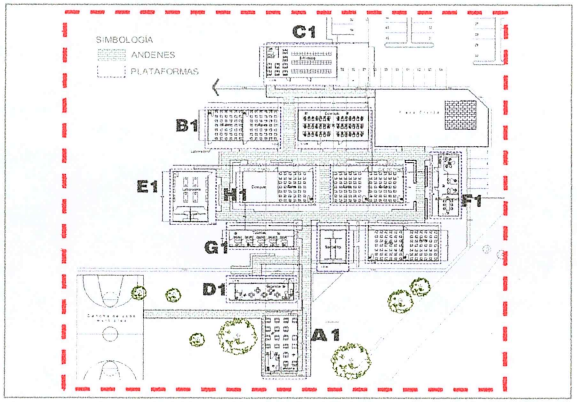

F2: Planta arquitectónica donde se ubican los espacios donde se realizarán los trabajos de demolición, preliminares, de albañilerías y trabajos Exteriores para la obra complementaria en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.




F2: Imagen de un espacio donde se realizarán los trabajos de demolición, preliminares, albañilerías y exteriores para la obra complementaria en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.



F2: Vista general de un espacio en el que se realizarán parte de los trabajos de demolición, preliminares, albañilerías y exteriores para la obra complementaria en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.



F2: Imagen del área donde se realizarán parte de los trabajos de demolición, preliminares, albañilerías y exteriores para la obra complementaria en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.

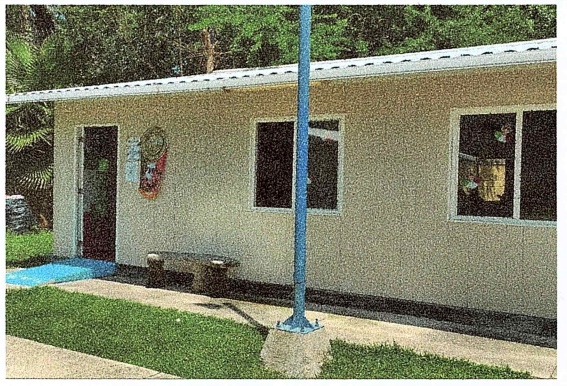

F2: Fachada norte del área donde se realizarán parte de las acciones de demolición, preliminares, albañilerías y trabajos Exteriores para la obra complementaria en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD: 1

Nombre de la obra: **Construcción de barda perimetral y obra complementaria en unidades académicas del Campus Norte y Campus Oriente. (Escuela de Estudios Superiores Jonacatepec)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

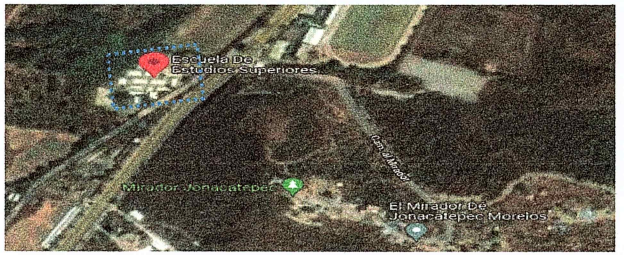


CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

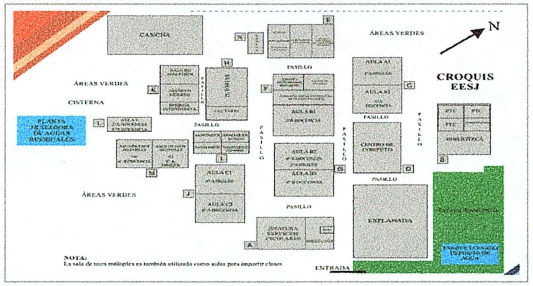

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Esc. Secundaria Técnica #10, Carretera Jonacatepec-Tepalcingo, Jonacatepec, Morelos

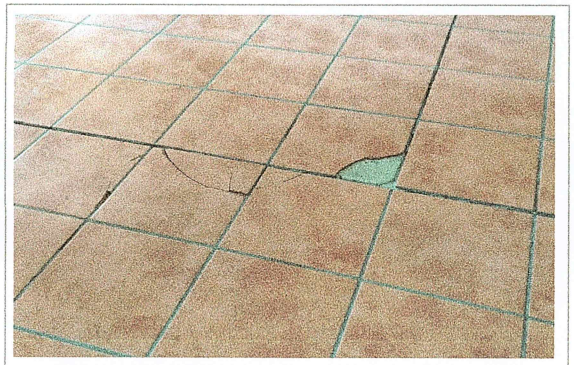

F2: Imagen de la superficie en el que se incluirán trabajos de demolición, preliminares, albañilerías y trabajos Exteriores para la obra complementaria en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.




F2: Fachada norte del espacio donde se realizarán parte de los trabajos de demolición, preliminares, albañilerías, y trabajos Exteriores para la obra complementaria en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.



F2: Área afectada en el que se generaran actividades de demolición, trabajos preliminares, albañilerías y trabajos Exteriores para la obra complementaria en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.



F2: Vista lateral de un espacio en el que se tiene incluidos trabajos de demolición, trabajos preliminares, albañilerías y trabajos Exteriores para la obra complementaria en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.

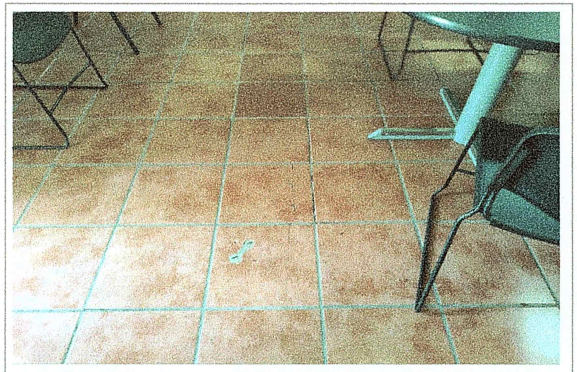

F2: Vista de una de las áreas en el que se tiene considerados trabajos de demolición, trabajos preliminares, albañilerías, y trabajos Exteriores para la obra complementaria en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024	**FAM**	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL	Primer Trimestre 2025
EJERCICIO FISCAL	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance


100%

PRIORIDAD **1** Nombre de la obra: **Construcción de barda perimetral y obra complementaria en unidades académicas del Campus Norte y Campus Oriente. (Escuela de Estudios Superiores Jonacatepec)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

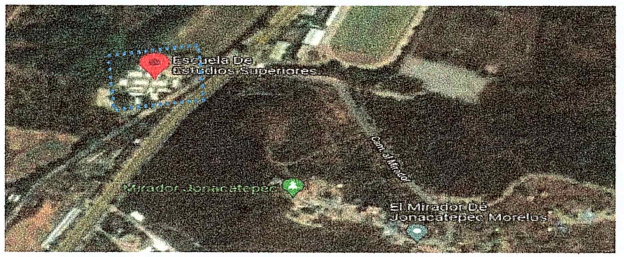

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

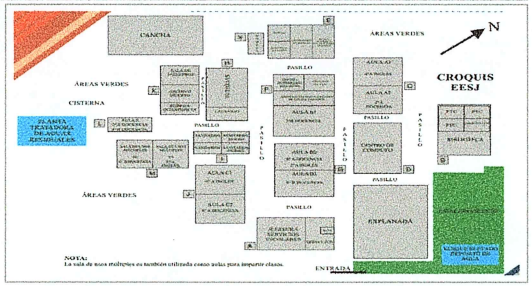

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Esc. Secundaria Técnica #10, Carretera Jonacatepec-Tepalcigo, Jonacatepec, Morelos


FOTOS DURANTE



Trabajos de Escarificacion de Barro Expansivo con Cal Hidratada y Colocacion de Relleno Tezontle de Breña en areas exteriores en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.



Trabajos de Escarificacion de Barro Expansivo con Cal Hidratada y Colocacion de Relleno Tezontle de Breña en areas exteriores en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.

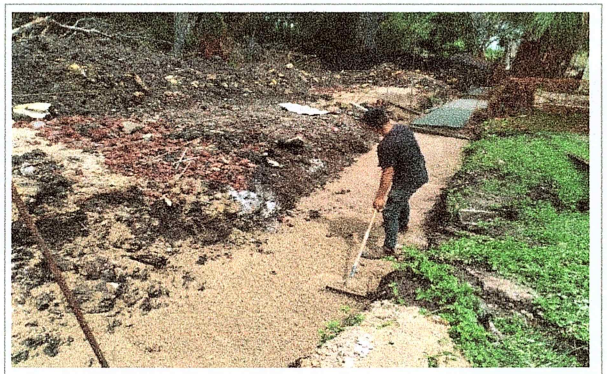

Trabajos de Colocacion y Compactacion de Relleno de Material Arenilla en areas exteriores en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.



Trabajos de Colocacion y Compactacion de Relleno de Material Arenilla en areas exteriores en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.



Trabajos de Hechura de Plantilla de concreto hecho en obra, en areas exteriores en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.



Trabajos de Hechura de Plantilla de concreto hecho en obra, en areas exteriores en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2025
EJERCICIO FISCAL	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance


100%

PRIORIDAD 1 Nombre de la obra: **Construcción de barda perimetral y obra complementaria en unidades académicas del Campus Norte y Campus Oriente. (Escuela de Estudios Superiores Jonacatepec)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

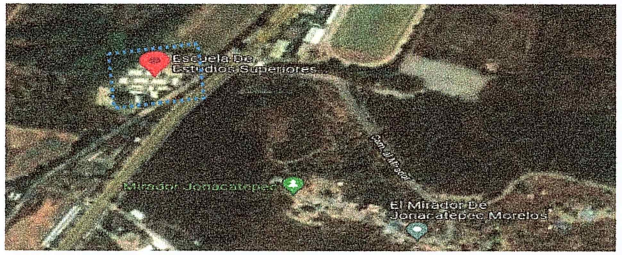

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

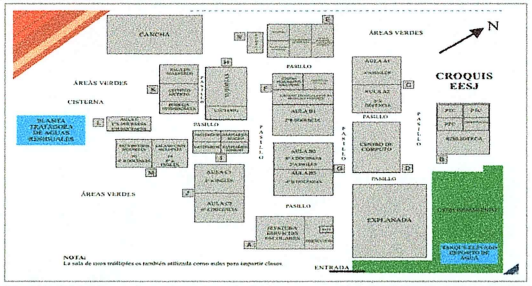


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS





Dirección Postal:
Esc. Secundaria Técnica #10, Carretera Jonacatepec-Tepalcigo, Jonacatepec, Morelos



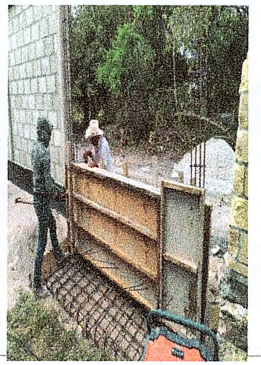



Trabajos de Habilitacion de acero, Cimbrado y Colado de Concreto, para la Elaboracion de Zapata Corrida y Contratrabe CTR1, en areas exteriores de la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.

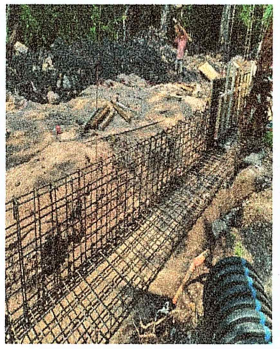

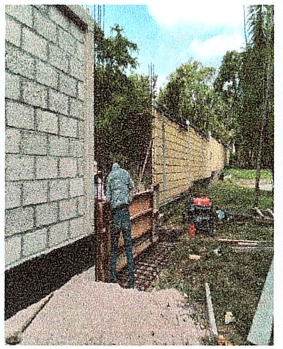


Trabajos de Habilitacion de acero, Cimbrado y Colado de Concreto, para la Elaboracion de Zapata Corrida y Contratrabe CTR1, en areas exteriores de la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.

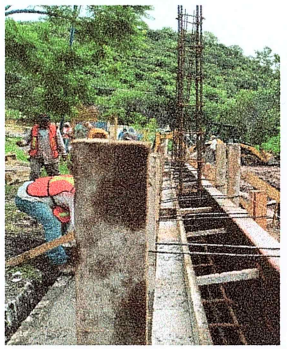

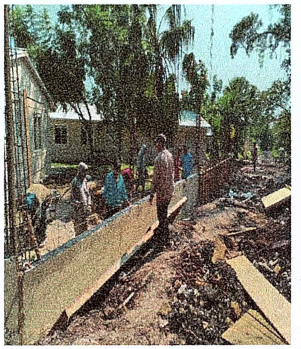


Trabajos de Habilitacion de Acero para Castillos y Colocacion, en areas exteriores de la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.

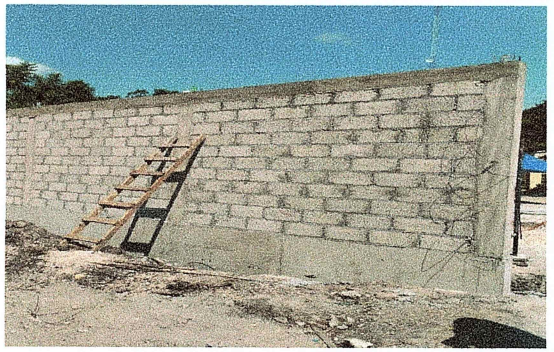

Trabajos de Habilitacion de Acero para Castillos y Colocacion, en areas exteriores de la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.



Trabajos de Aplicacion de Impermeabilizante sobre desplante de muro de Block, en areas exteriores de la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.

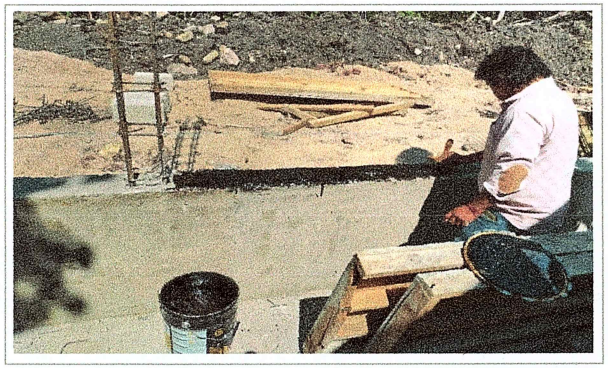

Trabajos de Aplicacion de Impermeabilizante sobre desplante de muro de Block, en areas exteriores de la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance


100%

PRIORIDAD 1 Nombre de la obra: **Construcción de barda perimetral y obra complementaria en unidades académicas del Campus Norte y Campus Oriente. (Escuela de Estudios Superiores Jonacatepec)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

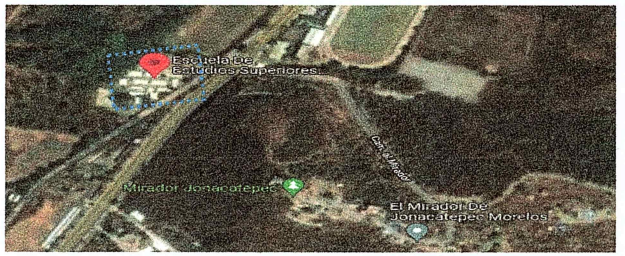


CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

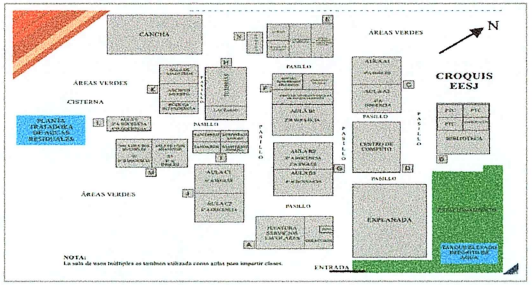


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS





Dirección Postal:
Esc. Secundaria Técnica #10, Carretera Jonacatepec-Tepalcingo, Jonacatepec, Morelos

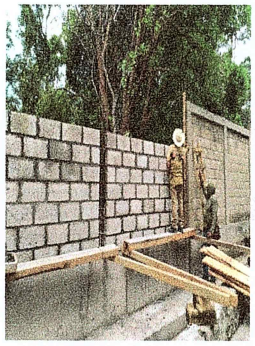

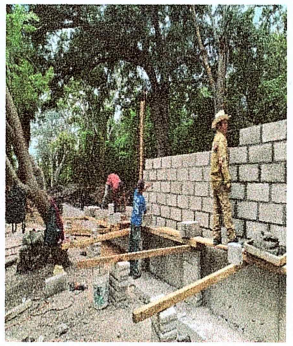

Trabajos de Elaboracion de Muro de Block de Cemento, en areas exteriores de la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.

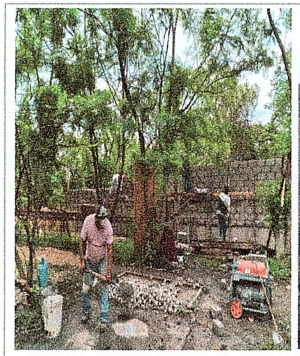

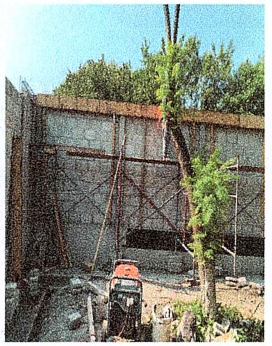

Trabajos de Elaboracion de Muro de Block de Cemento, en areas exteriores de la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.




Trabajos de Habilitacion de Acero para Cadena-Cerramiento y Colocacion, en areas exteriores de la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.



Trabajos de Habilitacion de Acero para Cadena-Cerramiento y Colocacion, en areas exteriores de la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.



Trabajos de Habilitacion de Acero para Cadena-Cerramiento y Colocacion, en areas exteriores de la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.

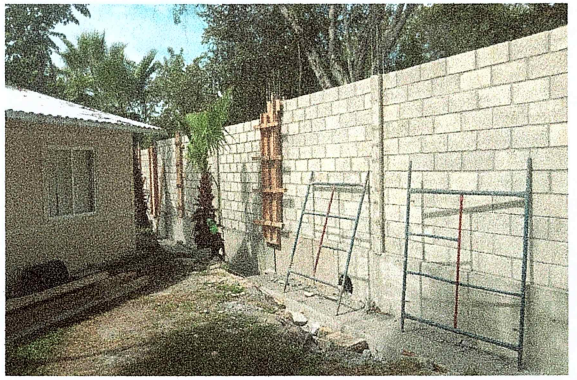

Trabajos de Suminstro y Colocación de Acero Para refuerzo, y Mano de obra para Elaboracion de Acabado Aparente en Junta de Muro de Block, en areas exteriores de la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance


100%

PRIORIDAD **1** Nombre de la obra: **Construcción de barda perimetral y obra complementaria en unidades académicas del Campus Norte y Campus Oriente. (Escuela de Estudios Superiores Jonacatepec)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

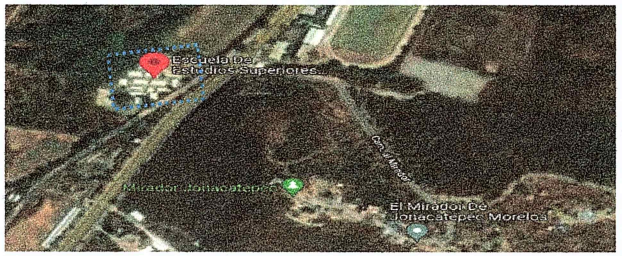

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

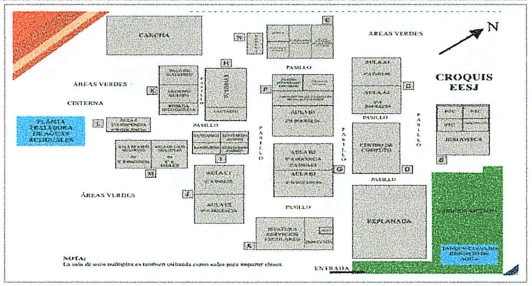

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Esc. Secundaria Técnica #10, Carretera Jonacatepec-Tepalcigo, Jonacatepec, Morelos



Trabajos de Suminstro y Colocación de Acero Para refuerzo, y Mano de obra para Elaboracion de Acabado Aparente en Junta de Muro de Block, en areas exteriores de la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.



Trabajos de Suminstro y Colocación de Acero Para refuerzo, y Mano de obra para Elaboracion de Acabado Aparente en Junta de Muro de Block, en areas exteriores de la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.



Trabajos de Suminstro y Colocación de Acero Para refuerzo, y Mano de obra para Elaboracion de Acabado Aparente en Junta de Muro de Block, en areas exteriores de la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.



Trabajos de Suminstro y Colocación de Acero Para refuerzo, y Mano de obra para Elaboracion de Acabado Aparente en Junta de Muro de Block, en areas exteriores de la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.



Trabajos de Suminstro y Colocación de Acero Para refuerzo, y Mano de obra para Elaboracion de Acabado Aparente en Junta de Muro de Block, en areas exteriores de la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.



Trabajos de Suminstro y Colocación de Acero Para refuerzo, y Mano de obra para Elaboracion de Acabado Aparente en Junta de Muro de Block, en areas exteriores de la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD 1

Nombre de la obra: **Construcción de barda perimetral y obra complementaria en unidades académicas del Campus Norte y Campus Oriente. (Escuela de Estudios Superiores Jonacatepec)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

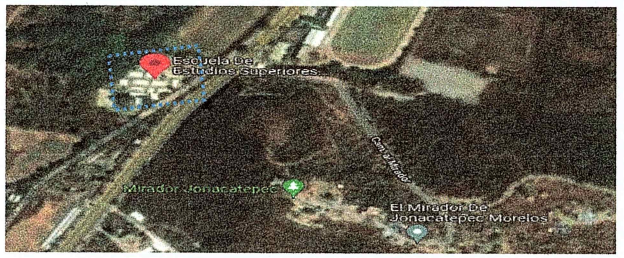

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

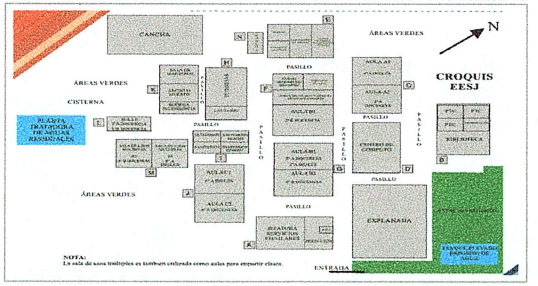


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Esc. Secundaria Técnica #10, Carretera Jonacatepec-Tepalcigo, Jonacatepec, Morelos



Trabajos de Suminstro y Colocación de Acero Para refuerzo, y Mano de obra para Elaboracion de Acabado Aparente en Junta de Muro de Block, en areas exteriores de la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.

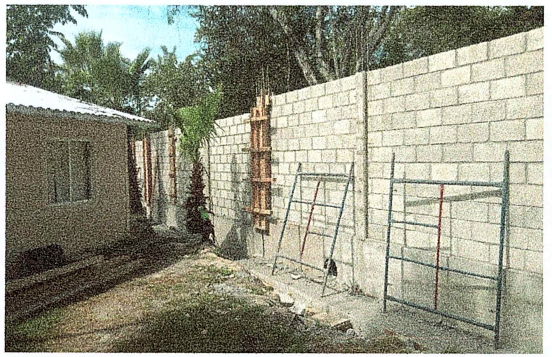

Trabajos de Suminstro y Colocación de Acero Para refuerzo, y Mano de obra para Elaboracion de Acabado Aparente en Junta de Muro de Block, en areas exteriores de la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.



Trabajos de Suminstro y Colocación de Acero Para refuerzo, y Mano de obra para Elaboracion de Acabado Aparente en Junta de Muro de Block, en areas exteriores de la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.



Trabajos de Suminstro y Colocación de Acero Para refuerzo, y Mano de obra para Elaboracion de Acabado Aparente en Junta de Muro de Block, en areas exteriores de la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.



Trabajos de Suminstro y Colocación de Acero Para refuerzo, y Mano de obra para Elaboracion de Acabado Aparente en Junta de Muro de Block, en areas exteriores de la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.



Trabajos de Suminstro y Colocación de Acero Para refuerzo, y Mano de obra para Elaboracion de Acabado Aparente en Junta de Muro de Block, en areas exteriores de la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

2024	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2025
EJERCICIO FISCAL	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance


100%

PRIORIDAD **1** Nombre de la obra: **Construcción de barda perimetral y obra complementaria en unidades académicas del Campus Norte y Campus Oriente. (Escuela de Estudios Superiores Jonacatepec)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

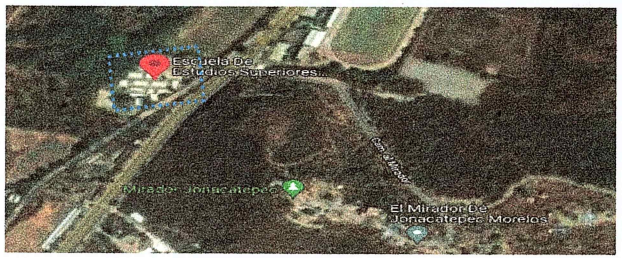

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

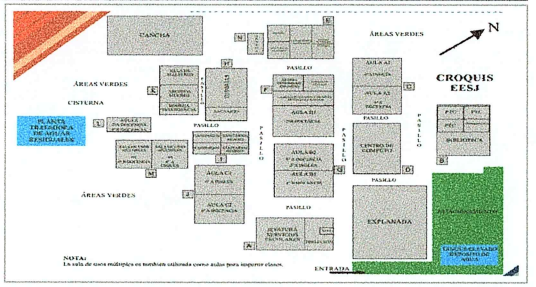

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Dirección Postal:
Esc. Secundaria Técnica #10, Carretera Jonacatepec-Tepalcigo, Jonacatepec, Morelos



Trabajos de Suminstro y Colocación de Acero Para refuerzo, y Mano de obra para Elaboracion de Acabado Aparente en Junta de Muro de Block, en areas exteriores de la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.



Trabajos de Suminstro y Colocación de Acero Para refuerzo, y Mano de obra para Elaboracion de Acabado Aparente en Junta de Muro de Block, en areas exteriores de la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.

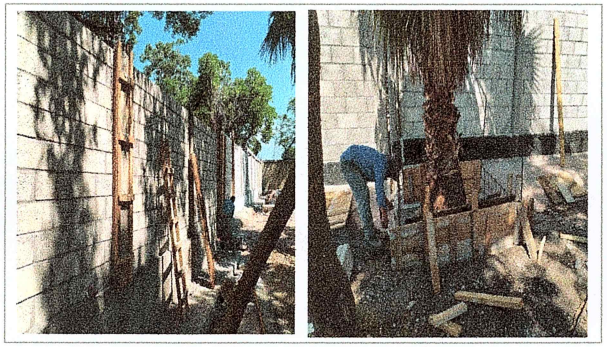

Trabajos de, Fabricacion de Rodete de concreto perimetral, en areas exteriores de la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.



Se continuan los Trabajos de Suministro y Colocacion de Cinchos Metalicos, Barrenos y Anclajes y en casetas Prefabricadas, en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.



Se continuan los Trabajos de Aplicacion de Pintura en Refuerzos Metalicos en Interior y Exterior de Casetas Prefabricadas, en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.



Se continuan los Trabajos de Demolicion de Firme y Loseta Ceramica, en Interior de Casetas Prefabricadas, en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD: 1

Nombre de la obra: **Construcción de barda perimetral y obra complementaria en unidades académicas del Campus Norte y Campus Oriente. (Escuela de Estudios Superiores Jonacatepec)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

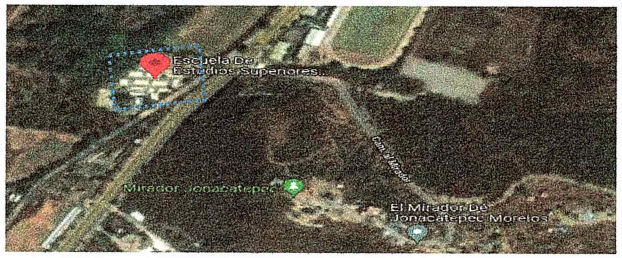

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

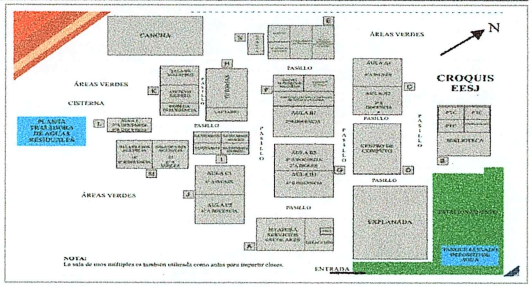


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Dirección Postal:
Esc. Secundaria Técnica #10, Carretera Jonacatepec-Tepalcigo, Jonacatepec, Morelos



Trabajos, Desmontaje de Equipo de Aire Acondicionado Unidad Condensadora (existentes), así como la elaboración de bastidor a base de Angulo para la Reinstalación del Mismo, en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.

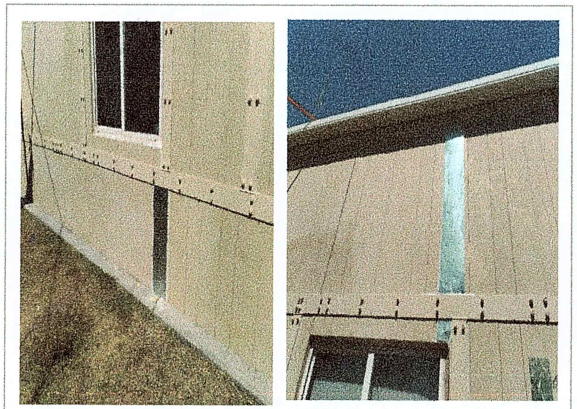

Se continuan con los Trabajos de Suminstro y Colocacion de Tapa Junta Tipo Flashing de lamina en interior y exterior de Caseta Prefabricada, en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.

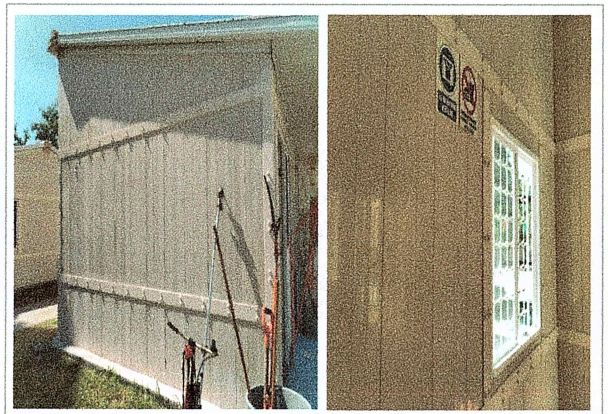

Se continuan los Trabajos de Aplicacion de Pintura en Refuerzos Metalicos en Interior y Exterior de Casetas Prefabricadas, en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.



Se continuan los Trabajos de Demolicion de Firme y Loseta Ceramica, en Interior de Casetas Prefabricadas, en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.



Trabajos de Excavacion por medios Mecanicos y Manuales en Interior de Casetas Prefabricadas, en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.



Trabajos de Excavacion por medios Mecanicos y Manuales en Interior de Casetas Prefabricadas, en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance


100%

PRIORIDAD **1** Nombre de la obra: **Construcción de barda perimetral y obra complementaria en unidades académicas del Campus Norte y Campus Oriente. (Escuela de Estudios Superiores Jonacatepec)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

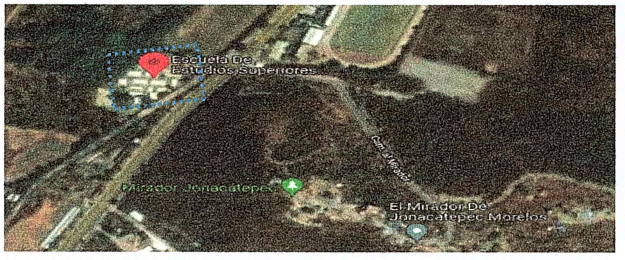

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

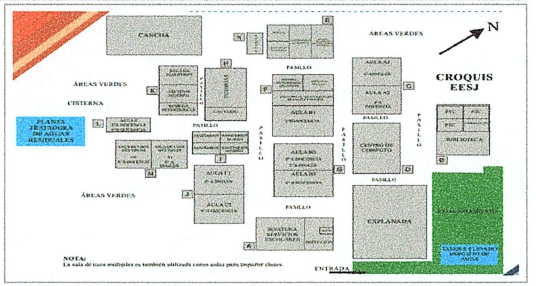

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Esc. Secundaria Técnica #10, Carretera Jonacatepec-Tepalcigo, Jonacatepec, Morelos



Trabajos, Suministro y Colocación de concreto premezclado para losa maciza, en Interior de Casetas Prefabricadas en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.



Trabajos de Habiliacion de acero para contratrabe, en Interior de Casetas Prefabricadas en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.



Trabajos de Colocacion y Compactacion de Relleno de Material Arenilla, en Interior de Casetas Prefabricadas en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.



Trabajos, Suministro y Colocación de concreto premezclado para losa maciza, en Interior de Casetas Prefabricadas en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.



Trabajos, suministro y colocación de Loseta cerámica, en Interior de Casetas Prefabricadasen la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.



Se continuan los Trabajos de Suministro y Colocacion de Cinchos Metalicos, Barrenos y Anclajes y en casetas Prefabricadas, en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2025
EJERCICIO FISCAL	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance


100%

PRIORIDAD 1 Nombre de la obra: **Construcción de barda perimetral y obra complementaria en unidades académicas del Campus Norte y Campus Oriente. (Escuela de Estudios Superiores Jonacatepec)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

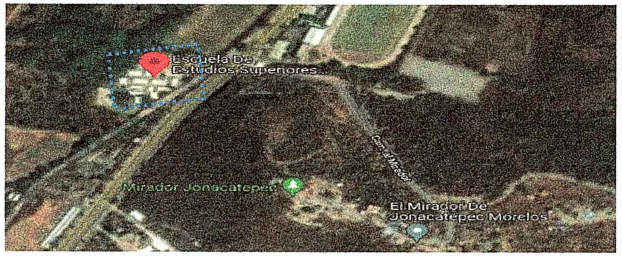

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

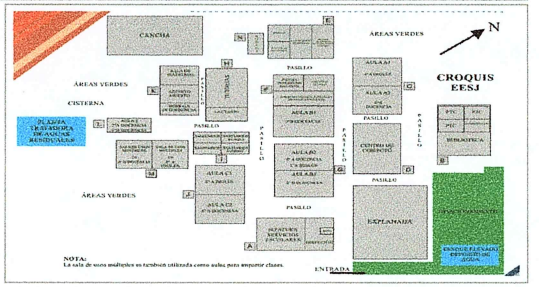

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Esc. Secundaria Técnica #10, Carretera Jonacatepec-Tepalcigo, Jonacatepec, Morelos



Trabajos, Suministro y Colocación de concreto premezclado para losa maciza, en interior de Casetas Prefabricadas en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.



Trabajos, Suministro y Colocación de concreto premezclado para losa maciza, en interior de Casetas Prefabricadas en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.



Trabajos, Suministro y colocación de Loseta cerámica, en interior de Casetas Prefabricadas en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.



Trabajos, Suministro e Instalación de Elementos Herrajes (Placa Base, Unión, Cartabón, Cinchos, Varilla corrugada, Solera, Anclajes, Poste OR) Para Restructuración de Casetas Prefabricadas,en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.



Trabajos de Suministro y Colocación de Cinchos Metálicos, Barrenos y Anclajes y en casetas Prefabricadas, en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.



Trabajos, Limpieza Gral. en área de Trabajo, en áreas exteriores así como en interiores de casetas Prefabricadas de la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2025
EJERCICIO FISCAL	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance


100%

PRIORIDAD **1** Nombre de la obra: **Construcción de barda perimetral y obra complementaria en unidades académicas del Campus Norte y Campus Oriente. (Escuela de Estudios Superiores Jonacatepec)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

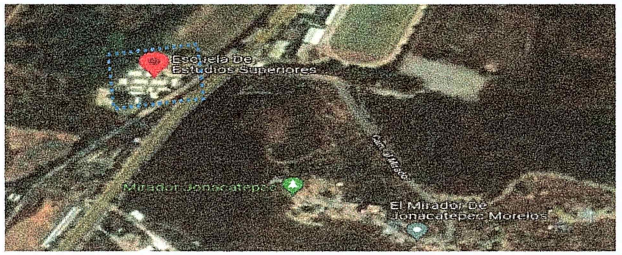

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

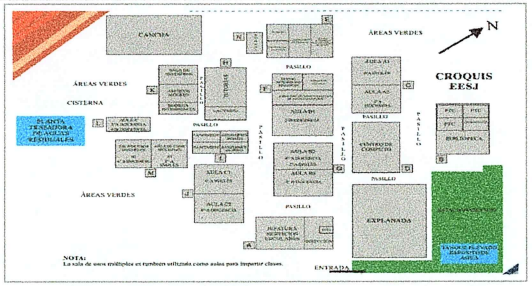


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Esc. Secundaria Técnica #10, Carretera Jonacatepec-Tepalcigo, Jonacatepec, Morelos




Trabajos, Limpieza Gral. en área de Trabajo, en áreas exteriores así como en interiores de casetas Prefabricadas de la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.

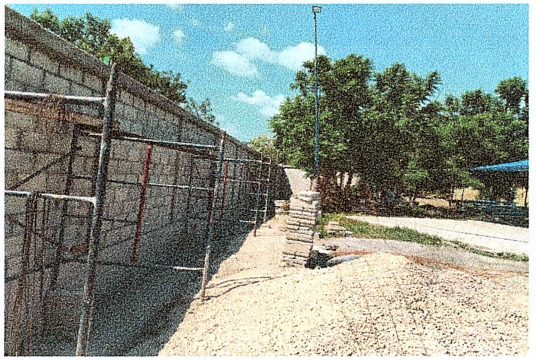


Trabajos, Limpieza Gral. en área de Trabajo, en áreas exteriores así como en interiores de casetas Prefabricadas de la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.

FOTOS DESPUES

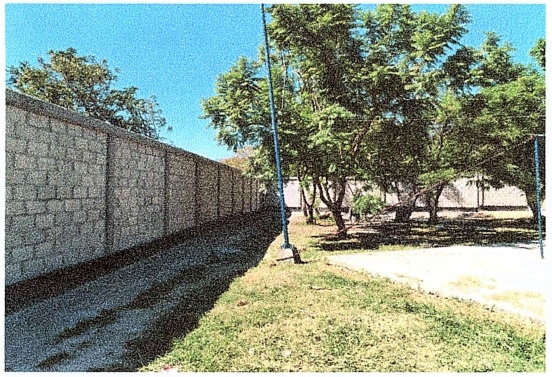

Vista 1 de la Construcción de barda perimetral, en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.

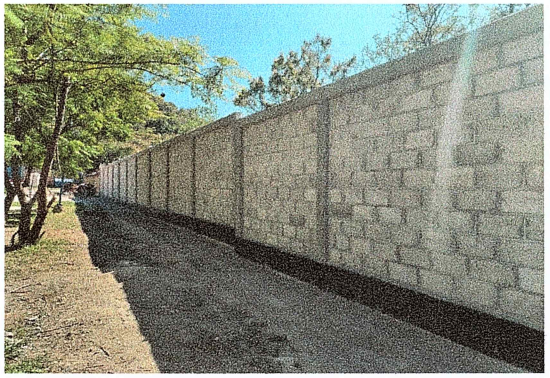

Vista 2 de la Construcción de barda perimetral, en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.



Vista 3 de la Construcción de barda perimetral, en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2025
EJERCICIO FISCAL	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance


100%

PRIORIDAD **1** Nombre de la obra: **Construcción de barda perimetral y obra complementaria en unidades académicas del Campus Norte y Campus Oriente. (Escuela de Estudios Superiores Jonacatepec)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

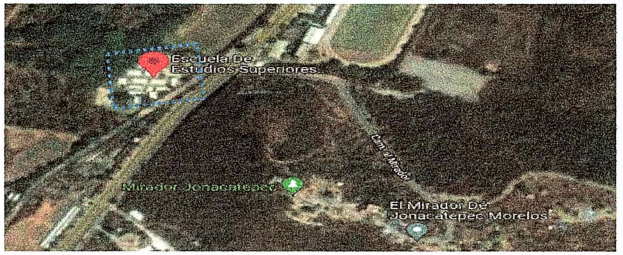

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

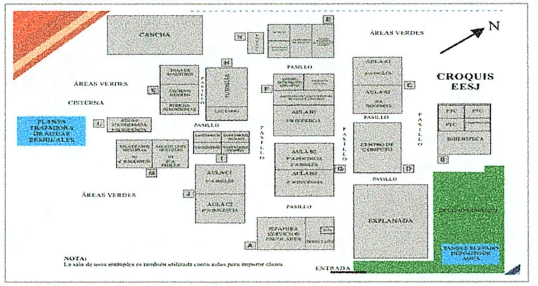

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Esc. Secundaria Técnica #10, Carretera Jonacatepec-Tepalcigo, Jonacatepec, Morelos




Vista 4, Interior de los trabajos pertenecientes de la obra complementaria en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.



Vista 5, Interior de los trabajos pertenecientes de la obra complementaria en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.




Vista 6, Interior de los trabajos pertenecientes de la obra complementaria en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.

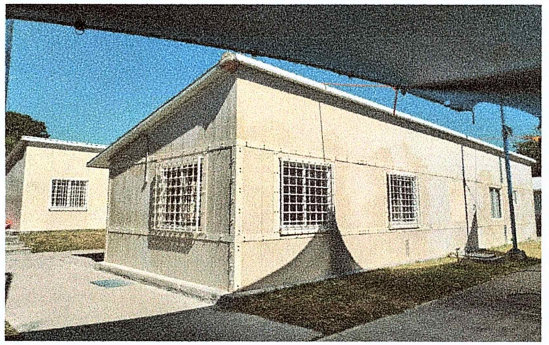

Vista 7, exterior de los trabajos pertenecientes de la obra complementaria en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.



Vista 8 y 9, exterior de los trabajos pertenecientes de la obra complementaria en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.

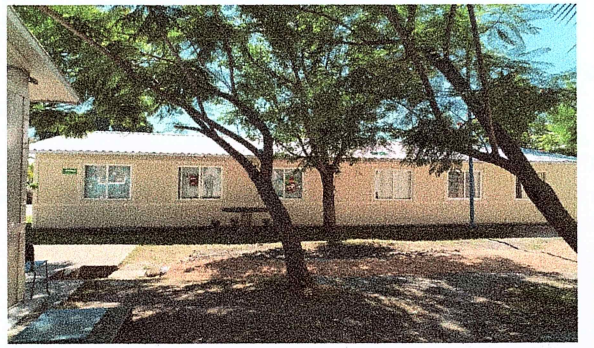

Vista 10, exterior de los trabajos pertenecientes de la obra complementaria en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD 2

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Facultad de Nutrición)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

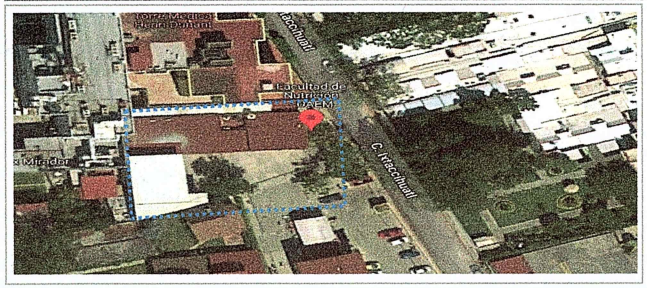

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

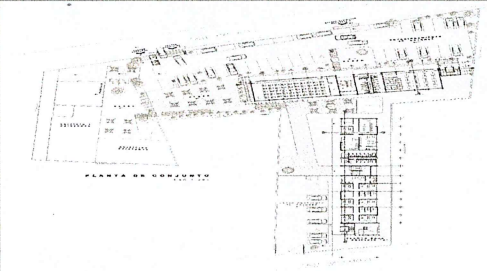

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS





Dirección Postal:
Calle Iztaccíhuatl #100, Los Volcanes, C.P. 62350 Cuernavaca, Morelos

FOTOS ANTES



Fachada de la Facultad de Nutrición



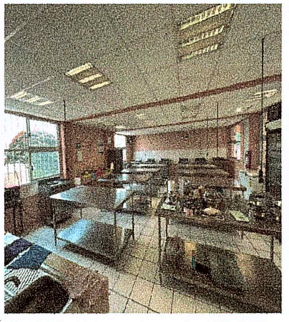

F1: Se equipará el Laboratorio de Técnicas Culinarias Edificio "A" con, 1 Horno de Convección Computarizado.

Observaciones :

El presente reporte fotográfico muestra los espacios que se beneficiaron con el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

FOTOS DESPUÉS



F1: Se equipó el Laboratorio de Técnicas Culinarias Edificio "A", con 2 Horno de Convección Computarizado.



F1: Se equipó el Laboratorio de Técnicas Culinarias Edificio "A", con 2 Horno de Convección Computarizado.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydee León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

PRIORIDAD **2**

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Facultad de Farmacia)**


Porcentaje de avance

100%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

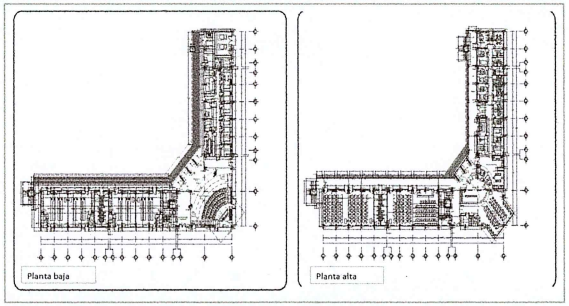


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

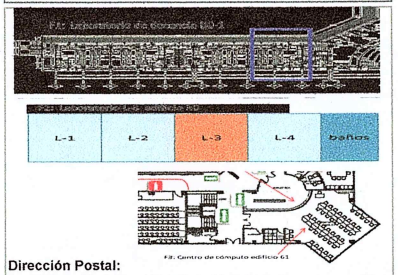

Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

FOTOS ANTES

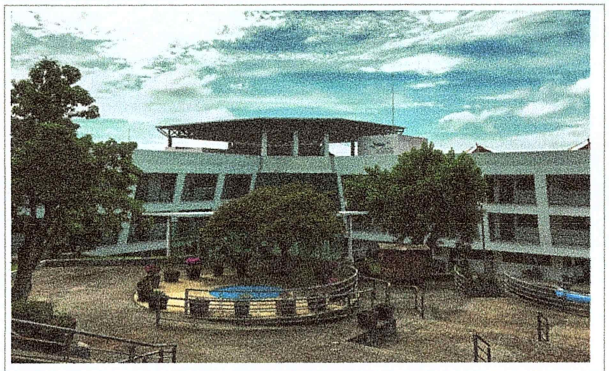

Fachada de la Facultad de Farmacia



F1: Se equipará Laboratorio de docencia B01 con, 1 autoclave vertical.



F2: Se equipará Laboratorio de docencia L-3, edificio 30 con, 1 autoclave vertical.



F3: Se equipará Centro de cómputo con, 2 videoproyectores y 1 silla multiusos.

Observaciones :

El presente reporte fotográfico muestra los espacios que se beneficiaron con el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD 2

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Facultad de Farmacia)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

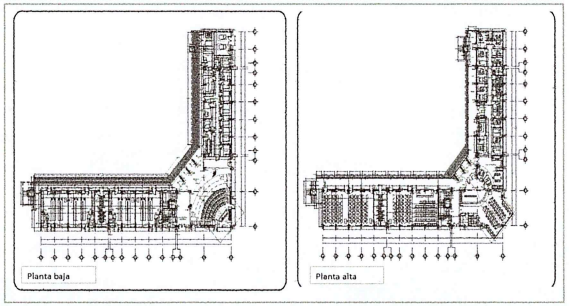

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

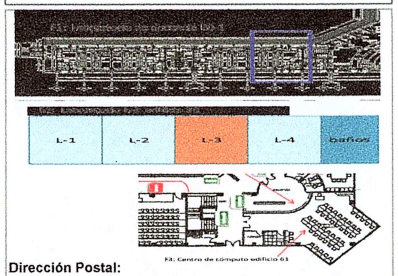

Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

FOTOS DESPUÉS




F1: Laboratorio de docencia B01 equipado con, 1 autoclave vertical.



F1: Laboratorio de docencia B01 equipado con, 1 autoclave vertical.



F2: Laboratorio de docencia L-3, edificio 30 equipado con, 1 autoclave vertical.

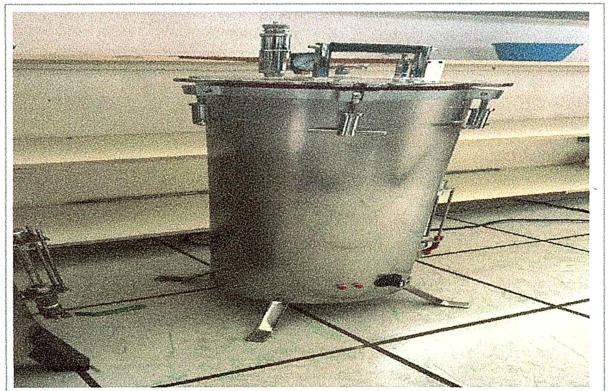

F2: Laboratorio de docencia L-3, edificio 30 equipado con, 1 autoclave vertical.



F3: Centro de cómputo con, equipado con 1 silla multiusos.



F3: Centro de cómputo con, equipado con 2 videoproyectores.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2025
EJERCICIO FISCAL	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD: **2**

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Facultad de Farmacia)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

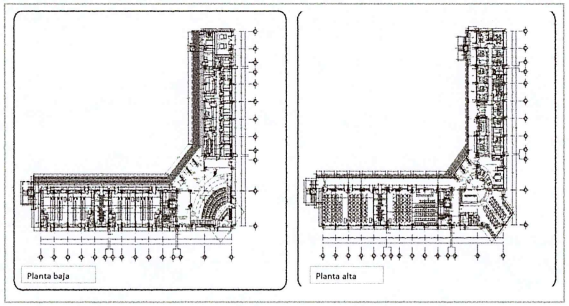

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

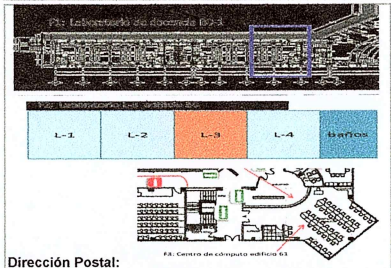

Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.



F3: Centro de cómputo con, equipado con 2 videoproyectores.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD 2

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Facultad de Diseño)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

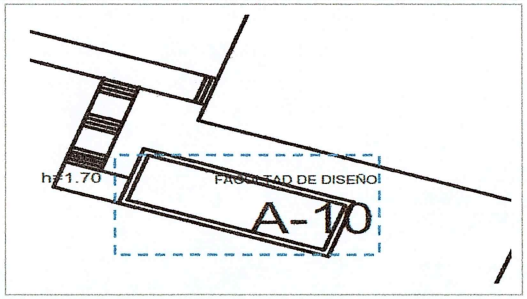


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.


FOTOS ANTES

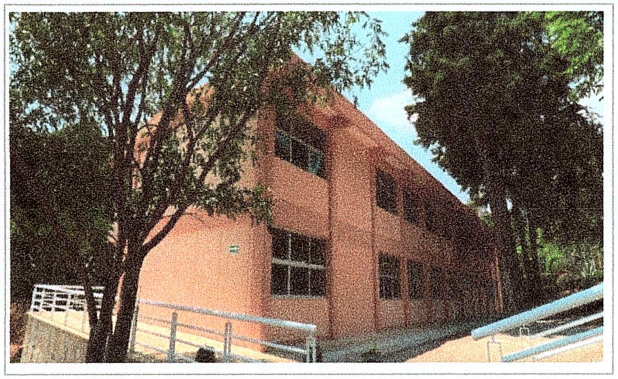


Fachada de la Facultad de Diseño.

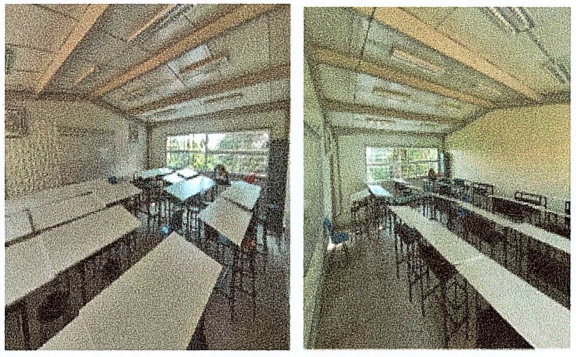

F1: Se equipará Taller de Industrial y objetos con, 2 cortadoras lasser.

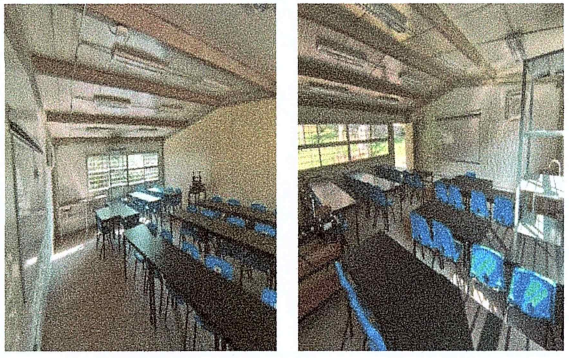

F2: Se equipará Taller de Diseño gráfico con, 1 pulpo serigrafía y 1 plancha para subliminar.

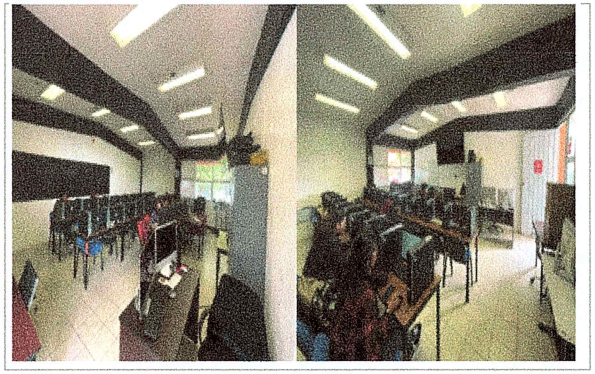

F3: Se equipará Centro de cómputo con, 42 sillas concha.

Observaciones :

El presente reporte fotográfico muestra los espacios que se beneficiaron con el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2025
EJERCICIO FISCAL	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD: **2**

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Facultad de Diseño)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

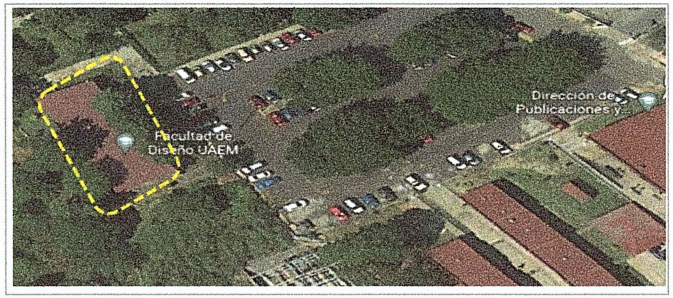

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

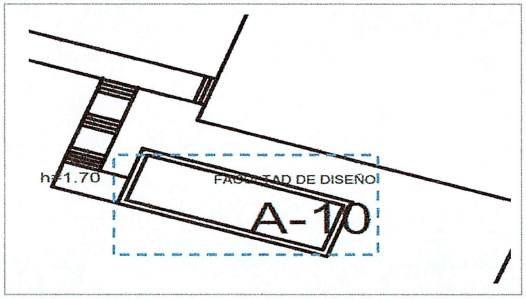


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.


FOTOS DESPUÉS

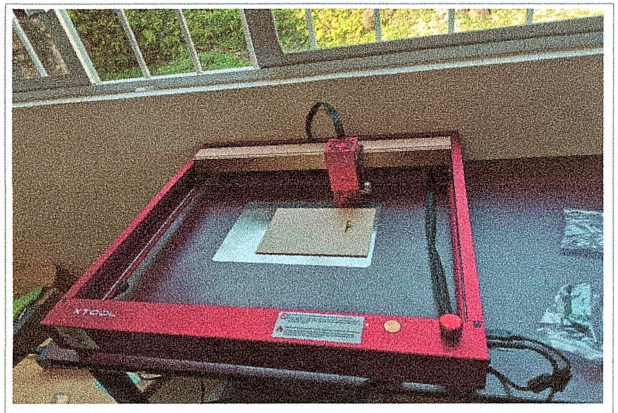


F1: Se equipó Taller de Industrial y objetos con, 2 cortadoras lasser.



F1: Se equipó Taller de Industrial y objetos con, 2 cortadoras lasser.

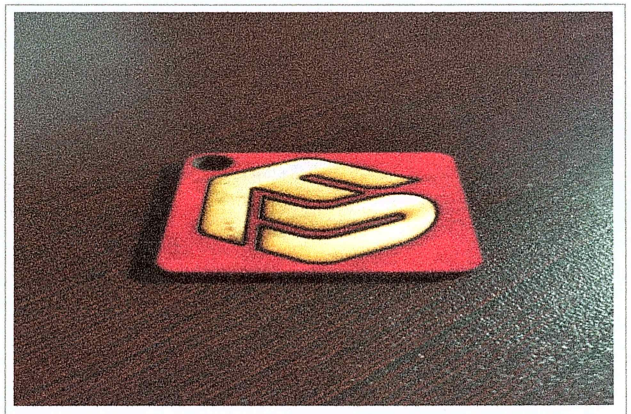


Resultado del trabajo de la cortadora lasser.

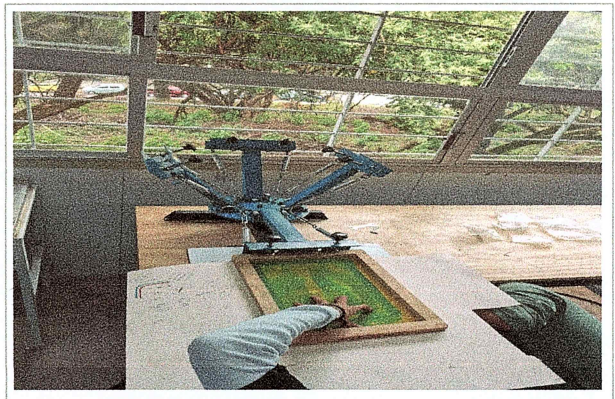

F2: Se equipó el Taller de Diseño gráfico con 1 pulpo serigrafía.



F3: Centro de cómputo equipado con 42 sillas concha.

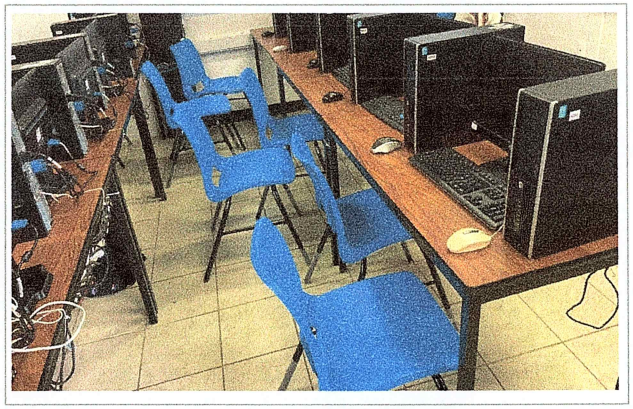

F3: Centro de cómputo equipado con 42 sillas concha.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2025
EJERCICIO FISCAL	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance


100%

PRIORIDAD **2** Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Facultad de Diseño)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO




CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

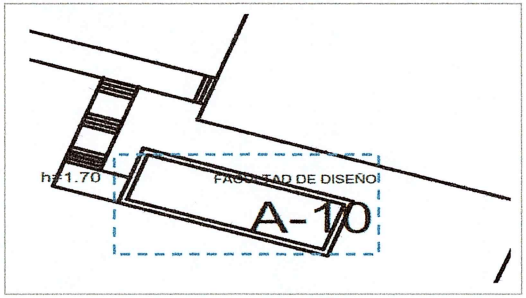

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

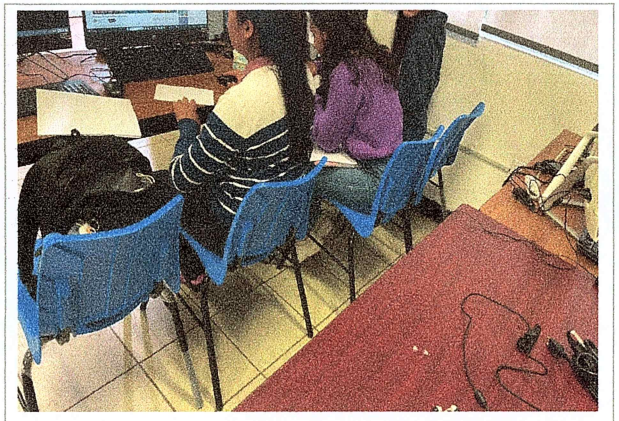

F3: Centro de cómputo equipado con 42 sillas concha.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2025
EJERCICIO FISCAL	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD **2**

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Facultad de Artes)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

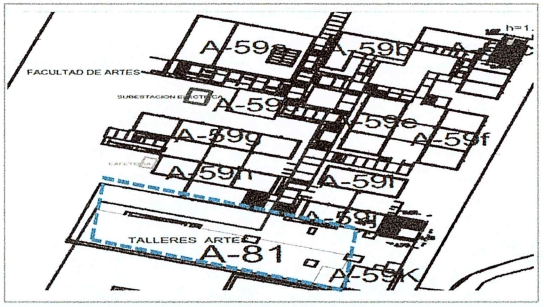

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

FOTOS ANTES



Fachada Facultad de Artes.



F1: Se equipará Laboratorio de Fotografía con, 36 mesas binarias.

Observaciones :

El presente reporte fotográfico muestra los espacios que se beneficiaron con el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

FOTOS DESPUES



F1: Se equipó el Laboratorio de Fotografía, con 36 mesas binarias.



F1: Se equipó el Laboratorio de Fotografía, con 36 mesas binarias.



F1: Se equipó el Laboratorio de Fotografía, con 36 mesas binarias.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2025
EJERCICIO FISCAL	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance


100%

PRIORIDAD	2	Nombre de la obra:	**Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Facultad de Artes)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

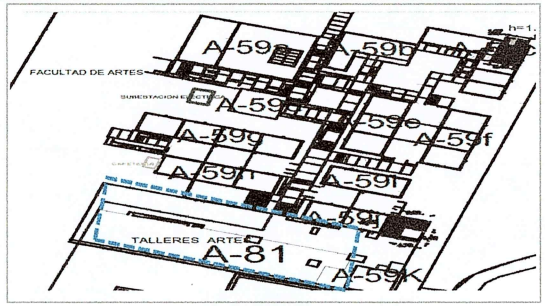

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.



F1: Se equipó el Laboratorio de Fotografía, con 36 mesas binarias.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández Director General de Infraestructura	Dr. Juan Manuel Rivas González Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable	Dra. Viridiana Aydeé León Hernández Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD **2**

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

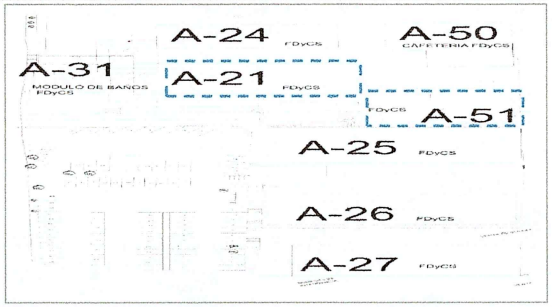

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.


FOTOS ANTES



Fachada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.



F1. Se equipará Sala de juicios orales con, 1 sistema de audio.

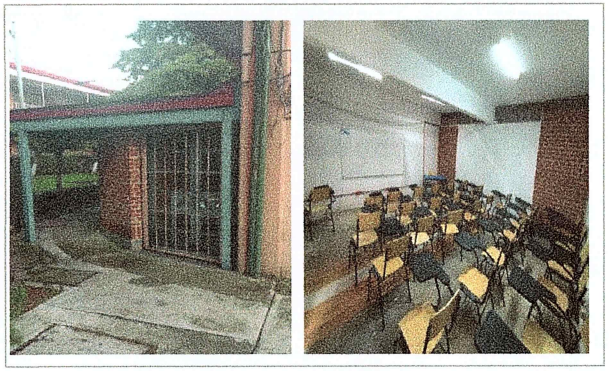

F2: Se equipará Sala de Usos Múltiples e Idiomas con, 1 videoproyector.

Observaciones :

El presente reporte fotográfico muestra los espacios que se beneficiaron con el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD **2**

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

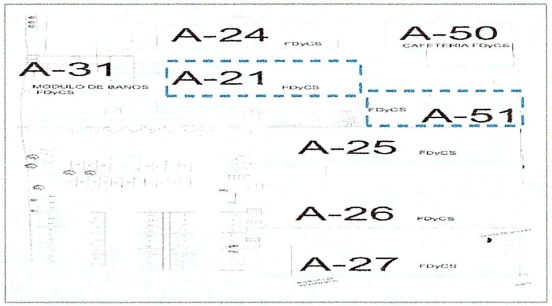


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

FOTOS DESPUÉS

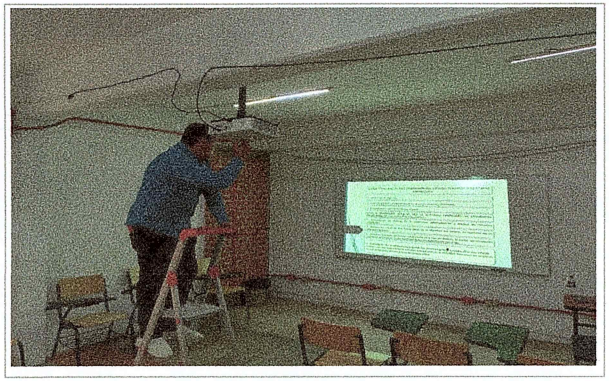

F2: Se equipó la Sala de Usos Múltiples e Idiomas con 1 videoproyector.

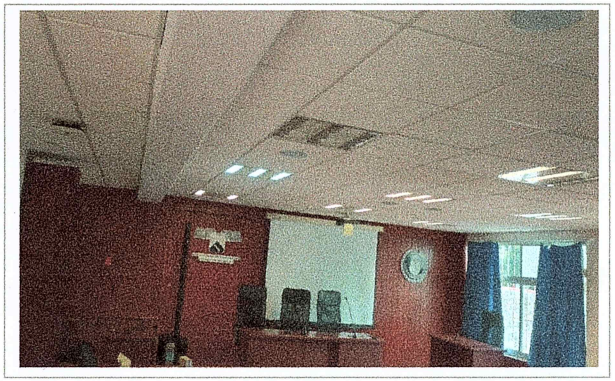

F1. Se equipó la Sala de juicios orales con, 1 sistema de audio.



F1. Se equipó la Sala de juicios orales con, 1 sistema de audio.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2025
EJERCICIO FISCAL	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%


PRIORIDAD: **2**

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Facultad de Ciencias Biologicas Edificio 11)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

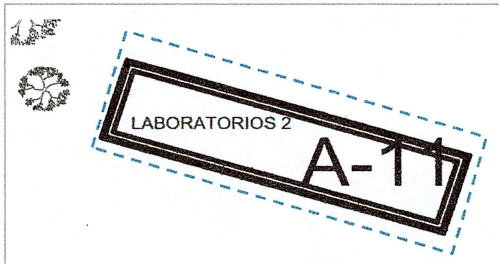


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

FOTOS ANTES

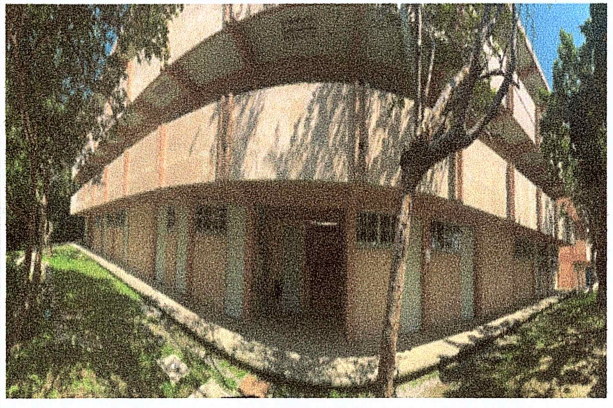

Fachada Edificio 11, Facultad de Ciencias Biológicas.

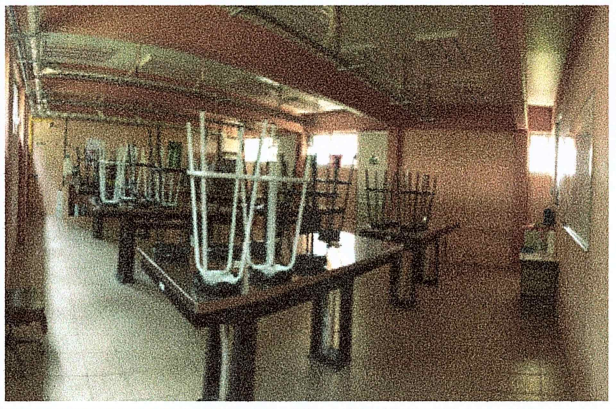

F1: Se equipará Laboratorio 4 con, 1 campana de flujo.

Observaciones :

El presente reporte fotográfico muestra los espacios que se beneficiaron con el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydee León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2025
EJERCICIO FISCAL	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD **2**

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Facultad de Ciencias Agropecuarias)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

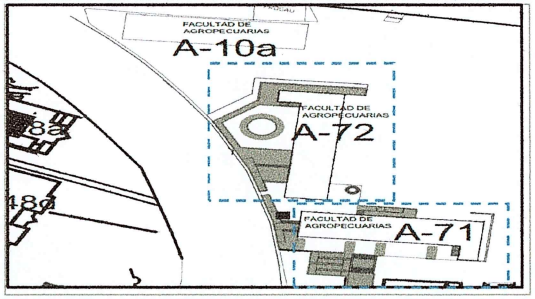

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

FOTOS ANTES



Fachada de la Facultad de Agropecuarias.




F1: Se equipará Laboratorio de Producción Animal con, 1 horno de secado.

Observaciones :

El presente reporte fotográfico muestra los espacios que se beneficiaron con el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

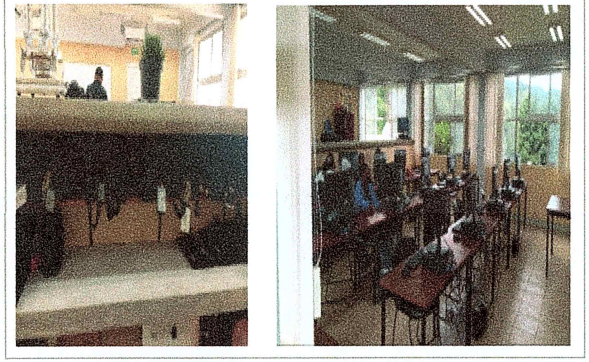

F2: Se equipará Centro de cómputo con, 4 videoproyectores.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD 2

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Facultad de Ciencias Agropecuarias)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

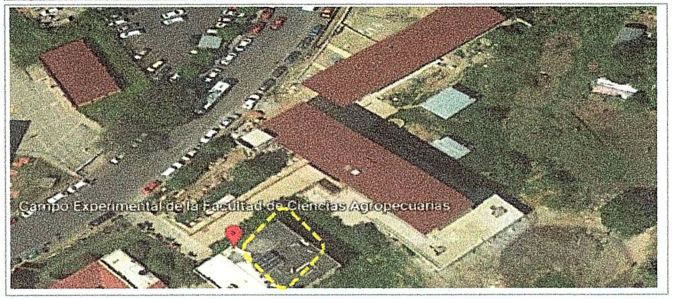

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

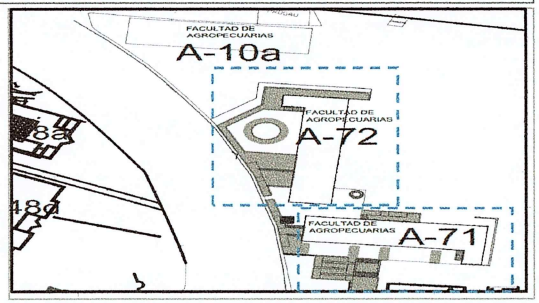

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.


FOTOS DESPUÉS




F1: Se equipó Laboratorio de Producción Animal con, 1 horno de secado.



F2: Se equipó Centro de cómputo con, 4 videoproyectores.



F2: Se equipó Centro de cómputo con, 4 videoproyectores.

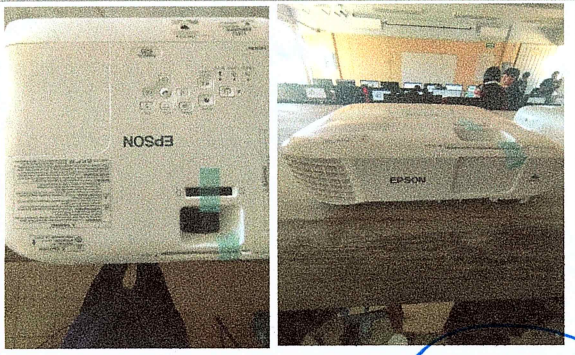

F2: Se equipó Centro de cómputo con, 4 videoproyectores.



F2: Se equipó Centro de cómputo con, 4 videoproyectores.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydee León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD 2

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Facultad de Ciencias del Deporte)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

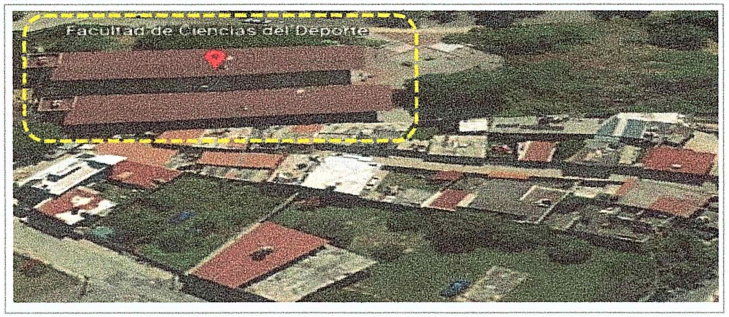

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

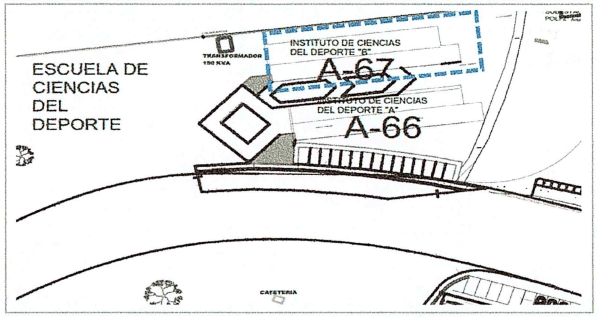

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

FOTOS ANTES



Fachada de la Facultad de Ciencias del Deporte.




F1: Se equipará Laboratorio de evaluación del rendimiento con, 1 analizador metabólico.

Observaciones :

El presente reporte fotográfico muestra los espacios que se beneficiaron con el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.


FOTOS DESPUÉS

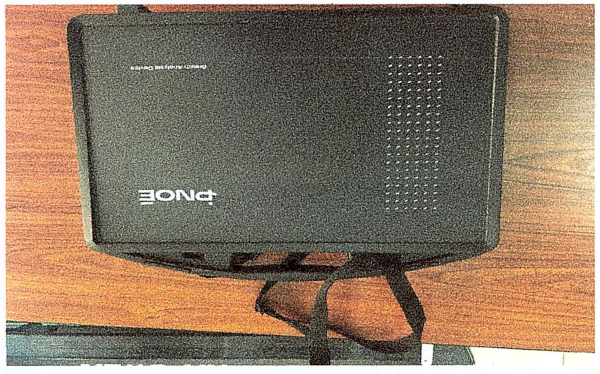

F1: Se equipó el Laboratorio de evaluación del rendimiento con, 1 analizador metabólico.



F1: Se equipó el Laboratorio de evaluación del rendimiento con, 1 analizador metabólico.

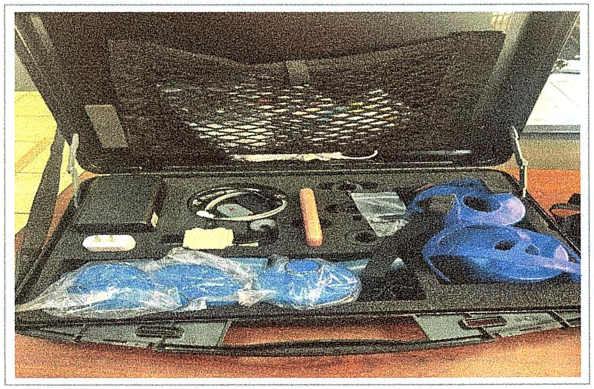

F1: Se equipó el Laboratorio de evaluación del rendimiento con, 1 analizador metabólico.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2025
EJERCICIO FISCAL	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD **2**

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Facultad de Ciencias del Deporte)**

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO




CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

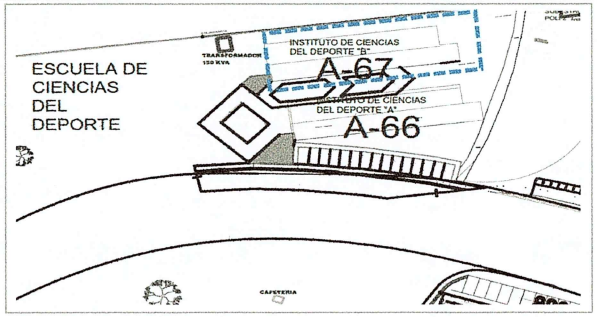

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

Edifico B, Planta baja



F1: Laboratorio de evaluación del rendimiento

Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.



F1: Se equipó el Laboratorio de evaluación del rendimiento con, 1 analizador metabólico.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD **2**

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Facultad de Estudios Superiores Cuautla)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

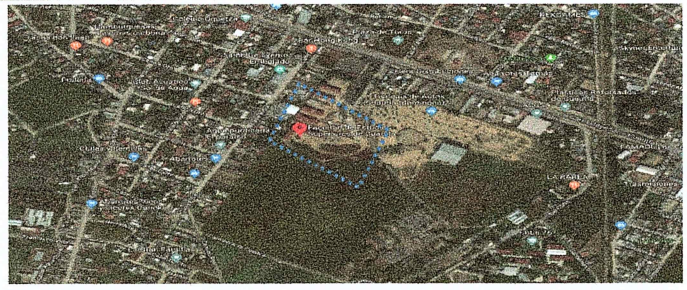

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

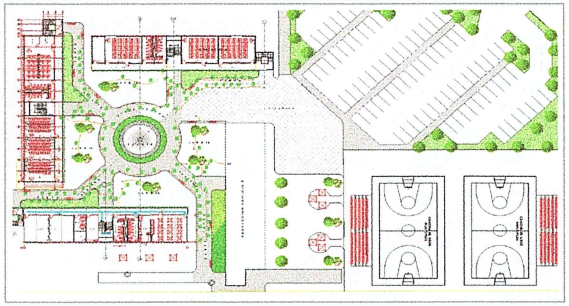

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

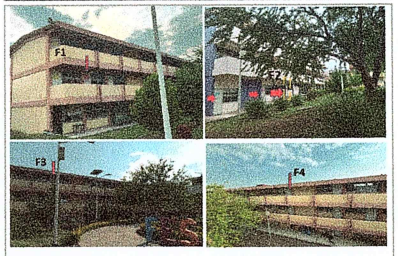


Dirección Postal:
Carretera México – Oaxaca No. 218 Colonia Plan de Ayala, Cuautla Morelos, C.P. 62743

FOTOS ANTES



Fachada de la Facultad de Estudios Superiores Cuautla



F1: Se equipará Laboratorio de Radio con, 1 consola digital.

Observaciones :

El presente reporte fotográfico muestra los espacios que se beneficiaron con el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



F2: Se equipará Auditorio con, 1 sistema de audio y 15 sillas acojinadas.



F3: Se equipará Aula 22 con, 1 mesa binaria.



F4: Se equipará Aula 24 con, 1 mesa binaria.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD 2

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Facultad de Estudios Superiores Cuautla)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

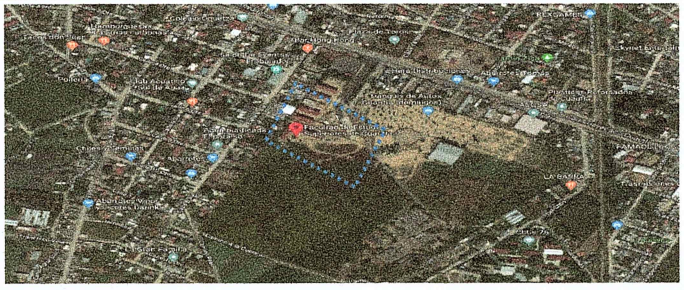

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

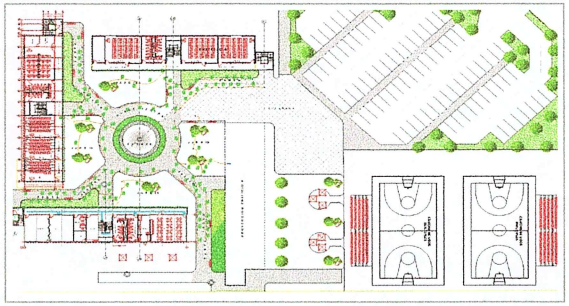


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

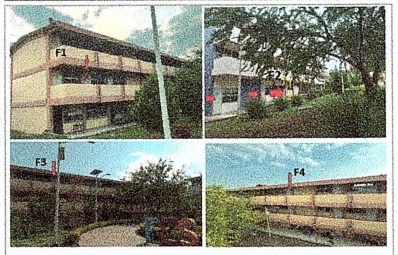


Dirección Postal:
Carretera México – Oaxaca No. 218 Colonia Plan de Ayala, Cuautla Morelos, C.P. 62743


FOTOS DESPUES



F1: Se equipó Laboratorio de Radio con, 1 consola digital.

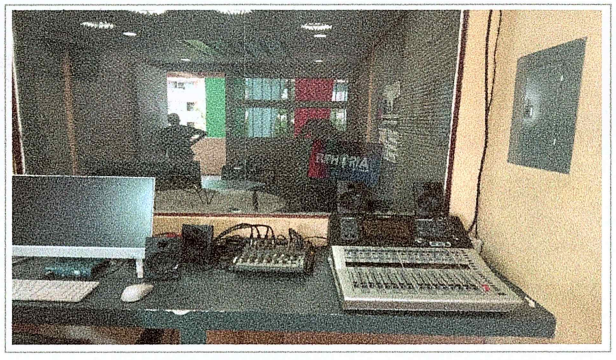


F1: Se equipó Laboratorio de Radio con, 1 consola digital.



F1: Se equipó Laboratorio de Radio con, 1 consola digital.



F2: Se equipó Auditorio con, 1 sistema de audio y 15 sillas acojinadas.



F2: Se equipó Auditorio con, 1 sistema de audio y 15 sillas acojinadas.



F2: Se equipó Auditorio con, 1 sistema de audio y 15 sillas acojinadas.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD **2**

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Facultad de Estudios Superiores Cuautla)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

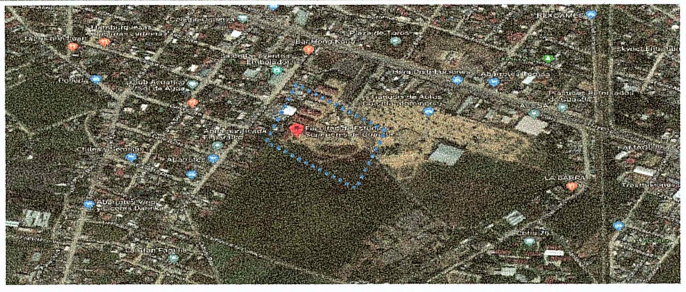


CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

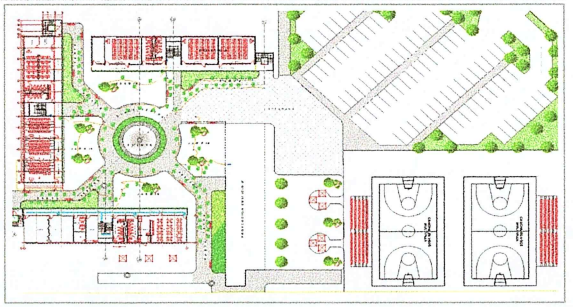

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

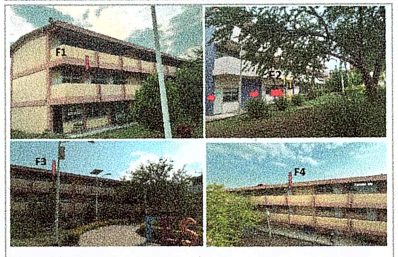

Dirección Postal:
Carretera México – Oaxaca No. 218 Colonia Plan de Ayala, Cuautla Morelos, C.P. 62743

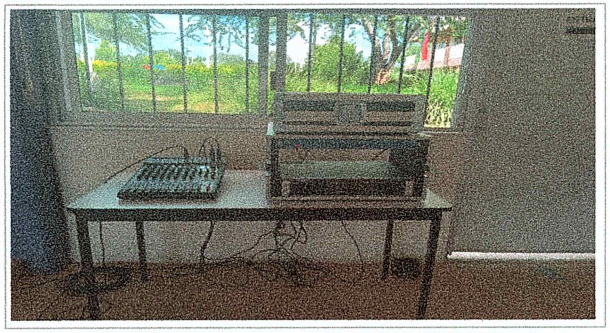


F2: Se equipó Auditorio con, 1 sistema de audio y 15 sillas acojinadas.




F2: Se equipó Auditorio con, 1 sistema de audio y 15 sillas acojinadas.



F2: Se equipó Auditorio con, 1 sistema de audio y 15 sillas acojinadas.

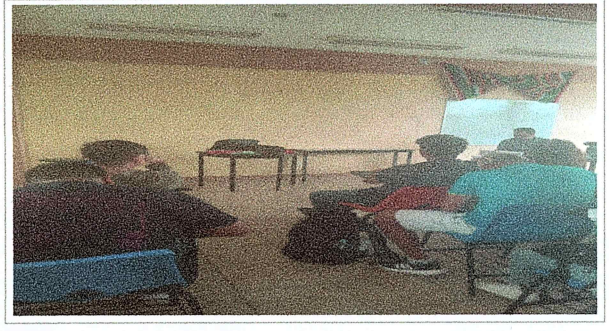

F3: Se equipó el Aula 22 con, 1 mesa binaria.



F4: Se equipó el Aula 24 con, 1 mesa binaria.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydee León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD **2**

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec Subsede Tepalcingo)**

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

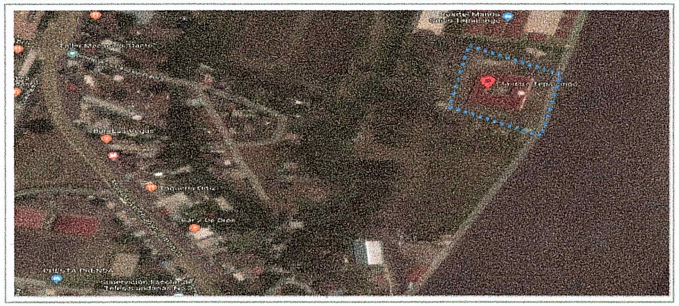

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

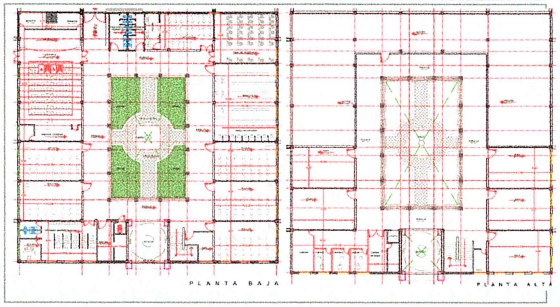


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Paseo Rivereño s/n, Tepalcingo, Morelos. C.P. 62920

FOTOS ANTES

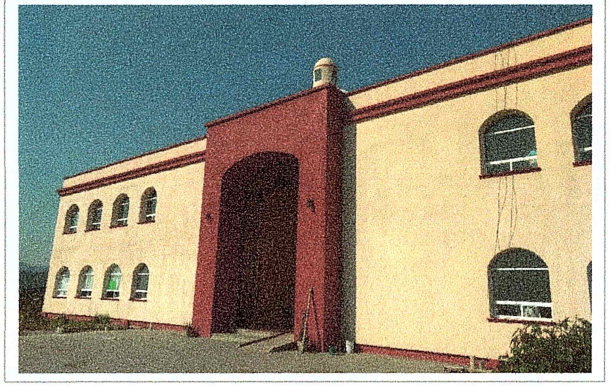

Fachada de la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec Subsede Tepalcingo



F1: Se equipará la Biblioteca, con 7 Mesas de maestro y un Par de Arcos para Protección


Observaciones :

El presente reporte fotográfico muestra los espacios que se beneficiaron con el fondo.


VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



F2: Se equipará la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec Subsede Tepalcingo, con un Kit video Vigilancia

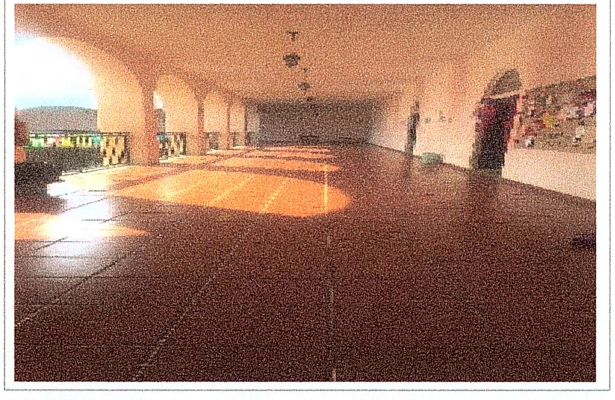

F2: Se equipará la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec Subsede Tepalcingo, con un Kit video Vigilancia

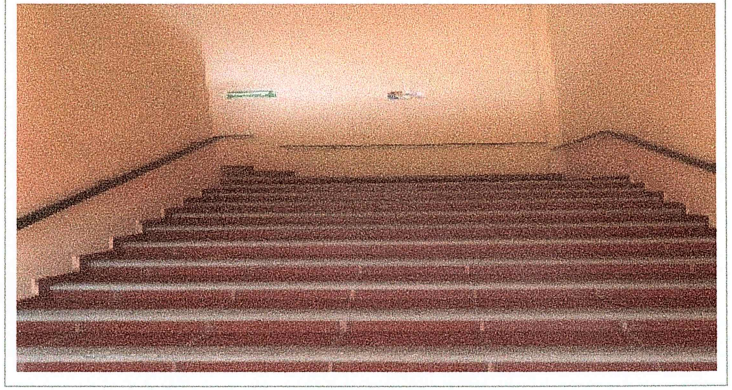

F2: Se equipará la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec Subsede Tepalcingo, con un Kit video Vigilancia

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD **2**

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec Subsede Tepalcingo)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

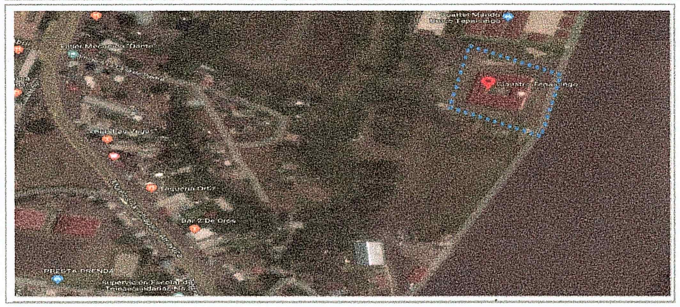

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

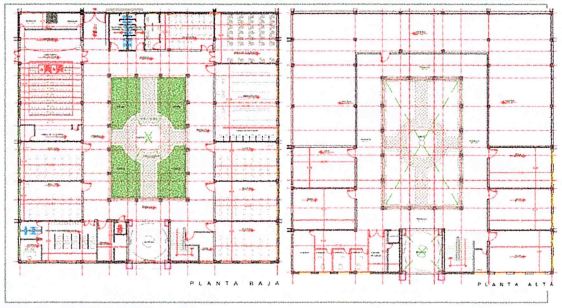

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

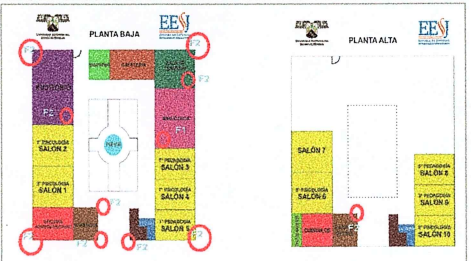

Dirección Postal:
Paseo Rivereño s/n, Tepalcingo, Morelos. C.P. 62920



F2: Se equipará la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec Subsede Tepalcingo, con un Kit video Vigilancia



F2: Se equipará la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec Subsede Tepalcingo, con un Kit video Vigilancia

FOTOS DESPUÉS



F1: Se equipó la Biblioteca, con un Par de Arcos para Protección



F1: Se equipó la Biblioteca, con un Par de Arcos para Protección



F1: Se equipó la Biblioteca, con un Par de Arcos para Protección

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD 2

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec Subsede Tepalcingo)**

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

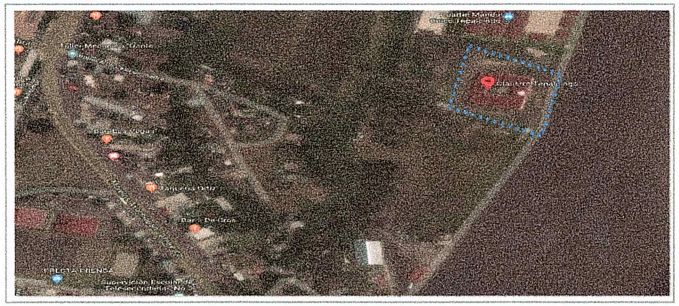

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

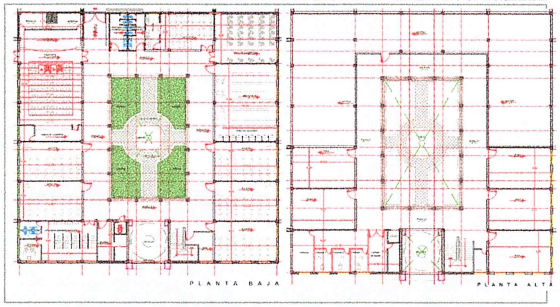

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Paseo Rivereño s/n, Tepalcingo, Morelos. C.P. 62920




F1: Se equipó la Biblioteca, con un Par de Arcos para Protección




F1: Se equipó la Biblioteca, con un Par de Arcos para Protección



F1: Se equipó la Biblioteca, con un Par de Arcos para Protección

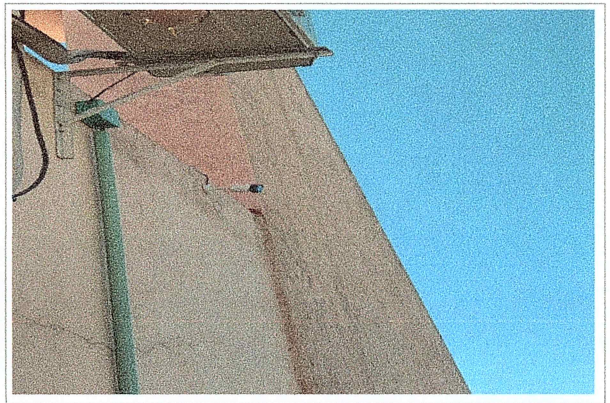

F2: Se equipó la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec Subsede Tepalcingo, con un Kit video Vigilancia

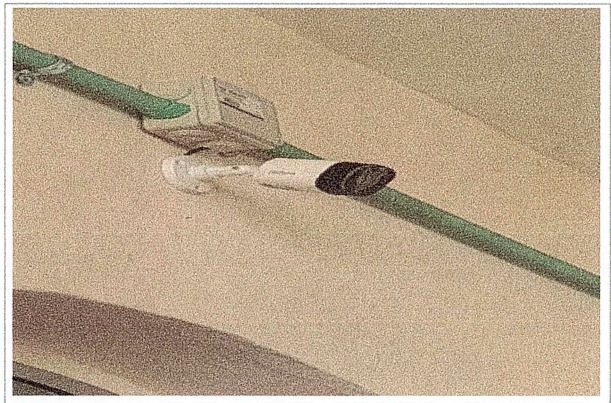

F2: Se equipó la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec Subsede Tepalcingo, con un Kit video Vigilancia



F2: Se equipó la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec Subsede Tepalcingo, con un Kit video Vigilancia

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD **2**

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec Subsede Tepalcingo)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

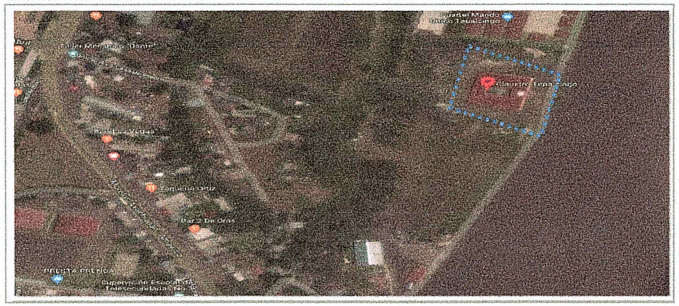


CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

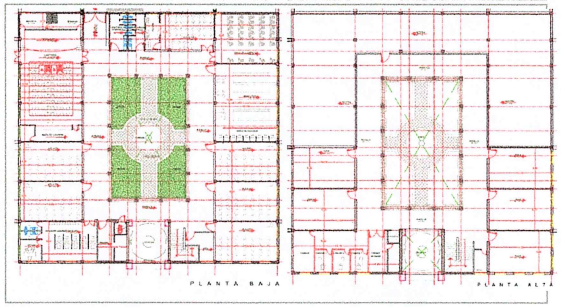

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

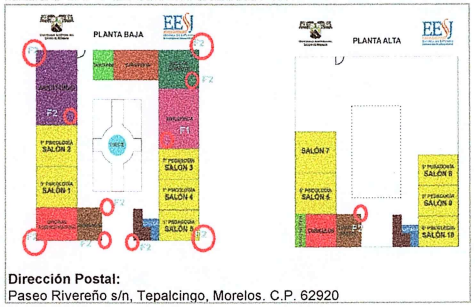

Dirección Postal:
Paseo Rivereño s/n, Tepalcingo, Morelos. C.P. 62920

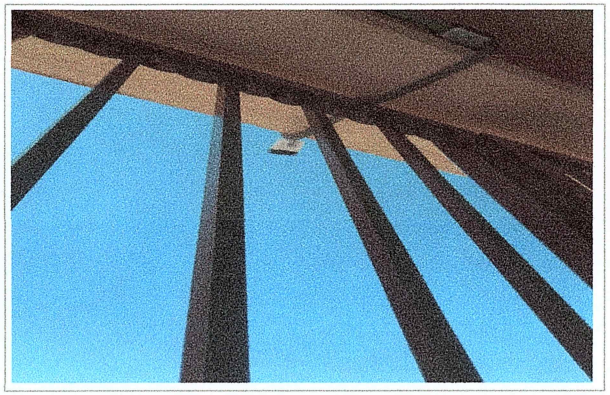


F2: Se equipó la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec Subsede Tepalcingo, con un Kit video Vigilancia




F2: Se equipó la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec Subsede Tepalcingo, con un Kit video Vigilancia



F1: Se equipó la Biblioteca, con 7 Mesas de maestro.



F1: Se equipó la Biblioteca, con 7 Mesas de maestro.

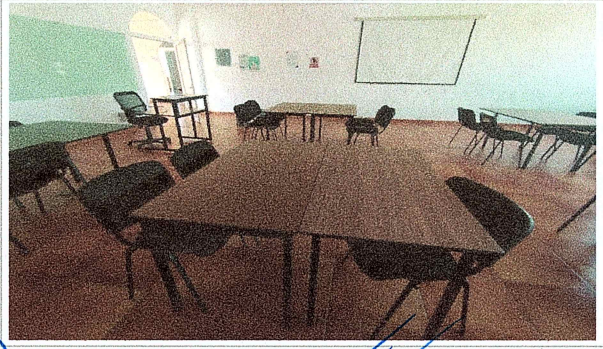

F1: Se equipó la Biblioteca, con 7 Mesas de maestro.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydee León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD 2

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec Subsede Axochiapan)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

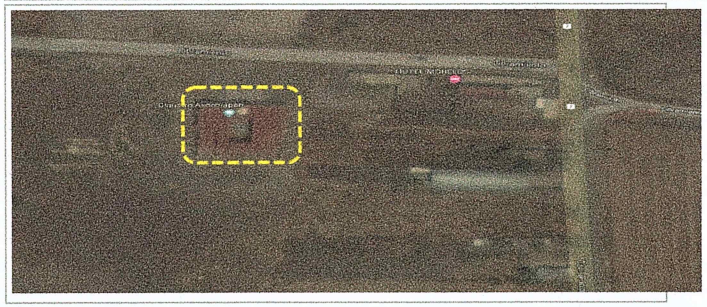

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

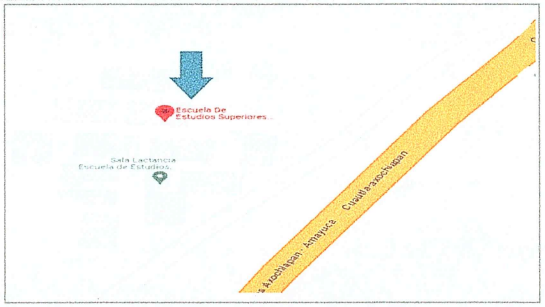


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Dirección Postal:
Libramiento 7,C.P. 62956 Axochiapan Morelos

FOTOS ANTES

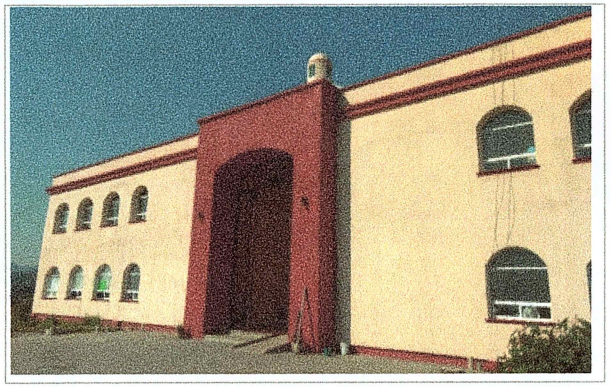

Fachada de la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec Subsede Axochiapan

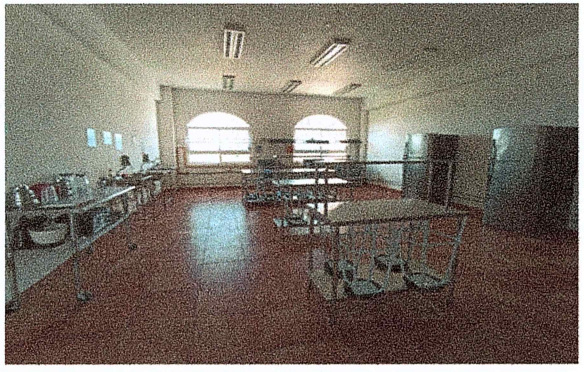


F1: Se equipará el Laboratorio de Preparación de Alimentos, con una estufa Industrial

Observaciones :

El presente reporte fotográfico muestra los espacios que se beneficiaron con el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

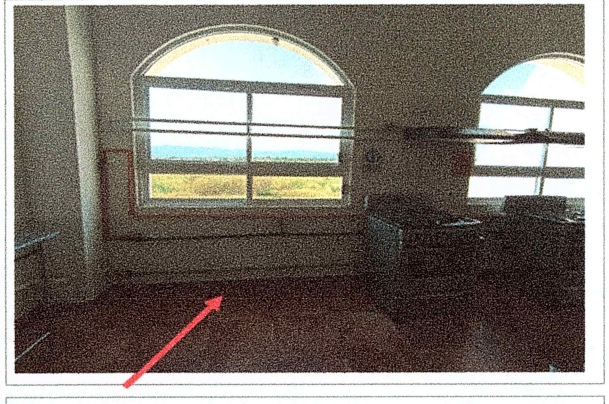

F1: Se equipará el Laboratorio de Preparación de Alimentos, con una estufa Industrial



F2: Se equipará el laboratorio de Innovación de Alimentos, con una Selladora al vacío



F2: Se equipará el laboratorio de Innovación de Alimentos, con una Selladora al vacío

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD: 2

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec Subsede Axochiapan)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS





Dirección Postal:
Libramiento 7,C.P. 62956 Axochiapan Morelos

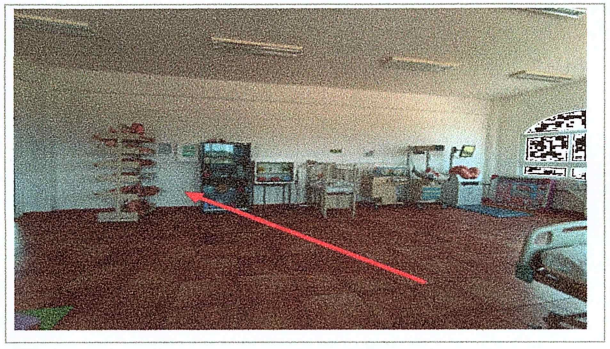


F3: Se equipará el Laboratorio de Gineco-Obstetricia, con un Monitor de signos vitales



F3: Se equipará el Laboratorio de Gineco-Obstetricia, con un Monitor de signos vitales

FOTOS DESPUÉS

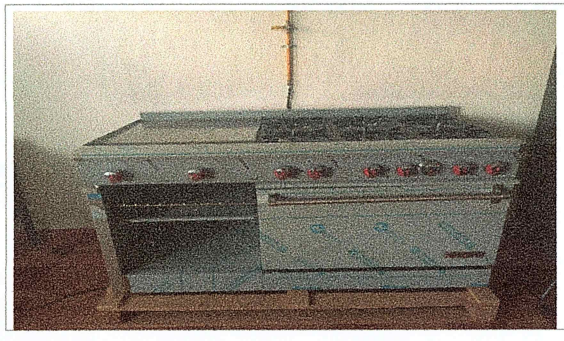

Se equipó el Laboratorio de Preparación de Alimentos, con una estufa Industrial



Se equipó el Laboratorio de Preparación de Alimentos, con una estufa Industrial

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2025
EJERCICIO FISCAL	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD **2**

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec Subsede Tetecala)**

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

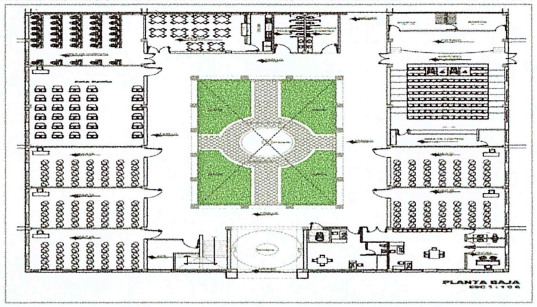

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Dirección Postal:
Av. Lázaro Cardenas, Esquina con Calle de Altamirano S/N, Col. Centro, Tetecala, Morelos

FOTOS ANTES



Fachada de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec Subsede Tetecala

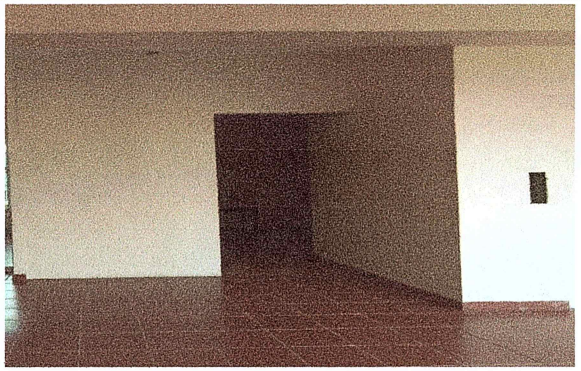

F1: Se equipará el Laboratorio 3, con 3 Monitores de signos vitales (6 Parámetros).


Observaciones :

El presente reporte fotográfico muestra los espacios que se beneficiaron con el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



F1: Se equipará el Laboratorio 3, con 3 Monitores de signos vitales (6 Parámetros).

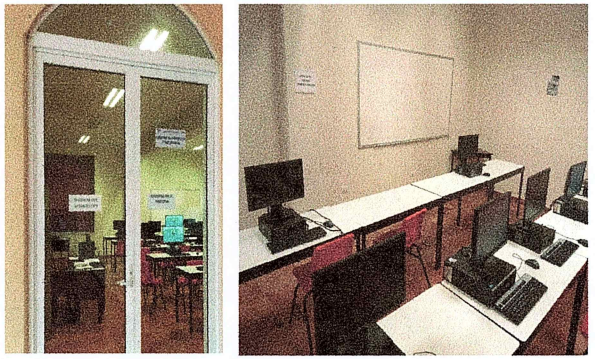

F2: Se equipará el Centro de Cómputo, con 4 sillas ejecutivas y 1 mesa de polipropileno.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2025
EJERCICIO FISCAL	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance


100%

PRIORIDAD **2** Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec Subsede Tetecala)**

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

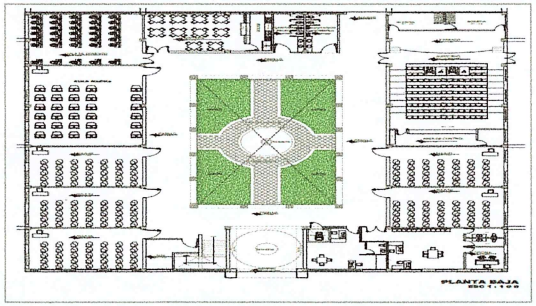

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Dirección Postal:
Av. Lázaro Cardenas, Esquina con Calle de Altamirano S/N, Col. Centro, Tetecala, Morelos

FOTOS DESPUÉS



F1: Se equipó el Laboratorio 3, con 3 Monitores de paciente pediátrico, adultos y neonatos.

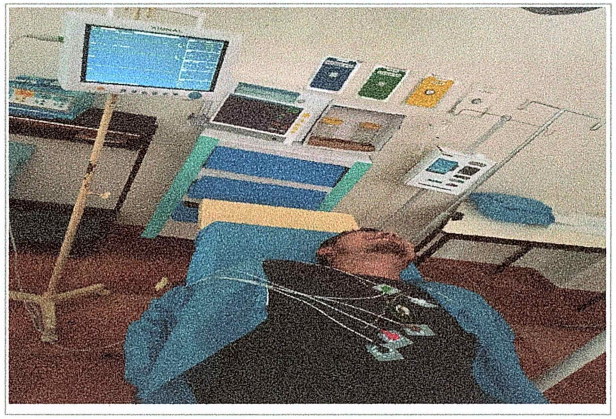

F1: Se equipó el Laboratorio 3, con 3 Monitores de paciente pediátrico, adultos y neonatos.




F1: Se equipó el Laboratorio 3, con 3 Monitores de paciente pediátrico, adultos y neonatos.



F2: Se equipó el Centro de Cómputo, con 4 sillas ejecutivas.



F2: Se equipó el Centro de Cómputo, con 4 sillas ejecutivas.

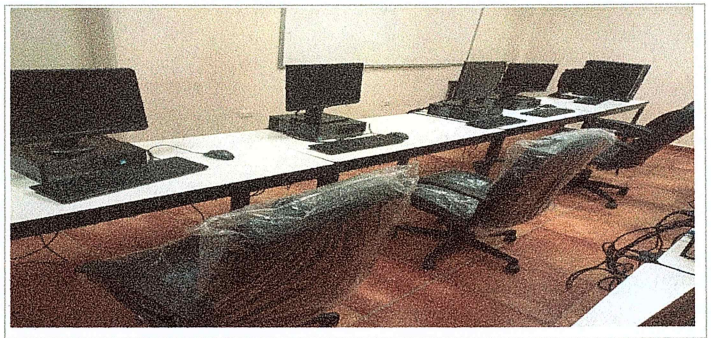

F2: Se equipó el Centro de Cómputo, con 4 sillas ejecutivas.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2025
EJERCICIO FISCAL	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD: 2

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec Subsede Tetecala)**

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

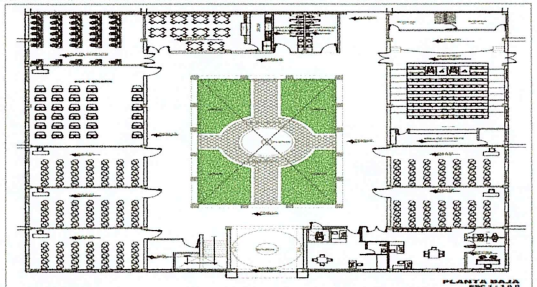


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Dirección Postal:
Av. Lázaro Cardenas, Esquina con Calle de Altamirano S/N, Col. Centro, Tetecala, Morelos



F2: Se equipó el Centro de Cómputo, con 4 sillas ejecutivas.

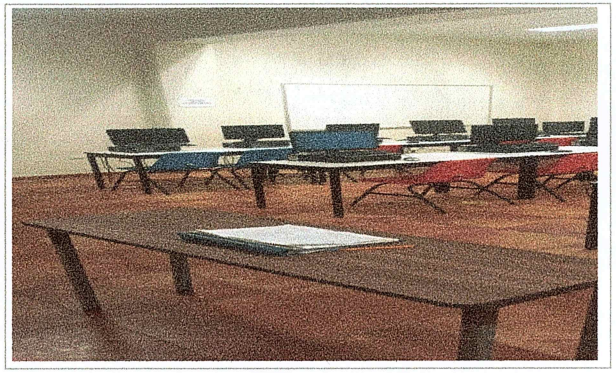

F2: Se equipó el Centro de Cómputo, con 1 mesa de binaria.

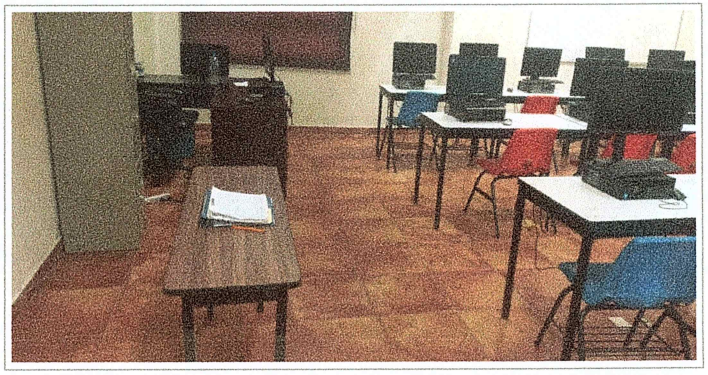

F2: Se equipó el Centro de Cómputo, con 1 mesa de binaria.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD **2**

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Escuela de Estudios Superiores del Jicarero)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

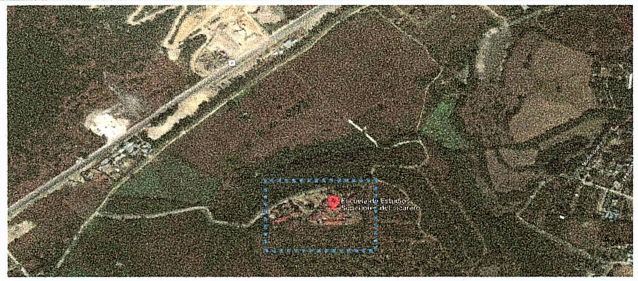

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

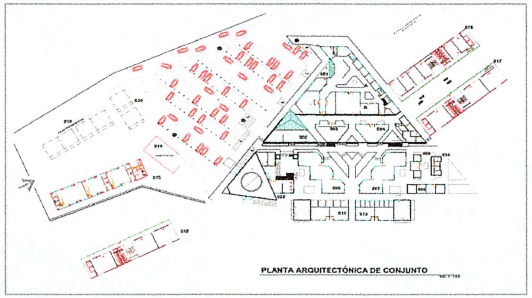

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Carretera Galeana- Tequesquitengo s/n, Comunidad El Jicarero, Jojutla, Morelos

FOTOS ANTES



Fachada de la Escuela de Estudios Superiores del Jicarero



F1: Se equipará el Laboratorio de alimentos Edificio 12, con 2 Estufas industriales y 2 Campanas de cocina .

Observaciones :

El presente reporte fotográfico muestra los espacios que se beneficiaron con el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



F1: Se equipará el Laboratorio de alimentos Edificio 12, con 2 Estufas industriales y 2 Campanas de cocina .

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2025
EJERCICIO FISCAL	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD **2**

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Escuela de Estudios Superiores del Jicarero)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

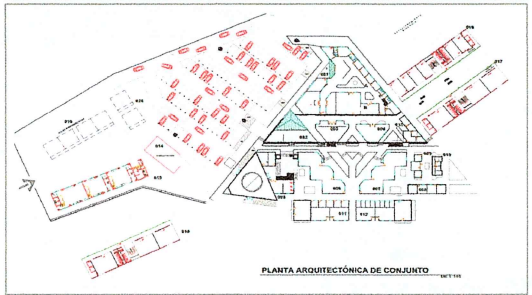

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Carretera Galeana- Tequesquitengo s/n, Comunidad El Jicarero, Jojutla, Morelos

FOTOS DESPUÉS



F1: Se equipó el Laboratorio de alimentos Edificio 12, con 2 Estufas industriales y 2 Campanas de cocina.



F1: Se equipó el Laboratorio de alimentos Edificio 12, con 2 Estufas industriales y 2 Campanas de cocina .



Etiquetas de campanas de cocina instaladas en el Laboratorio de alimentos Edificio 12.



Etiquetas de estufas industriales instaladas en el Laboratorio de alimentos Edificio 12.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD 2

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Escuela de Estudios Superiores de Yecapixtla)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

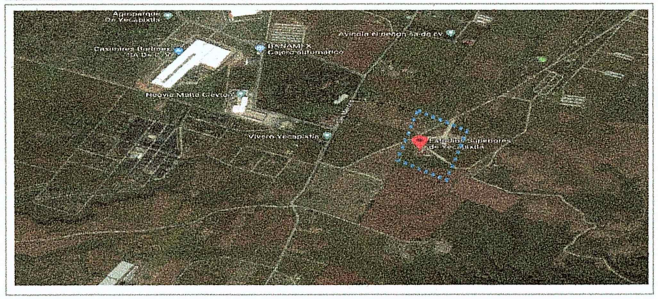

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

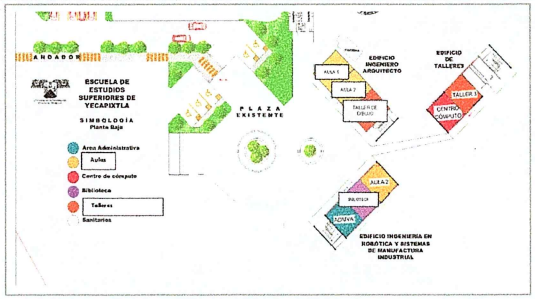

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Dirección Postal:
Avenida Félix Arias, Quinta Sección de los Amates, Yecapixtla, Morelos

FOTOS ANTES



Fachada de la Escuela de Estudios Superiores de Yecapixtla

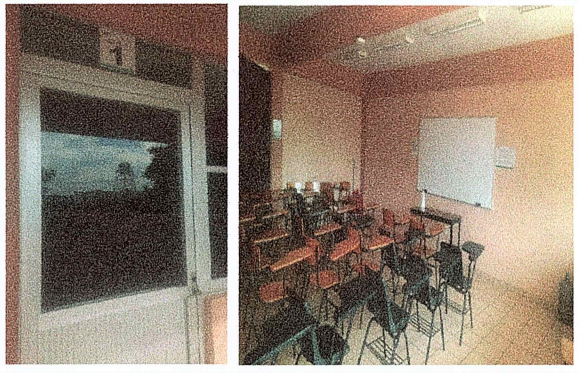

F1: Se equipará el Aula 1, edificio de Ingeniero Arquitecto, con 35 Sillas acojinadas y 17 mesas.

Observaciones :

El presente reporte fotográfico muestra los espacios que se beneficiaron con el fondo.


VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



F2: Se equipará el Aula 3, edificio de Ingeniero Arquitecto, con 31 Sillas acojinadas y 15 mesas .



F3: Se equipará el Aula 5, edificio de Ingeniero Arquitecto, con 25 Sillas acojinadas y 12 mesas .

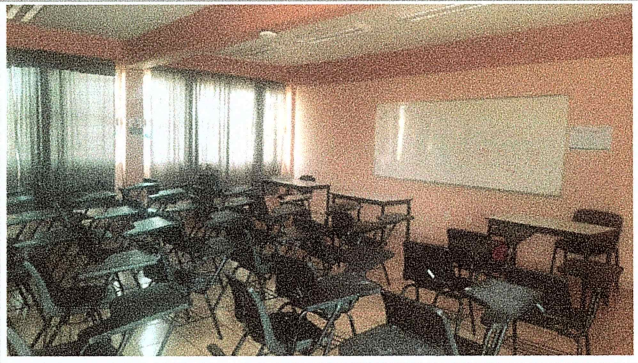

F4: Se equipará el Aula 7, edificio de Ingeniero Arquitecto, con 14 Sillas acojinadas y 7 mesas.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD 2

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Escuela de Estudios Superiores de Yecapixtla)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

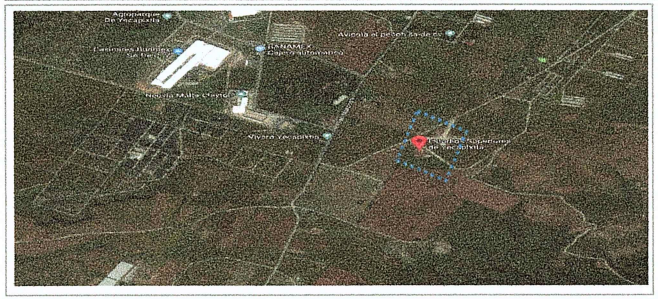

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

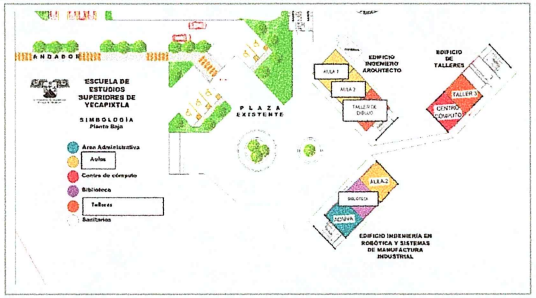


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Avenida Félix Arias, Quinta Sección de los Amates, Yecapixtla, Morelos


FOTOS DESPUÉS

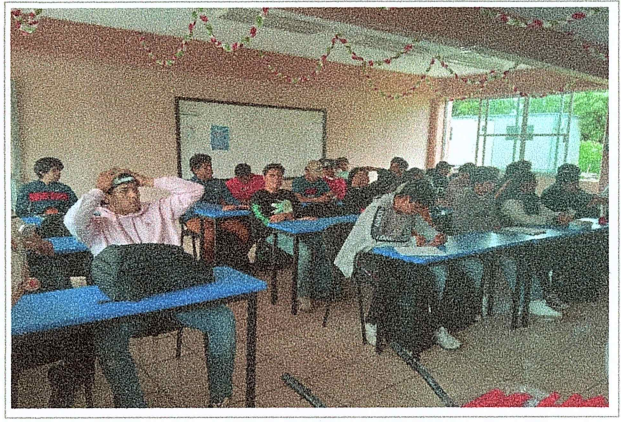

F1: Se equipó el Aula 1, edificio de Ingeniero Arquitecto, con 35 Sillas acojinadas y 17 mesas.



F1: Se equipó el Aula 1, edificio de Ingeniero Arquitecto, con 35 Sillas acojinadas y 17 mesas

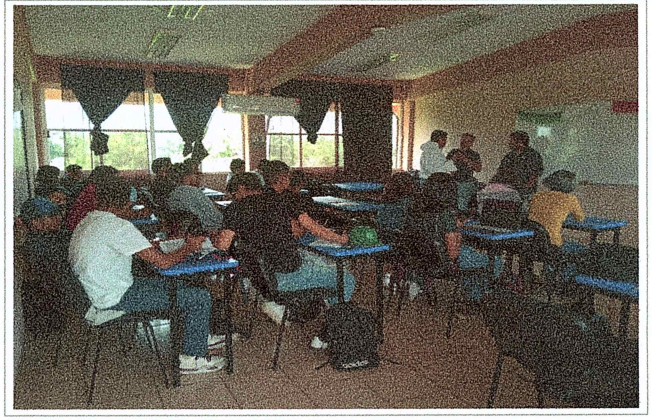

F2: Se equipó el Aula 3, edificio de Ingeniero Arquitecto, con 31 Sillas acojinadas y 15 mesas.



F2:Se equipó el Aula 3, edificio de Ingeniero Arquitecto, con 31 Sillas acojinadas y 15 mesas.



F3: Se equipó el Aula 5, edificio de Ingeniero Arquitecto, con 25 Sillas acojinadas y 12 mesas.



F3:Se equipó el Aula 5, edificio de Ingeniero Arquitecto, con 25 Sillas acojinadas y 12 mesas.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

2024	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2025
EJERCICIO FISCAL	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance


100%

PRIORIDAD **2** Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Escuela de Estudios Superiores de Yecapixtla)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

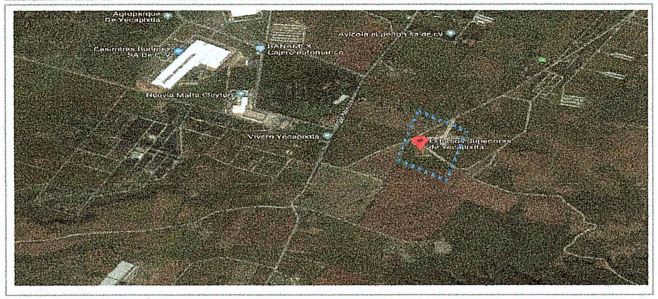

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

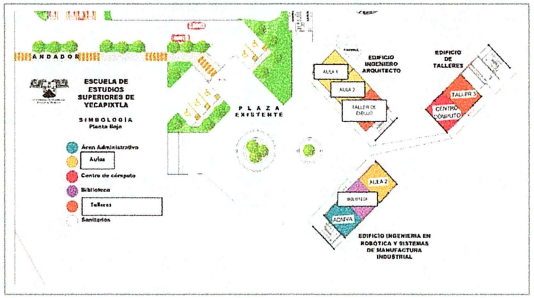

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Avenida Félix Arias, Quinta Sección de los Amates, Yecapixtla, Morelos



F4: Se equipó el Aula 7, edificio de Ingeniero Arquitecto, con 14 Sillas acojinadas y 7 mesas.



F4: Se equipó el Aula 7, edificio de Ingeniero Arquitecto, con 14 Sillas acojinadas y 7 mesas.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD 2

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Escuela de Estudios Superiores de Yautepec)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

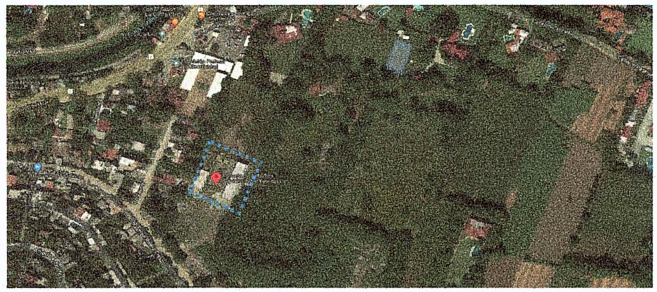

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

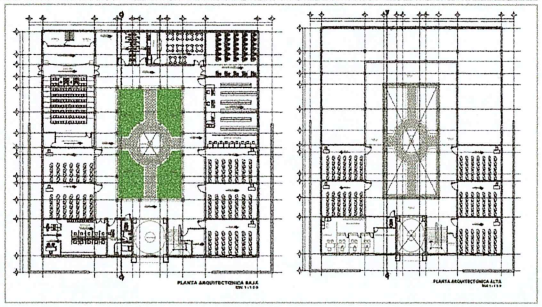


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

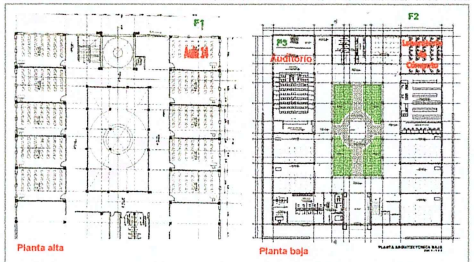

Dirección Postal:
Buenavista, C.P. 62730 Yautepec de Zaragoza, Morelos.

FOTOS ANTES

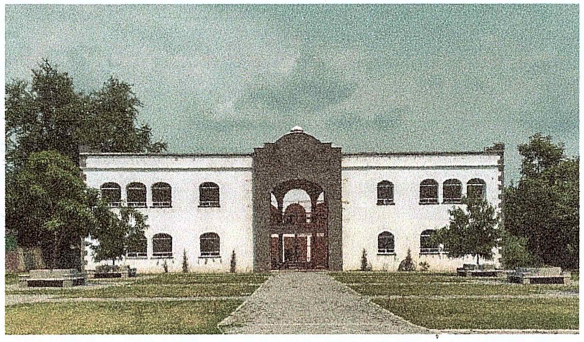

Fachada de la Escuela de Estudios Superiores de Yautepec




F1 : Se equipará el Aula 14, con un Aire acondicionado.


Observaciones :

El presente reporte fotográfico muestra los espacios que se beneficiaron con el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

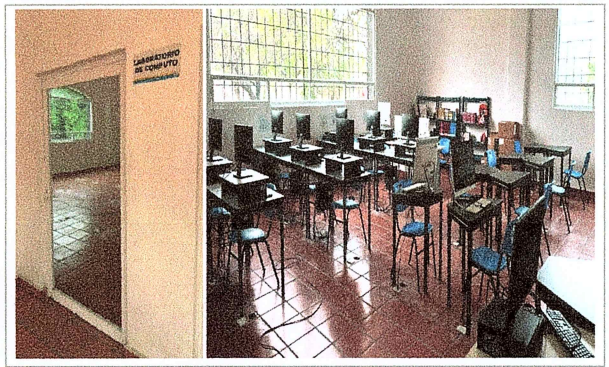

F2 : Se equipará el Centro de cómputo, con un Aire acondicionado

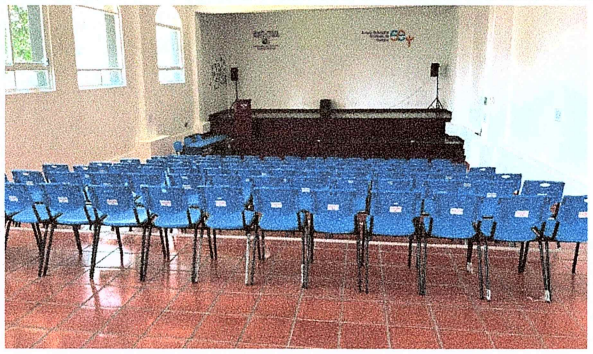

F3 : Se equipará el Auditorio, con un Aire acondicionado.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD **2**

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Escuela de Estudios Superiores de Yautepec)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

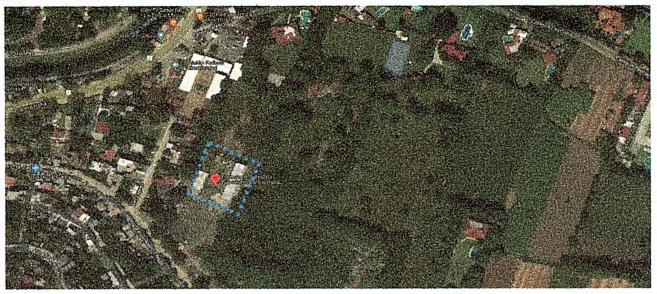

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

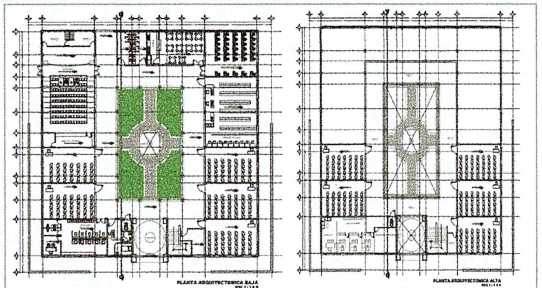


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

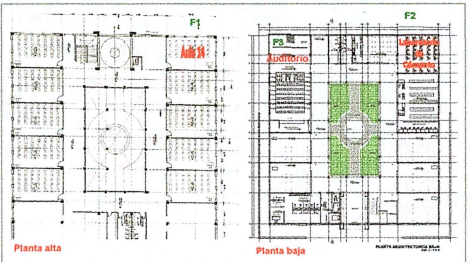

Dirección Postal:
Buenavista, C.P. 62730 Yautepec de Zaragoza, Morelos.

FOTOS DESPUÉS

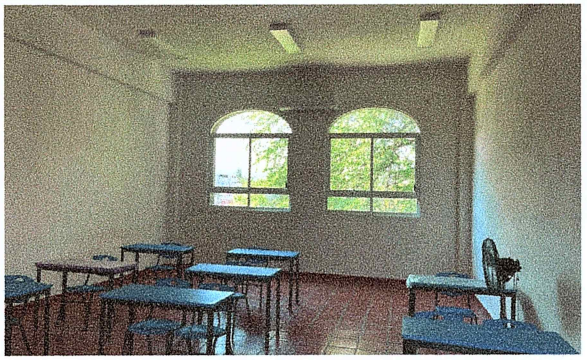

F1 : Se equipó el Aula 14, con un Aire acondicionado.



F2 : Se equipó el Centro de cómputo, con un Aire acondicionado



F3 : Se equipó el Auditorio, con un Aire acondicionado.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2025
EJERCICIO FISCAL	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD **2**

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan)**

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

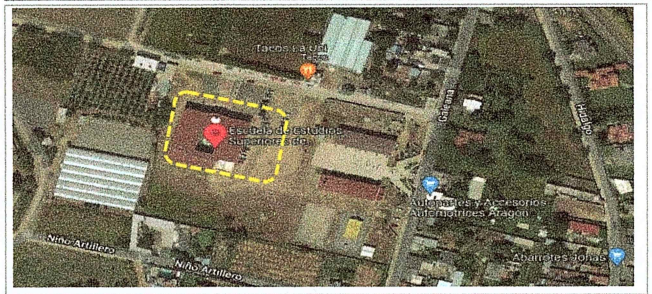

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

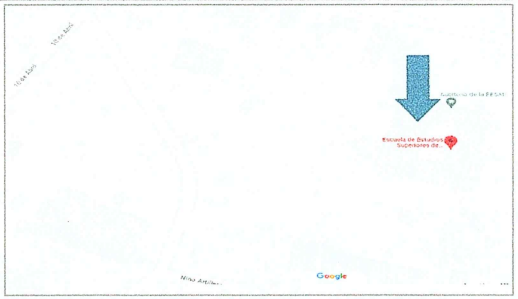

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Dirección Postal:
Galeana 146, San Antonio, 62840 Atlatlahucan, Morelos.

FOTOS ANTES



Fachada de la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan



F1: Se equipará el Aula de Clases 2, con un proyector.


Observaciones :

El presente reporte fotográfico muestra los espacios que se beneficiaron con el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



F2: Se equipará el Aula de Clases 5, con un proyector.

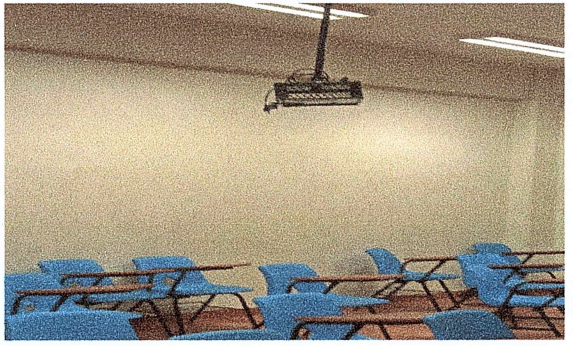

F3: Se equipará el Aula de Clases 6, con un proyector.



F4: Se equipará el Aula de Clases 9, con un proyector.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2025
EJERCICIO FISCAL	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance


100%

PRIORIDAD **2** Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

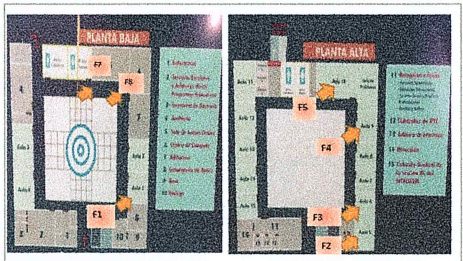

Dirección Postal:
Galeana 146, San Antonio, 62840 Atlatlahucan, Morelos.



F5: Se equipará el Aula de Clases 10, con un proyector.




F6: Se equipará el Centro de Cómputo, con un proyector.



F7: Se equipará el sala de juicios orales, con un proyector.

FOTOS DESPUÉS

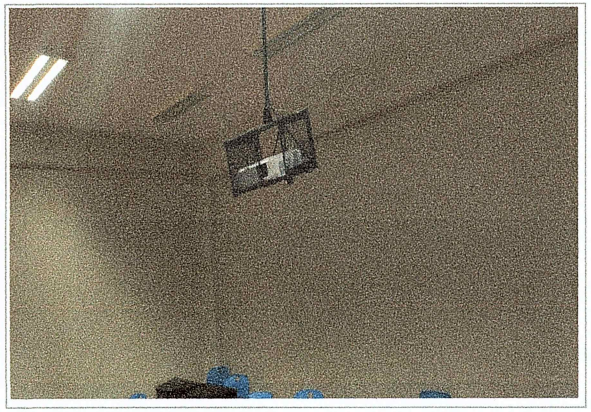

F1: Se equipó el Aula de Clases 2, con un proyector.



F1: Se equipó el Aula de Clases 2, con un proyector.



F2: Se equipó el Aula de Clases 5, con un proyector.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD **2**

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO




CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

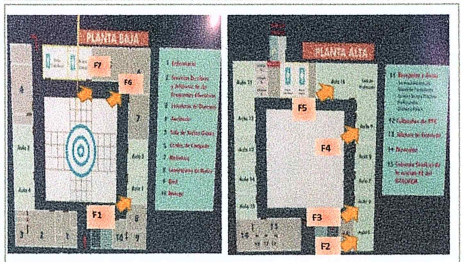


Dirección Postal:
Galeana 146, San Antonio, 62840 Atlatlahucan, Morelos.

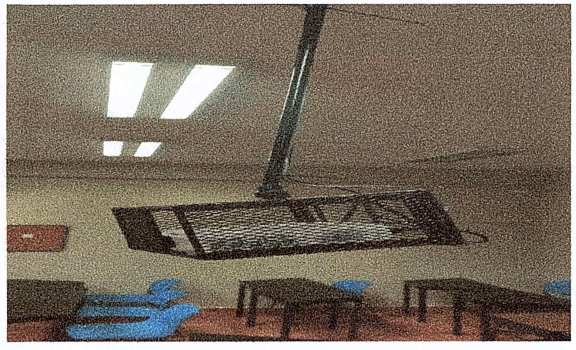

F2: Se equipó el Aula de Clases 5, con un proyector.

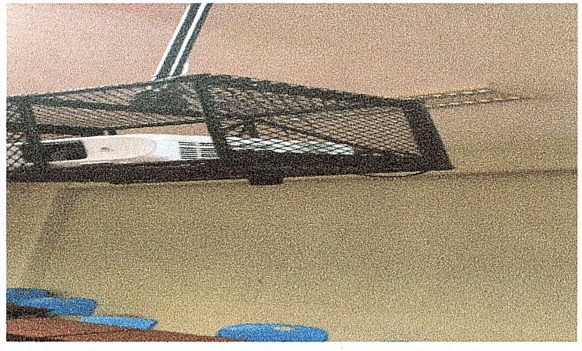

F3: Se equipó el Aula de Clases 6, con un proyector.

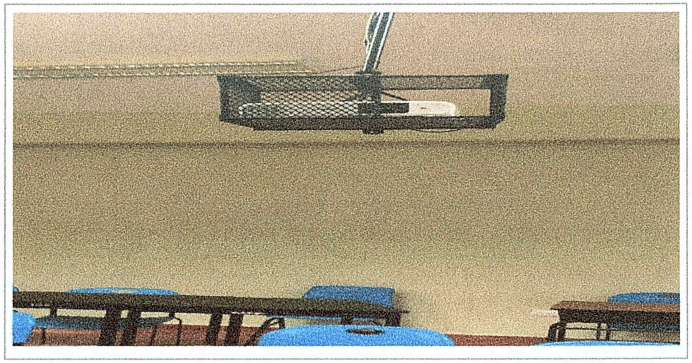

F4: Se equipó el Aula de Clases 9, con un proyector.



F5: Se equipó el Aula de Clases 10, con un proyector.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2025
EJERCICIO FISCAL	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD **2**

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan Subsede Totolapan)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

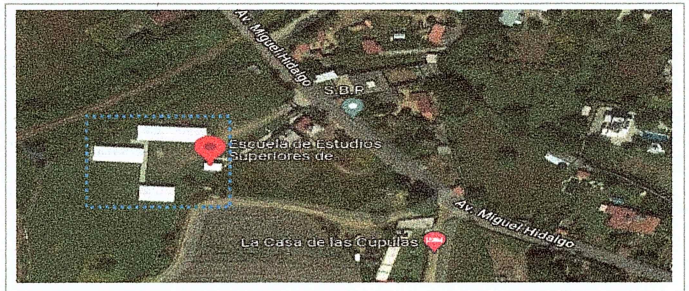

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

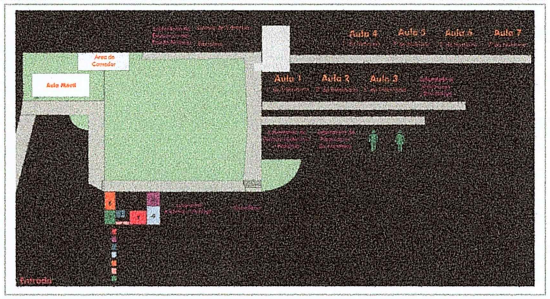


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Carretera Totolapan-Nepopualco S/N Ahuatlán Totolapan Morelos

FOTOS ANTES

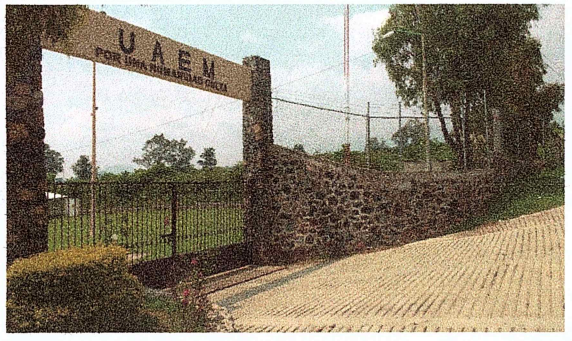

Fachada de la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan Subsede Totolapan




F1: Se equipará el Aula de Clases 1, con un proyector

Observaciones :

El presente reporte fotográfico muestra los espacios que se beneficiaron con el fondo.


VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



F2: Se equipará el Aula de Clases 2, con un proyector



F3: Se equipará el Aula de Clases 3, con un proyector

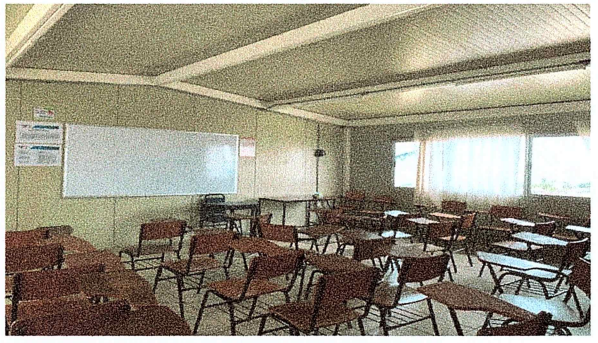

F4: Se equipará el Aula de Clases 4, con un proyector

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD 2

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan Subsede Totolapan)**

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

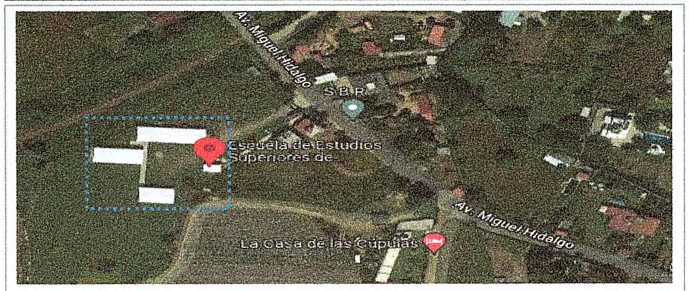


CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

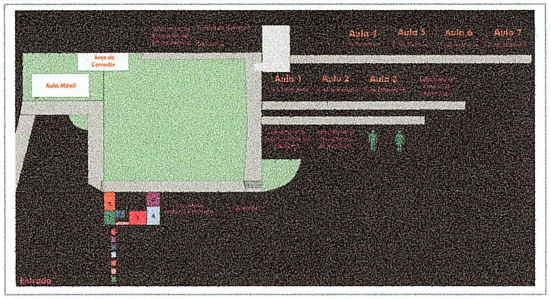

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Dirección Postal:
Carretera Totolapan-Nepopualco S/N Ahuatlán Totolapan Morelos

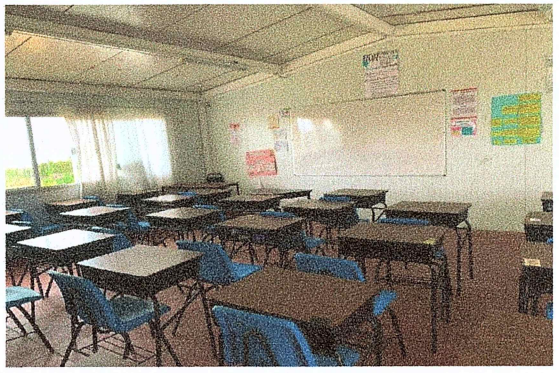

F5: Se equipará el Aula de Clases 5, con un proyector.




F6: Se equipará el Aula de Clases 6, con un proyector.

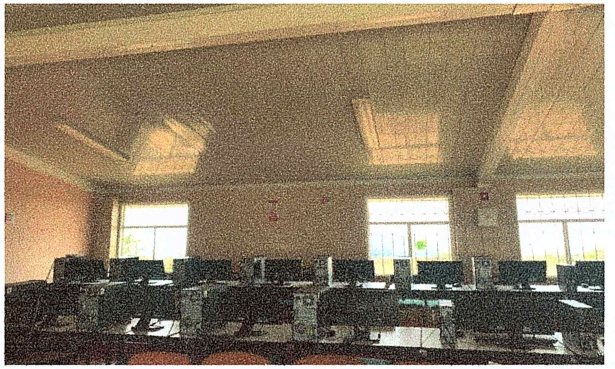

F7: Se equipará el Centro de Cómputo, con un proyector

FOTOS DESPUÉS



Se equipó el Aula de Clases 2, con un proyector.



Se equipó el Aula de Clases 3, con un proyector.



Se equipó el Aula de Clases 5, con un proyector.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024
EJERCICIO FISCAL

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD **2**

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan Subsede Totolapan)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

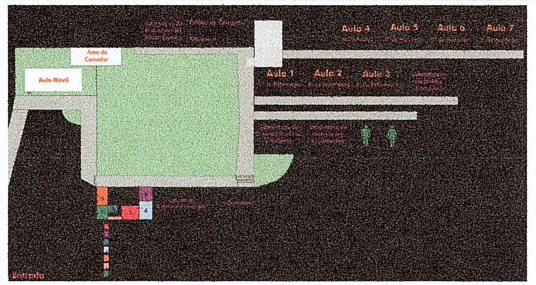

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Carretera Totolapan-Nepopualco S/N Ahuatlán Totolapan Morelos



Se equipó el Aula de Clases 6, con un proyector.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydee León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD 2

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Escuela de Estudios Superiores de Jojutla)**

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

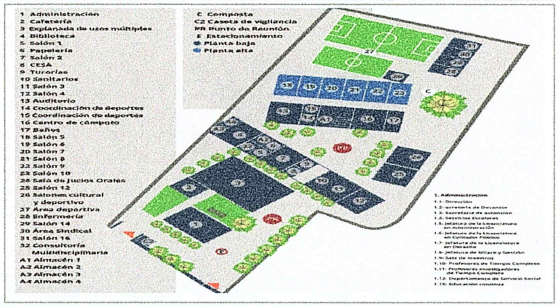

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Dirección Postal:
Av. 18 de Marzo No. 617, Col. Emiliano Zapata, Jojutla Morelos.

FOTOS ANTES



Fachada de la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla



F1: Se equipará el Salón 11, con 28 Paleta Metálica Ancha.

Observaciones :

El presente reporte fotográfico muestra los espacios que se beneficiaron con el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



F2: Se equipará el Salón 11, con 28 Paleta Metálica Ancha.



F3: Se equipará el Salón 12, con 27 Paleta Metálica Ancha.



F4: Se equipará el Salón 12, con 27 Paleta Metálica Ancha.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2025
EJERCICIO FISCAL	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

100%

PRIORIDAD **2**

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Escuela de Estudios Superiores de Jojutla)**

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Dirección Postal:
Av. 18 de Marzo No. 617, Col. Emiliano Zapata, Jojutla Morelos.

FOTOS DESPUES

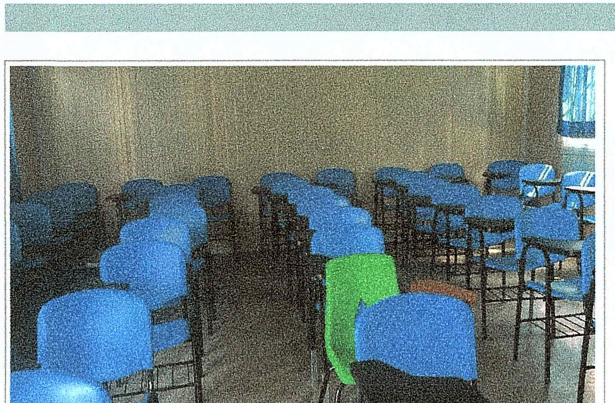

F2: Se equipó el Salón 11, con 28 Paleta Metálica Ancha.

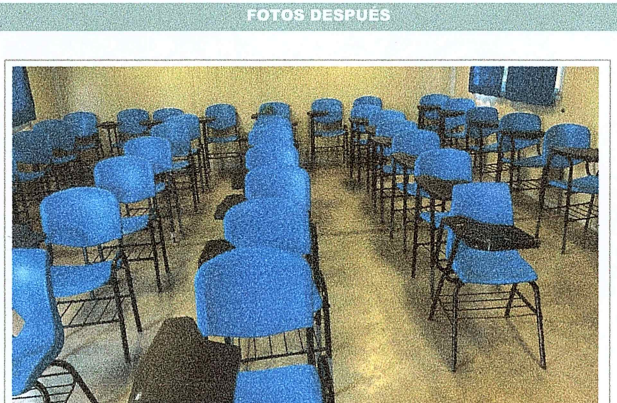

F3: Se equipó el Salón 12, con 27 Paleta Metálica Ancha.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD 2

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

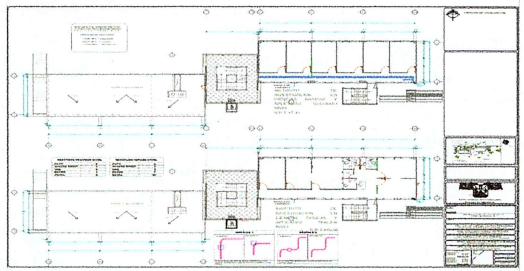

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

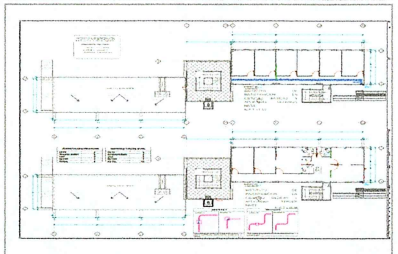


Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

FOTOS ANTES



Fachada del IICBA

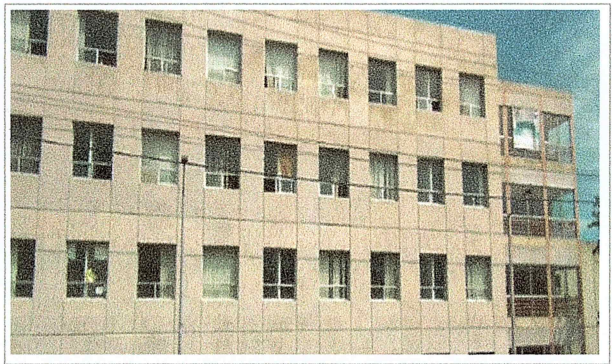

F1: Se equipará el exterior del edificio 65, con un Sistema de videovigilancia.

Observaciones :

El presente reporte fotográfico muestra los espacios que se beneficiaron con el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



F2: Se equipará el interior del edificio 65, con un Sistema de videovigilancia



F3: Se equipará el interior del edificio 65, con un Sistema de videovigilancia



F4: Se equipará el interior del edificio 65, con un Sistema de videovigilancia

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD **2**

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

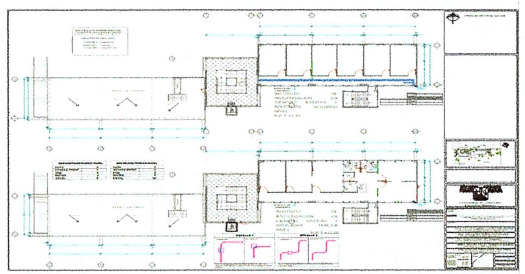


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

FOTOS DESPUES

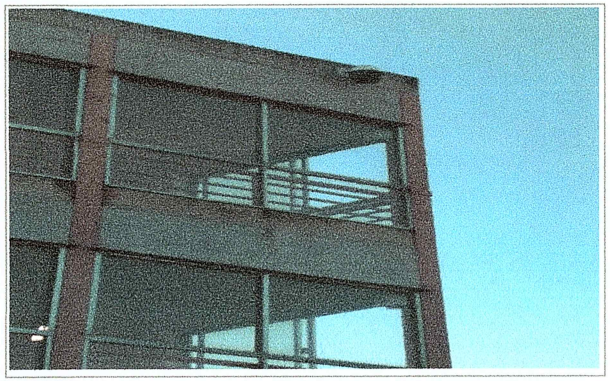

F1: Se equipó el exterior del edificio 65, con Sistema de videovigilancia

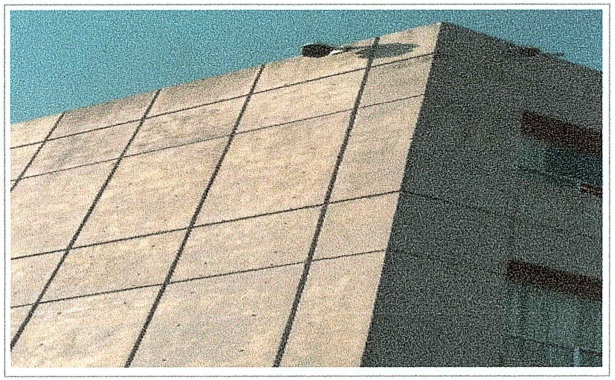

F1: Se equipó el exterior del edificio 65, con Sistema de videovigilancia




F2: Se equipó la planta baja del edificio 65, con Sistema de videovigilancia



F2: Se equipó el primer piso del edificio 65, con Sistema de videovigilancia



F2: Se equipó el primer piso del edificio 65, con Sistema de videovigilancia



F2: Se equipó el primer piso del edificio 65, con Sistema de videovigilancia

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD **2**

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

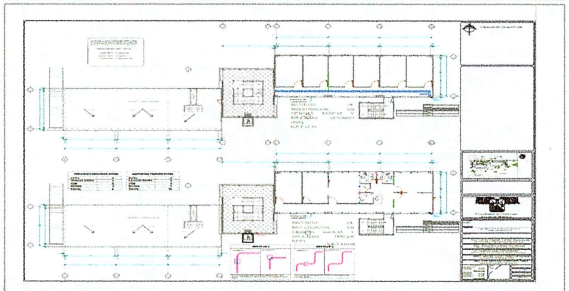

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.



F2: Se equipó el primer piso del edificio 65, con Sistema de videovigilancia



F3: Se equipó el segundo piso del edificio 65, con Sistema de videovigilancia



F3: Se equipó el segundo piso del edificio 65, con Sistema de videovigilancia



F3: Se equipó el segundo piso del edificio 65, con Sistema de videovigilancia



F4: Se equipó el tercer piso del edificio 65, con Sistema de videovigilancia



F4: Se equipó el tercer piso del edificio 65, con Sistema de videovigilancia

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD 2

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

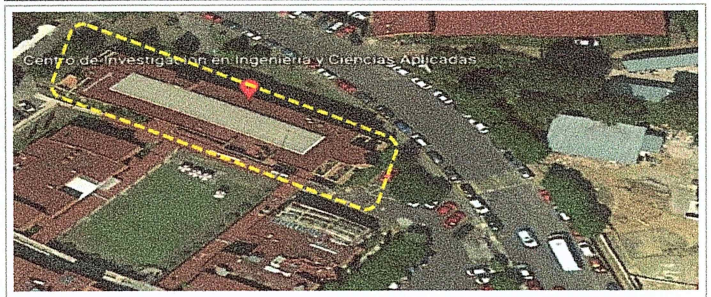

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

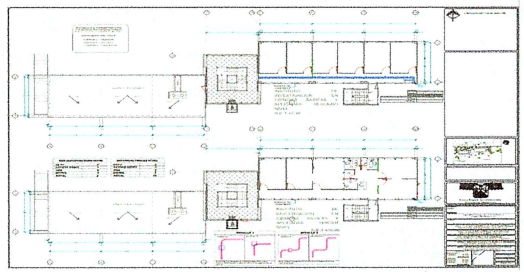

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.



F4: Se equipó el tercer piso del edificio 65, con Sistema de videovigilancia



F4:Se equipó el tercer piso del edificio 65, con Sistema de videovigilancia

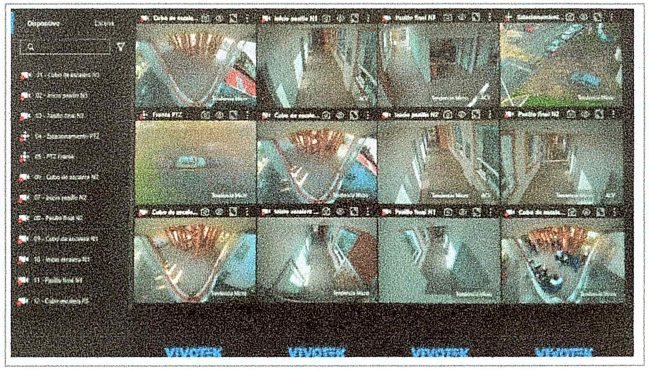

Operación del Sistema de Videovigilancia en el Edificio 65.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD: **2**

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Centro de Investigaciones Químicas CIQ)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

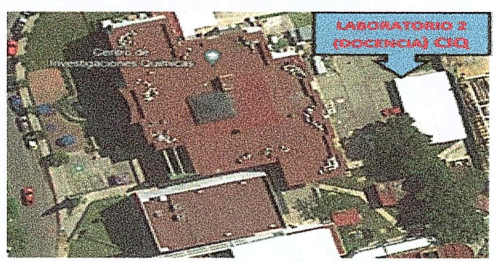

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

FOTOS ANTES



Fachada del CIQ.




F1: Se equipará el Laboratorio de docencia 2 (química), con un espectofotómetro ultravioleta-visible.

Observaciones :


El presente reporte fotográfico muestra los espacios que se beneficiaron con el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.


FOTOS DESPUÉS

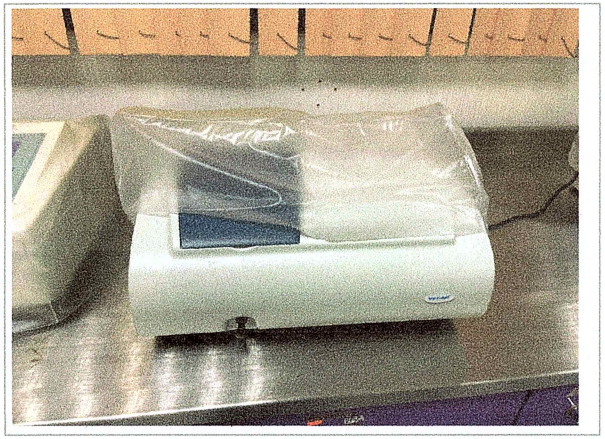

F1:Se equipó el Laboratorio de docencia 2 (química), con un espectofotómetro ultravioleta-visible.

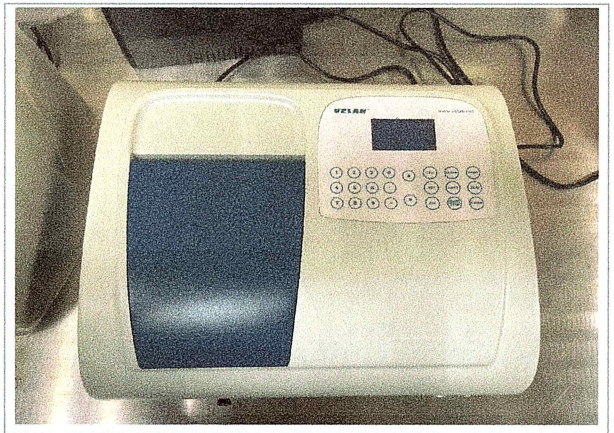

F1:Se equipó el Laboratorio de docencia 2 (química), con un espectofotómetro ultravioleta-visible.

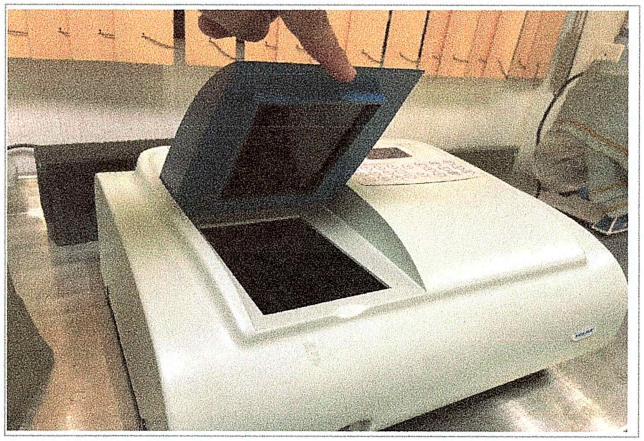

F1:Se equipó el Laboratorio de docencia 2 (química), con un espectofotómetro ultravioleta-visible.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCURTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

PRIORIDAD: 2

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Centro de Investigaciones Químicas CIQ)**


Porcentaje de avance

100%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO




CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

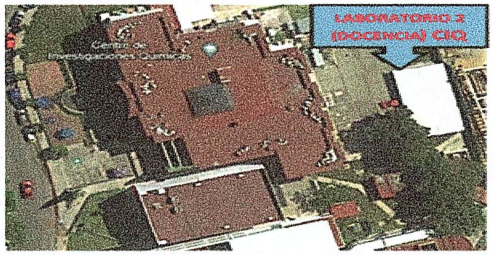

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

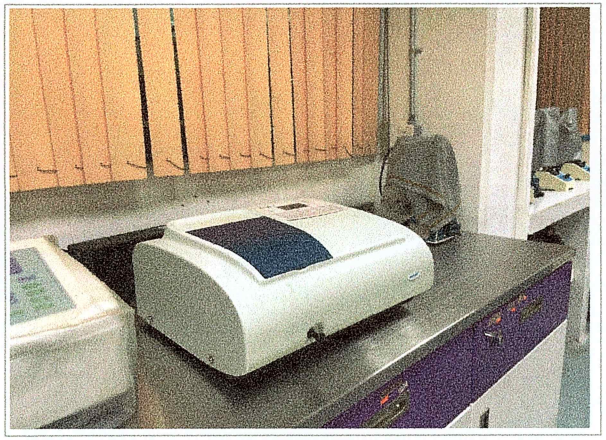

F1:Se equipó el Laboratorio de docencia 2 (química), con un espectofotómetro ultravioleta-visible.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2025
EJERCICIO FISCAL	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD **2**

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Centro De Investigación En Ingeniería y Ciencias Aplicadas CIICAp)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

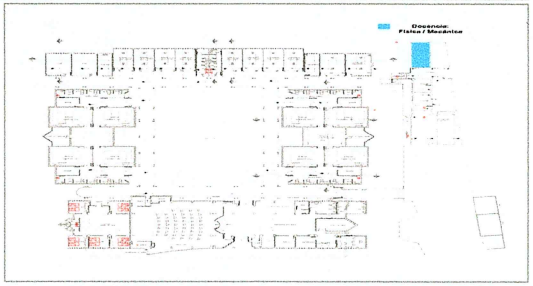

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

FOTOS ANTES



Fachada del CIICAp



F1: Se equipará el Laboratorio de Docencia Física-Mécanica, con una maquina turbo plasma.

Observaciones :

El presente reporte fotográfico muestra los espacios que se beneficiaron con el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

FOTOS DESPUÉS



F1: Se equipó el Laboratorio de Docencia Física-Mécanica, con una maquina turbo plasma.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD **2**

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario CIIDU)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

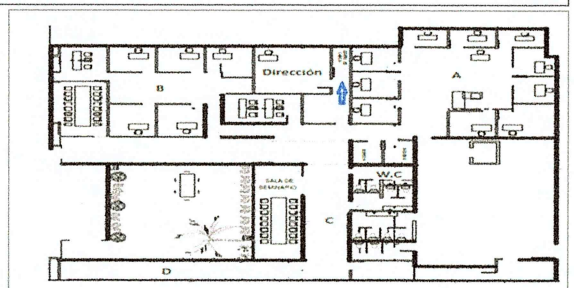

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

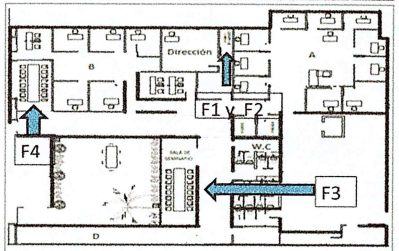

Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

FOTOS ANTES



Fachada del CIIDU.




F1: Se equipará la sala de usos múltiples 3, con 2 switch 5320

Observaciones :

El presente reporte fotográfico muestra los espacios que se beneficiaron con el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

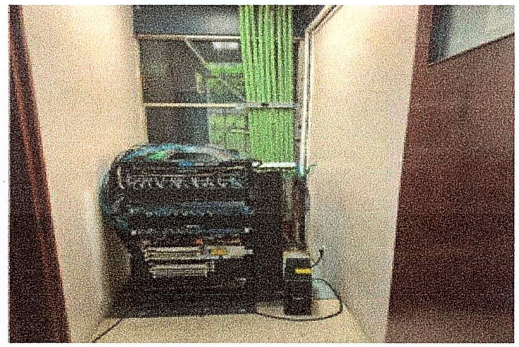

F2: Se equipará la sala de usos múltiples 3, con 2 switch 5320



F3: se equipará el salón de posgrado 1, con un videoproyector



F4: se equipará el salón de posgrado 2, con un videoproyector

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2025
EJERCICIO FISCAL	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD **2**

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario CIIDU)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

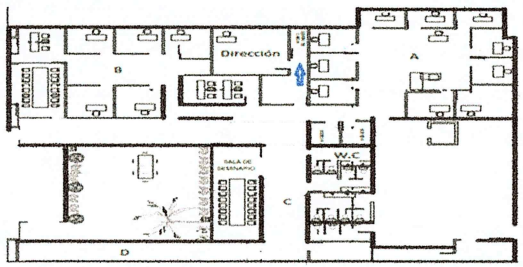


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

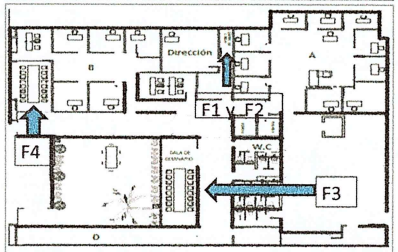


Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

FOTOS DESPUÉS

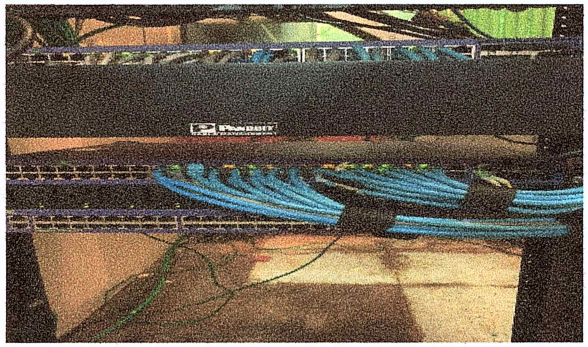


F2: Se equipó la sala de usos múltiples 3, con 2 switch 5320

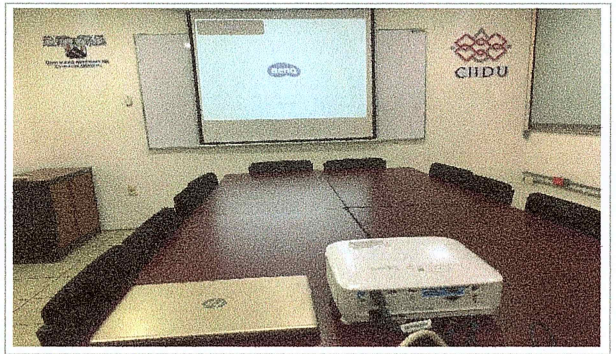

F3: Se equipó el salón de posgrado 1, con un videoproyector



F3: Se equipó el salón de posgrado 1, con un videoproyector



F4: se equipó el salón de posgrado 2, con un videoproyector



F4: se equipó el salón de posgrado 2, con un videoproyector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD **2**

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología CITPsi)**

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

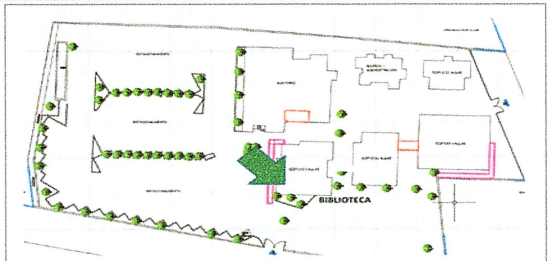

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Calle Pico de Orizaba No. 1, Col. Volcanes, Cuernavaca, Morelos. C.P. 62350.

FOTOS ANTES



Fachada del CITPsi.



F1: Se equipará la Biblioteca con 1 mesa multipuestos con separadores y arcos para protección.

Observaciones :

El presente reporte fotográfico muestra los espacios que se beneficiaron con el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



F2: Se equipará la Biblioteca con 1 mesa multipuestos con separadores y arcos para protección.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD 2

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología CITPsi)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

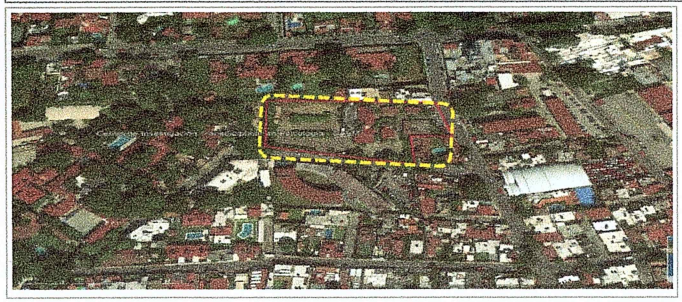

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

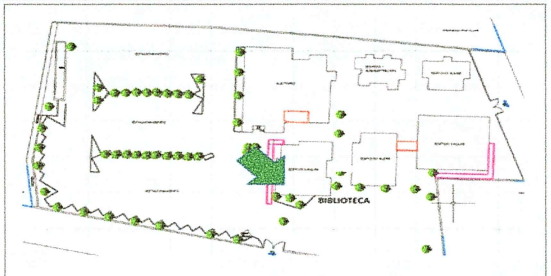

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

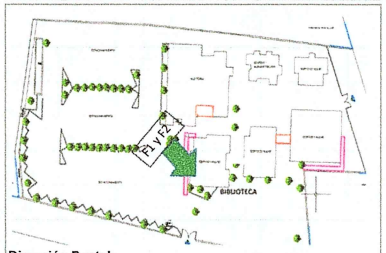

Dirección Postal:
Calle Pico de Orizaba No. 1, Col. Volcanes, Cuernavaca, Morelos. C.P. 62350.

FOTOS DESPUÉS



F1: Se equipó la Biblioteca con arcos para protección.



F1: Se equipó la Biblioteca con arcos para protección.



F2: Se equipó la Biblioteca con 1 mesa multipuestos con separadores y arcos para protección.



F2: Se equipó la Biblioteca con 1 mesa multipuestos con separadores y arcos para protección.



F2: Se equipó la Biblioteca con 1 mesa multipuestos con separadores y arcos para protección.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD **2**

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Centro de Investigación en Dinámica Celular CIDC)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

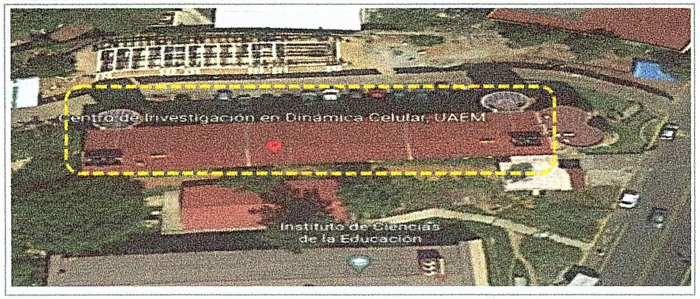

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

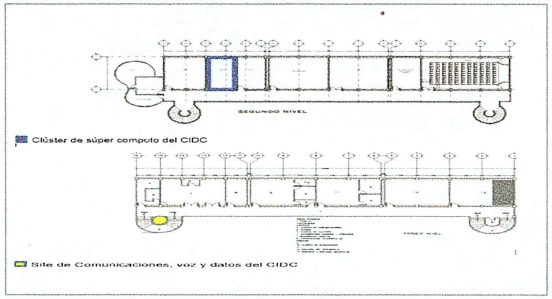

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

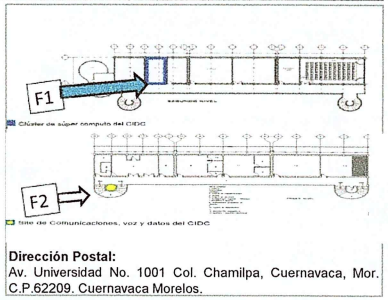

Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

FOTOS ANTES



Fachada del CIDC.




F1: Se equipará el Clúster de súper computo para análisis bioinformáticos y dinámicas celulares con un aire acondicionado.

Observaciones :

El presente reporte fotográfico muestra los espacios que se beneficiaron con el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

FOTOS DESPUÉS

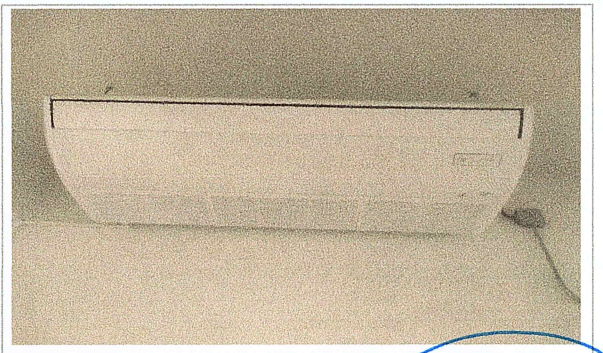

F1: Se equipó el Clúster de súper computo para análisis bioinformáticos y dinámicas celulares con un aire acondicionado.



F1: Se equipó el Clúster de súper computo para análisis bioinformáticos y dinámicas celulares con un aire acondicionado.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD 2

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas CINCCO)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

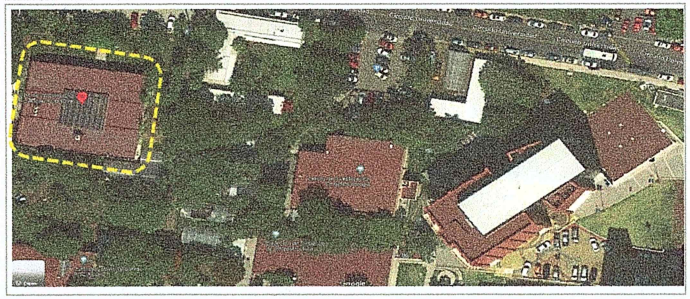

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

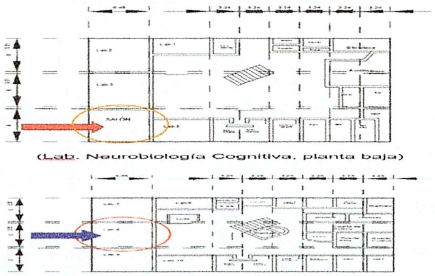


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

FOTOS ANTES

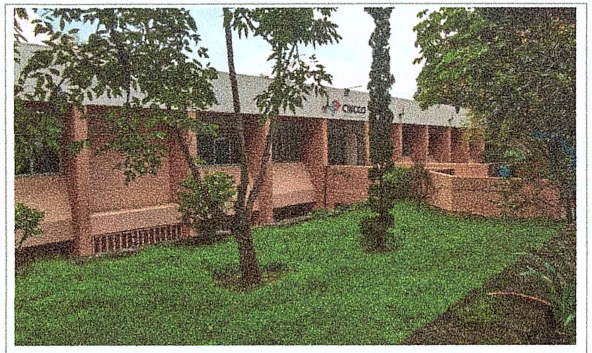

Fachada del CINCCO.



F1: Se equipará el salón 4 con una mesa de trabajo y un proyector.


Observaciones :

El presente reporte fotográfico muestra los espacios que se beneficiaron con el fondo.


VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



F2: Se equipará el Laboratio de Neurobiología Cognitiva con 2 mesas de trabajo y un proyector.

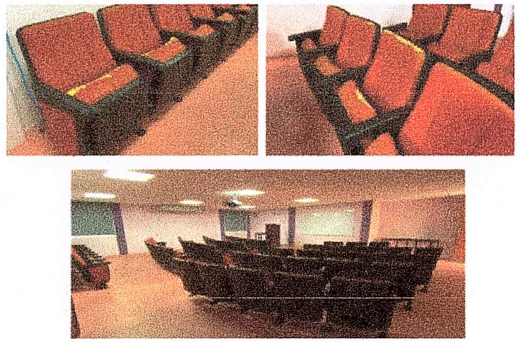

F3: Se equipará el auditorio "Noam Chomsky" con 6 butacas Paris.



F4: Se equipará la ludoteca con un proyector

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD **2**

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas CINCCO)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

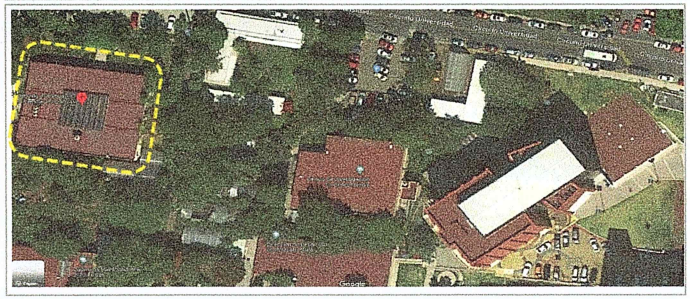

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

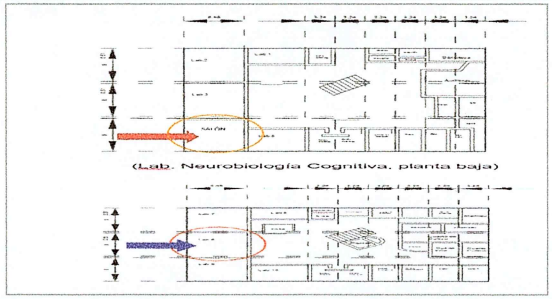

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

FOTOS DESPUÉS




F1: Se equipó el salón 4 con un proyector.



F1: Se equipó el salón 4 con un proyector.



F2:Se equipó el Laboratio de Neurobiología Cognitiva un proyector.

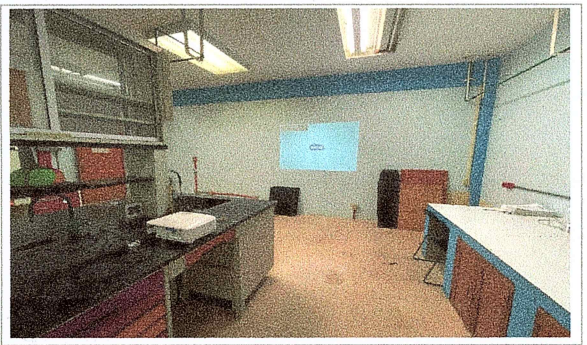

F2:Se equipó el Laboratio de Neurobiología Cognitiva un proyector.



F4: Se equipó la ludoteca con un proyector.



F4: Se equipó la ludoteca con un proyector.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2025
EJERCICIO FISCAL	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance


100%

PRIORIDAD **2** Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Conservación CIByC)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

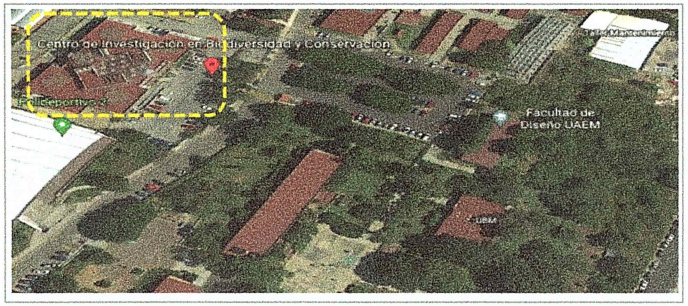

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

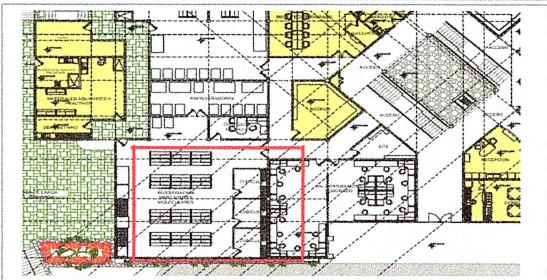

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

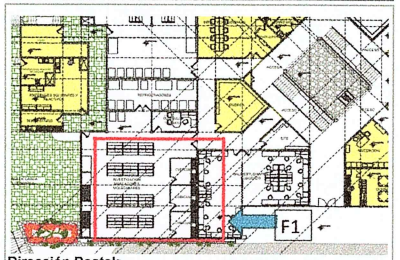


Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

FOTOS ANTES



Fachada del CIByC

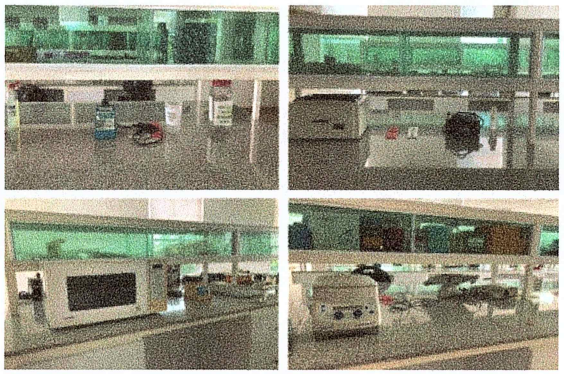


F1: Se equipará el Laboratorio de marcadores moleculares con un visualizador de geles de electroforesis.

Observaciones :


El presente reporte fotográfico muestra los espacios que se beneficiaron con el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.


FOTOS DESPUÉS

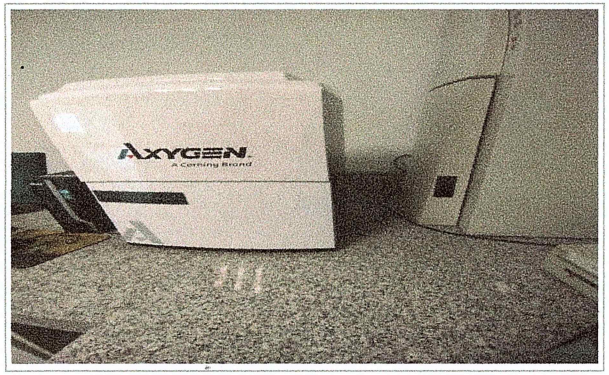

F1: Se equipó el Laboratorio de marcadores moleculares con un visualizador de geles de electroforesis.

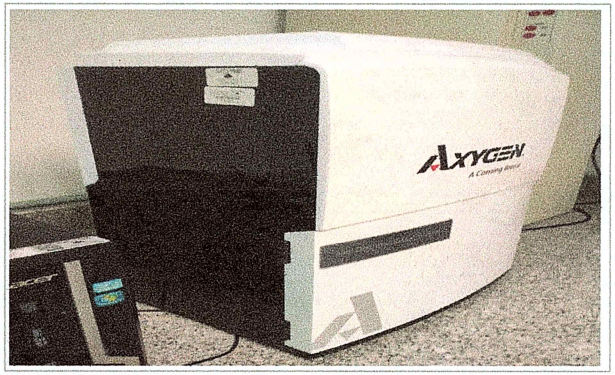

F1: Se equipó el Laboratorio de marcadores moleculares con un visualizador de geles de electroforesis.



F1: Se equipó el Laboratorio de marcadores moleculares con un visualizador de geles de electroforesis.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2025
EJERCICIO FISCAL	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance


100%

PRIORIDAD **2** Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Conservación CIByC)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

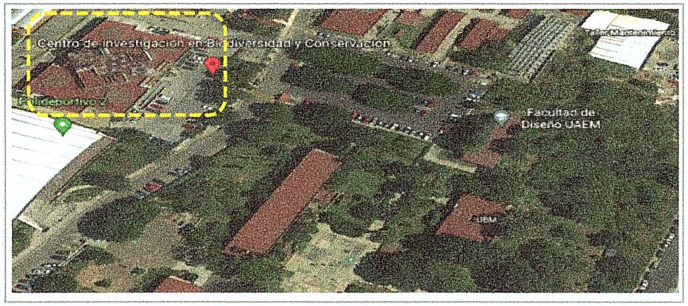


CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

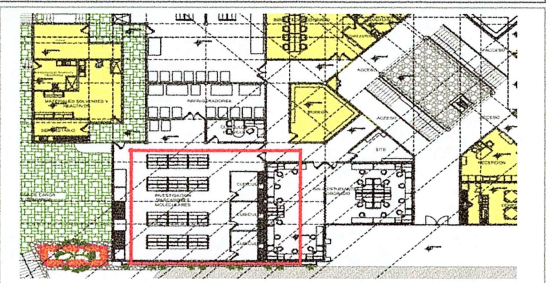

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

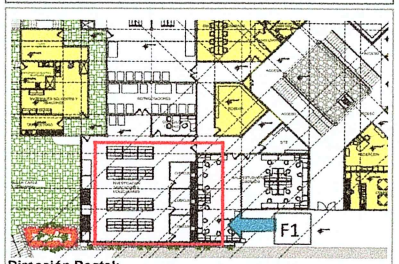

Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.



F1: Se equipó el Laboratorio de marcadores moleculares con un visualizador de geles de electroforesis.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD 2

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Remanentes Centro de Investigación en Dinámica Celular CIDC)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

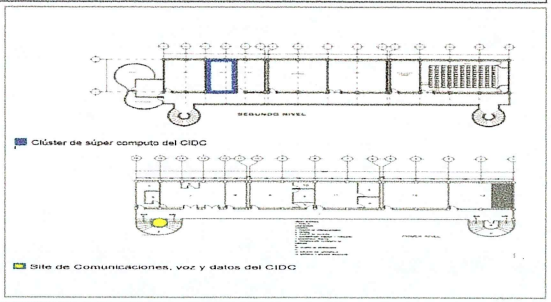

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

FOTOS ANTES



Fachada del CIDC.



Se equipará el salón 1 con 1 videoproyector.


Observaciones :

El presente reporte fotográfico muestra los espacios que se beneficiaron con el fondo.


VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



Se equipará el salón 5 con 1 videoproyector.

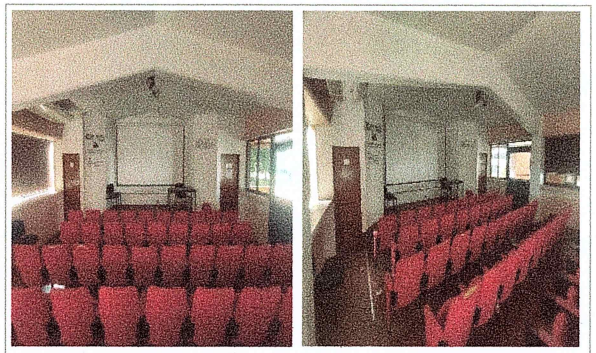

Se equipará el Auditorio con 1 videoproyector.

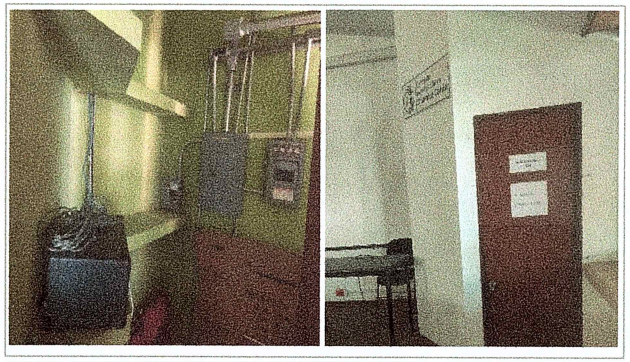

Se equipará el Auditorio con 1 piezas de Amplificador de audio.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD 2

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Remanentes Centro de Investigación en Dinámica Celular CIDC)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO




CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

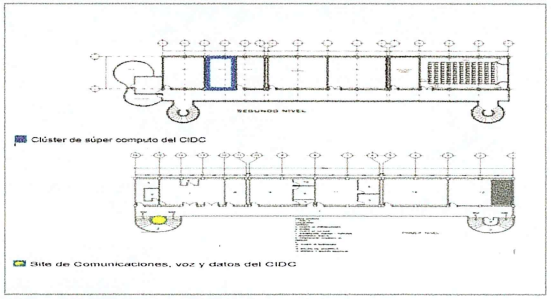


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

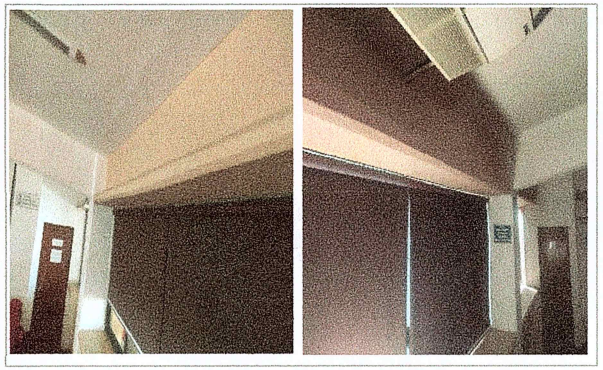


Se equipará el Auditorio con Juego de 2 bocinas.




Se equipará el salón 4 con 1 videoproyector.

FOTOS DESPUÉS

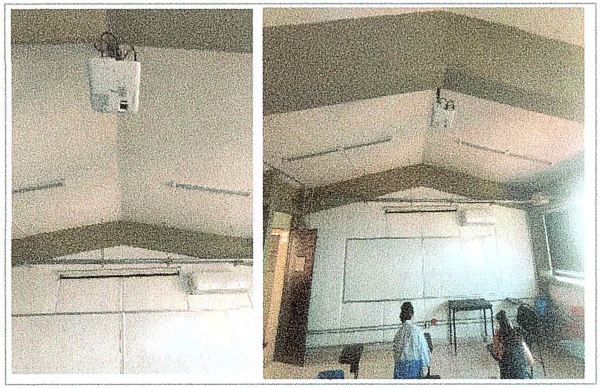

Se equipó el salón 1 con 1 videoproyector.

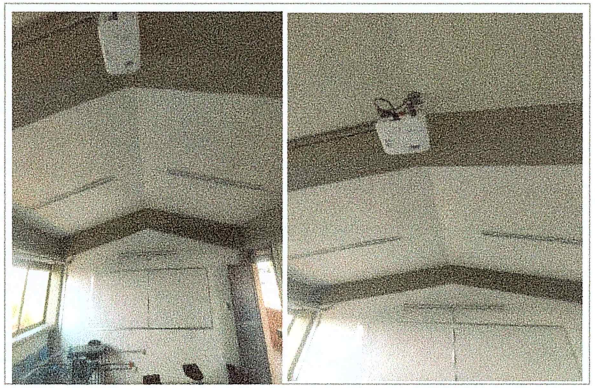

Se equipó el salón 4 con 1 videoproyector.



Se equipó el salón 5 con 1 videoproyector.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2025
EJERCICIO FISCAL	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance


100%

PRIORIDAD **2** Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Remanentes Facultad de Diseño)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

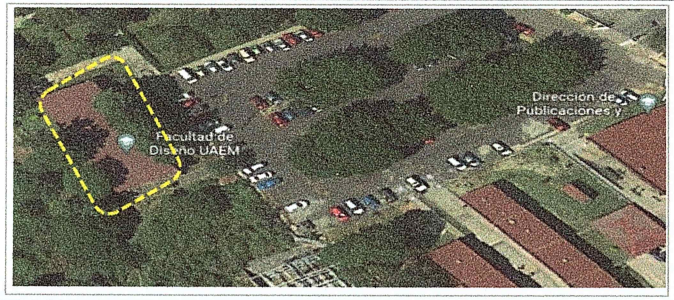

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

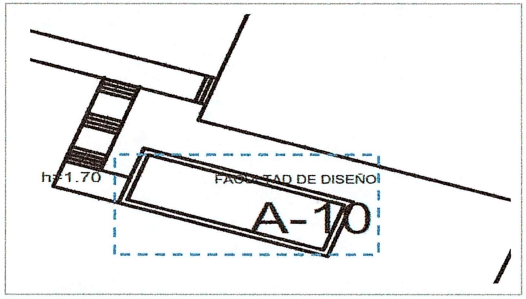


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

FOTOS ANTES

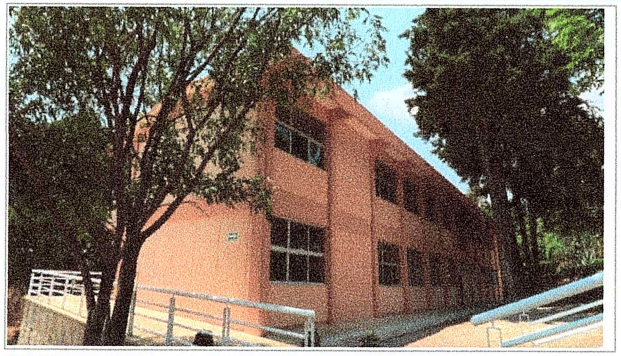

Fachada de la Facultad de Diseño.




F1: Se equipará el Salón 11 Taller de maderas con 1 mini motor tornos y fresadoras.


Observaciones :

El presente reporte fotográfico muestra los espacios que se beneficiaron con el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.

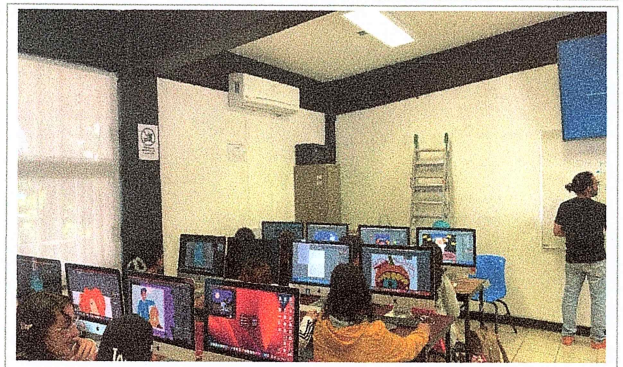

F2: Se equipará el Salón 6 Centro de Computo, con 1 Suministro de equipo de aire acondicionado.



F3: Se equipará la Cabina de radio, con 2 Mesas con estructura metálica.



F3: Se equipará la Cabina de radio, con 3 Sillas de concha.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD **2**

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Remanentes Facultad de Diseño)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

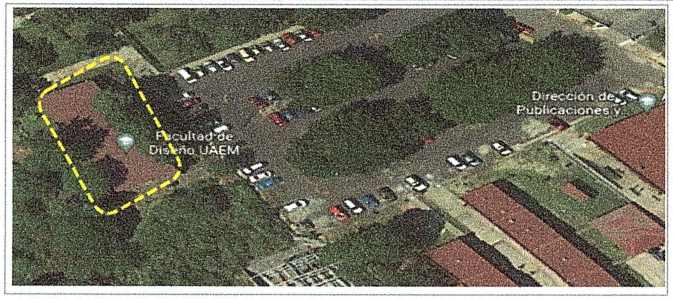


CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

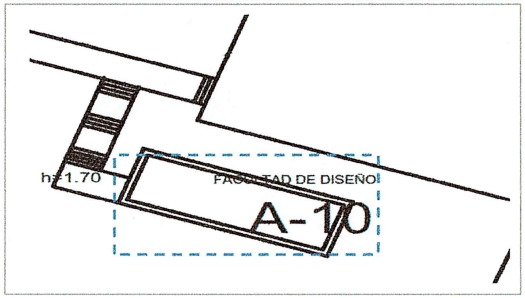

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.




F3: Se equipará el 1 Cabina de radio, con 3 Sillas ejecutiva.


FOTOS DESPUÉS

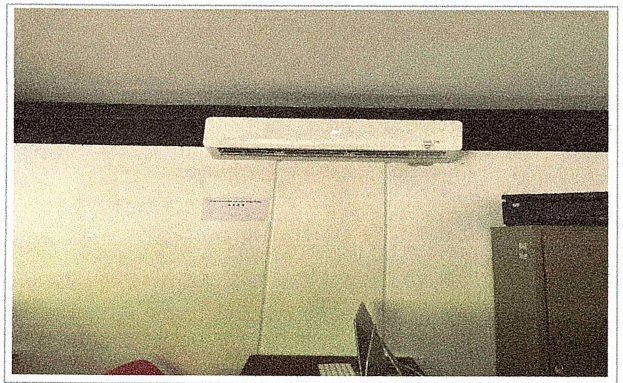

F2: Se equipó el Centro de Cómputo (Salón 6), con 1 equipo de aire acondicionado.

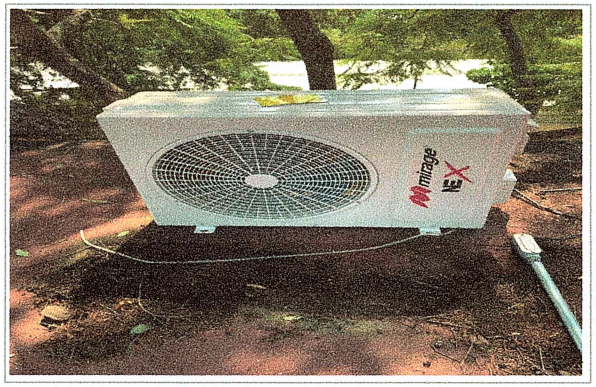

F2: Se equipó el Centro de Cómputo (Salón 6), con 1 equipo de aire acondicionado.

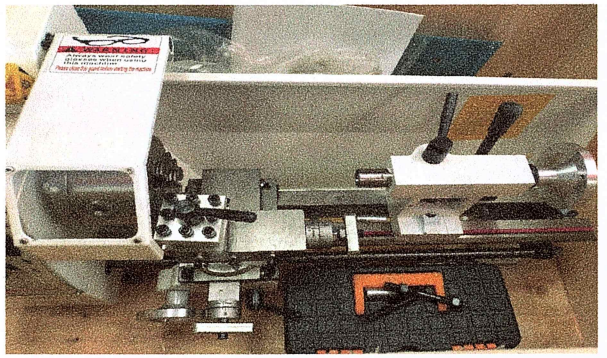

F1: Se equipó el Salón 11 Taller de maderas con 1 mini motor tornos y fresadoras.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2025
EJERCICIO FISCAL	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance


100%

PRIORIDAD **2** Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Remanentes Facultad de Diseño)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO




CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

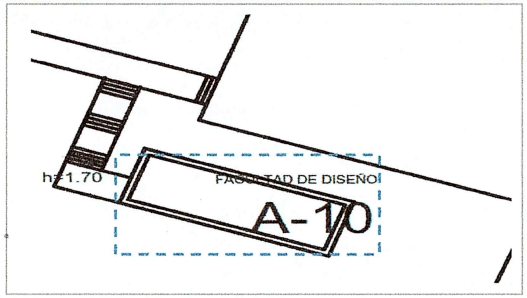


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

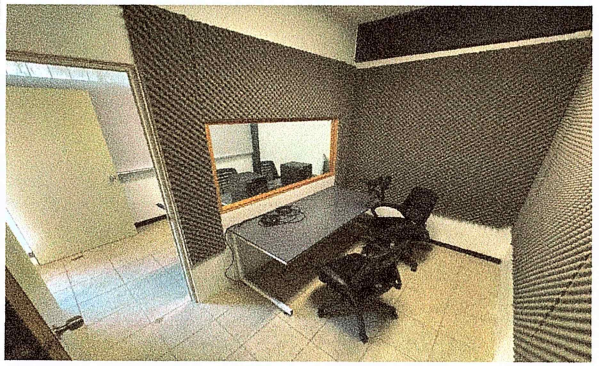

F3: Se equipó la Cabina de radio, con 2 mesas con estructura metálica y 3 sillas concha.

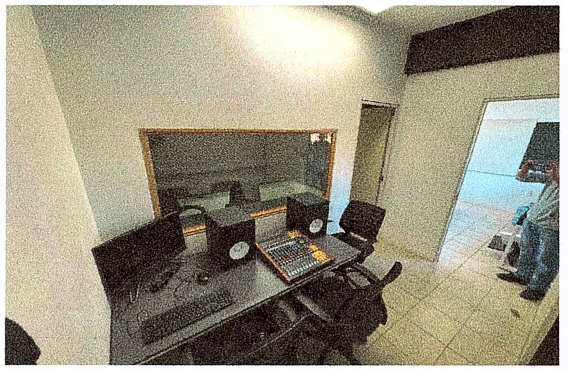

F3: Se equipó la Cabina de radio, con 2 mesas con estructura metálica y 3 sillas concha.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydee León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2025
EJERCICIO FISCAL	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD **2**

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Remanentes Facultad de Artes)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

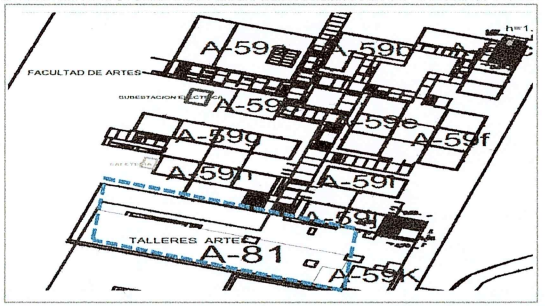

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

FOTOS ANTES



Fachada Facultad de Artes.




Se equipará el Aula 5, con 12 mesas binarias y 24 sillas apilables.


Observaciones :

El presente reporte fotográfico muestra los espacios que se beneficiaron con el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



Se equipará el Aula 8, con 12 mesas binarias y 24 sillas apilables.

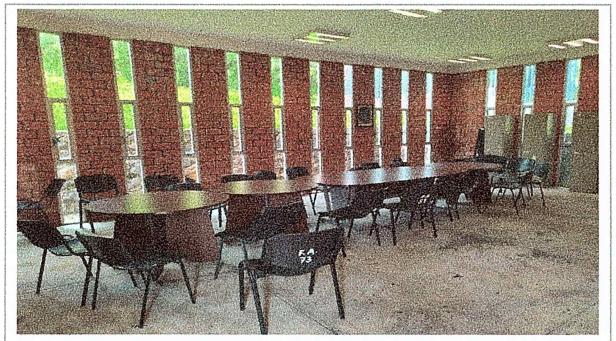

Se equipará la Sala de usos múltiples, con 12 sillas apilables.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2025
EJERCICIO FISCAL	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance


100%

PRIORIDAD **2** Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Remanentes Facultad de Artes)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

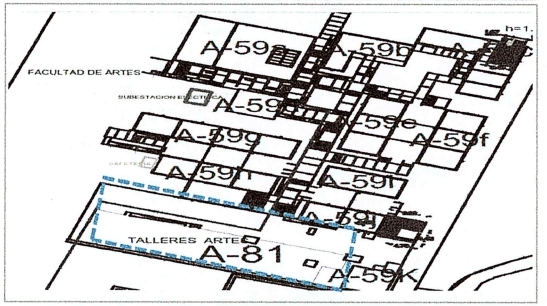

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

FOTOS DESPUÉS



Se equipó el Aula 5, con 12 mesas binarias y 24 sillas apilables.



Se equipó el Aula 8, con 12 mesas binarias y 24 sillas apilables.



Se equipó la Sala de usos múltiples, con 12 sillas apilables.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2025
EJERCICIO FISCAL	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD **2**

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Remanentes Facultad de Estudios Superiores Cuautla)**

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

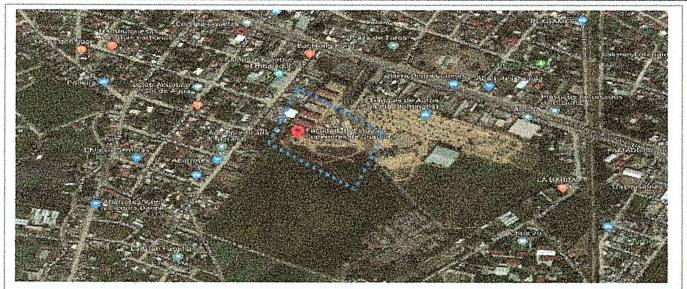

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

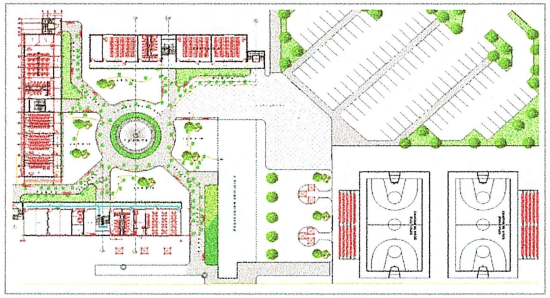

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Carretera México – Oaxaca No. 218 Colonia Plan de Ayala, Cuautla Morelos, C.P. 62743

FOTOS ANTES



Fachada de la Facultad de Estudios Superiores Cuautla



Se equipará el Aula del taller de Pintura, con 14 pupitres y 3 mesas binarias.

Observaciones :

El presente reporte fotográfico muestra los espacios que se beneficiaron con el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



Se equipará la Biblioteca, con 3 mesas de maestro y 18 sillas.



Se equipará el auditorio con 23 sillas.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2025
EJERCICIO FISCAL	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance


100%

PRIORIDAD **2** Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Remanentes Facultad de Estudios Superiores Cuautla)**

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

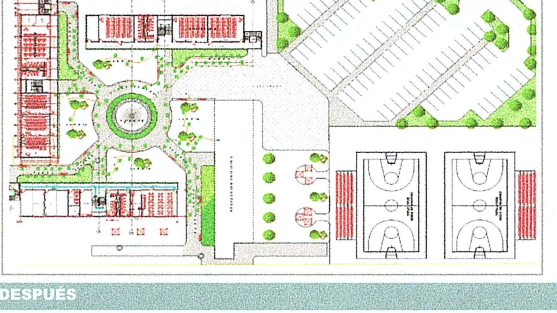

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Carretera México – Oaxaca No. 218 Colonia Plan de Ayala, Cuautla Morelos, C.P. 62743


FOTOS DESPUÉS



Se equipó el Aula del taller de Pintura, con 14 pupitres y 3 mesas binarias.



Se equipó el Aula del taller de Pintura, con 14 pupitres y 3 mesas binarias.



Se equipó la Biblioteca, con 3 mesas de maestro y 18 sillas.



Se equipó el auditorio con 23 sillas.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD **2**

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Remanentes Centro de Investigaciones Químicas CIQ)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

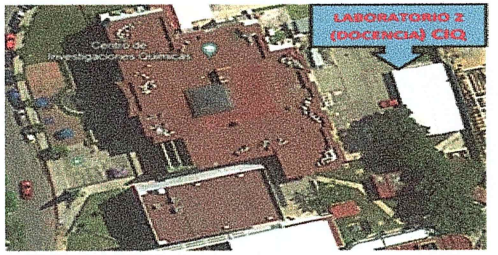

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

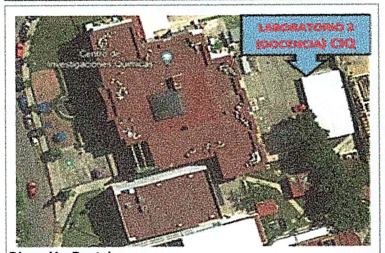


Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

FOTOS ANTES



Fachada del CIQ.

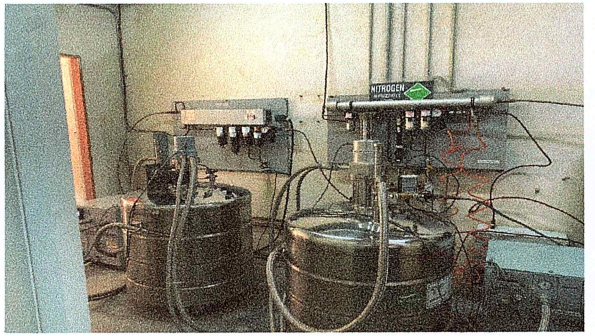

Se equipará la planta de Nitrógeno del área de Resonancia Magnética Nuclear, con Suministro y servicio de instalación de 1 membrana.


Observaciones :

El presente reporte fotográfico muestra los espacios que se beneficiaron con el fondo.


VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



Se equipará el Salón 1, 2 pizarrones blanco.

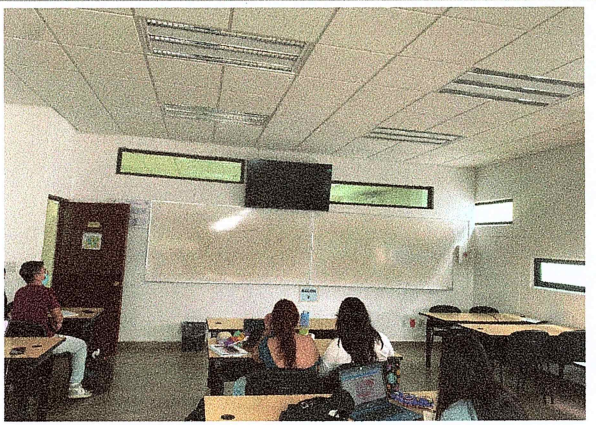

Se equipará el Salón 2, 2 pizarrones blanco.

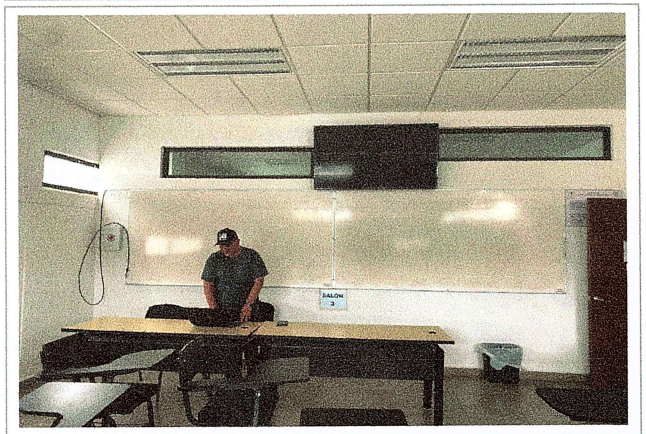

Se equipará el Salón 3, 2 pizarrones blanco.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD **2**

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Remanentes Centro de Investigaciones Químicas CIQ)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO




CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

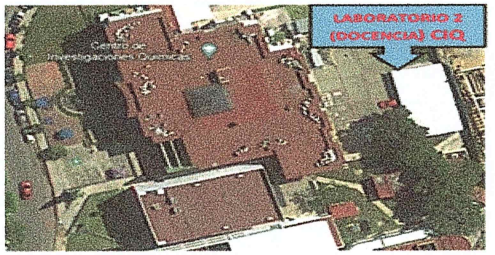

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

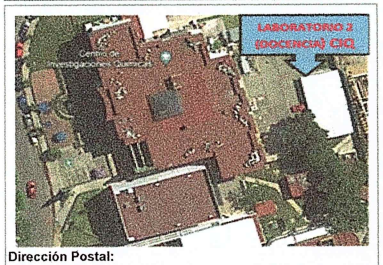

Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

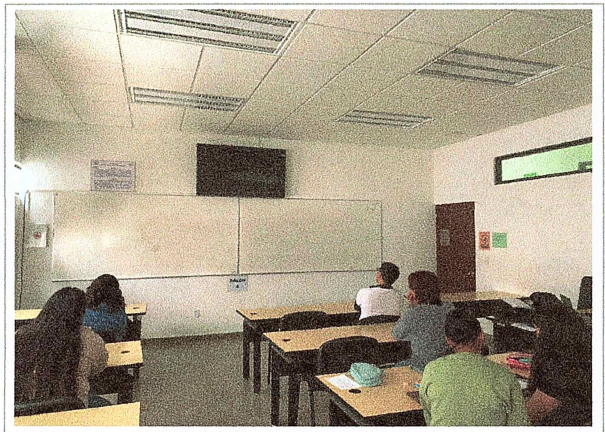


Se equipará el Salón 4, 2 pizarrones blanco.




Se equipará el Salón 8, 1 pizarrón blanco.


FOTOS DESPUÉS

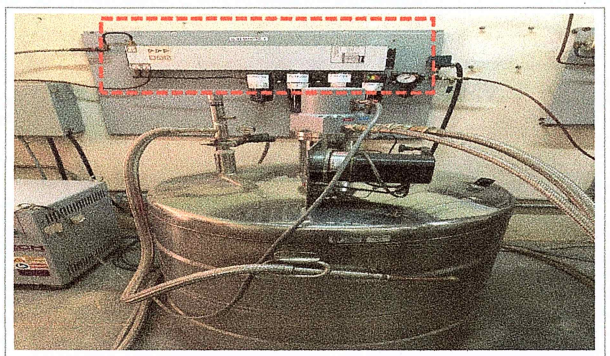

Se equipó la planta de Nitrógeno del área de Resonancia Magnética Nuclear, con Suministro y servicio de instalación de 1 membrana.

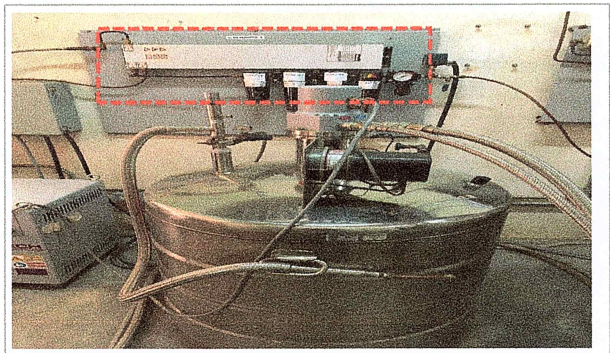

Se equipó la planta de Nitrógeno del área de Resonancia Magnética Nuclear, con Suministro y servicio de instalación de 1 membrana.



Se equipó el Salón 1, 2 pizarrones blanco.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2025
EJERCICIO FISCAL	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

100%

PRIORIDAD **2**

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Remanentes Centro de Investigaciones Químicas CIQ)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO




CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

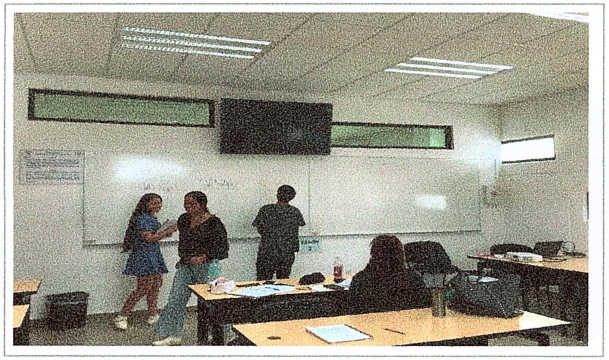


Se equipó el Salón 2, 2 pizarrones blanco.



Se equipó el Salón 3, 2 pizarrones blanco.

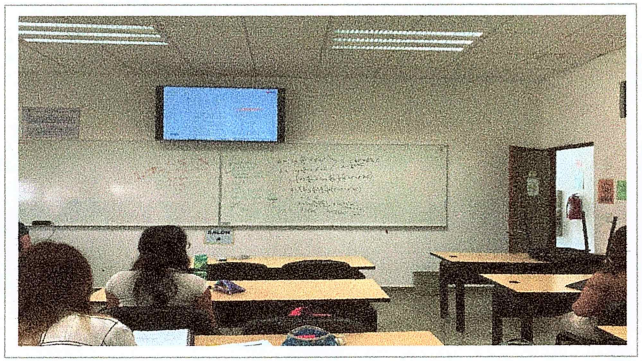

Se equipó el Salón 4, 2 pizarrones blanco.



Se equipó el Salón 8, 1 pizarrón blanco.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD **2**

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Remanentes Centro de Investigación en Dinámica Celular CIDC)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

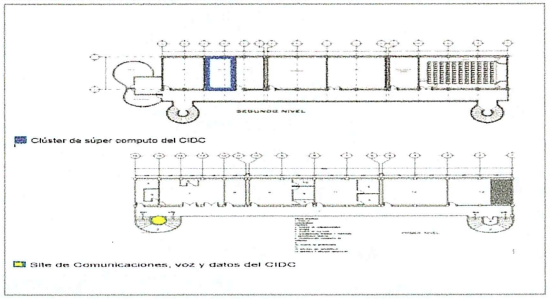

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

FOTOS ANTES



Fachada del CIDC.



Se equipará el salón 1 con 1 videoproyector.


Observaciones :

El presente reporte fotográfico muestra los espacios que se beneficiaron con el fondo.


VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



Se equipará el salón 5 con 1 videoproyector.



Se equipará el Auditorio con 1 videoproyector.

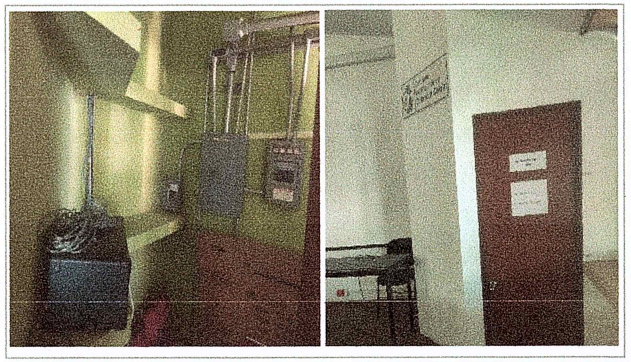

Se equipará el Auditorio con 1 piezas de Amplificador de audio.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD **2**

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Remanentes Centro de Investigación en Dinámica Celular CIDC)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

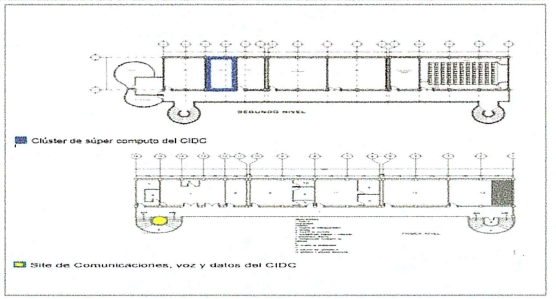

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

FOTOS ANTES



Fachada del CIDC.



Se equipará el salón 1 con 1 videoproyector.


Observaciones :

El presente reporte fotográfico muestra los espacios que se beneficiaron con el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRIPTIVO.



Se equipará el salón 5 con 1 videoproyector.

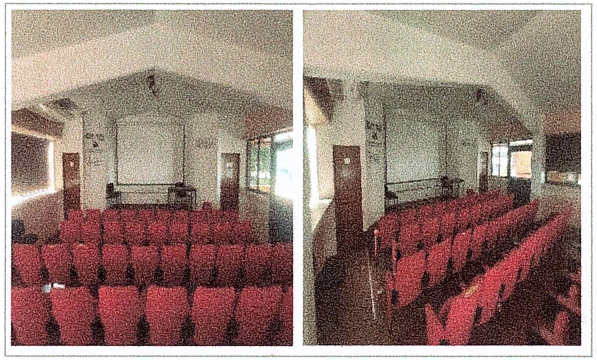

Se equipará el Auditorio con 1 videoproyector.



Se equipará el Auditorio con 1 piezas de Amplificador de audio.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2025
EJERCICIO FISCAL	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD: 2

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Remanentes Centro de Investigación en Dinámica Celular CIDC)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO




CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

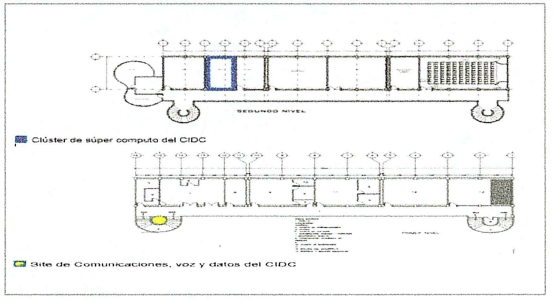


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

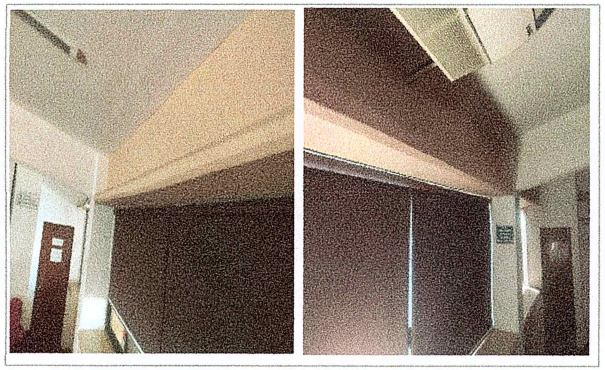


Se equipará el Auditorio con Juego de 2 bocinas.

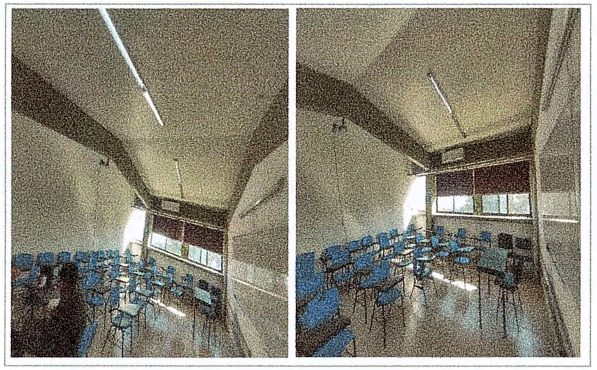

Se equipará el salón 4 con 1 videoproyector.

FOTOS DESPUÉS

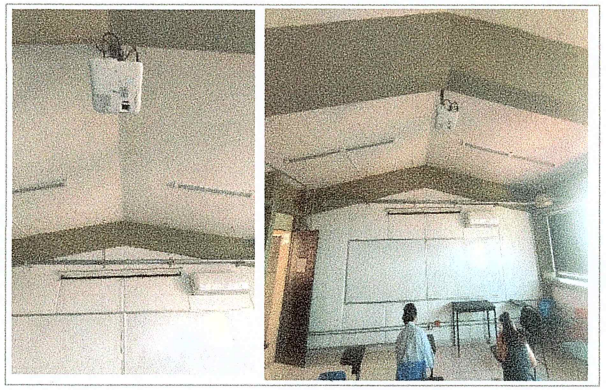

Se equipó el salón 1 con 1 videoproyector.



Se equipó el salón 4 con 1 videoproyector.



Se equipó el salón 5 con 1 videoproyector.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2025
EJERCICIO FISCAL	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD **2**

Nombre de la obra: **Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (Remanentes Centro de Investigación en Dinámica Celular CIDC)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

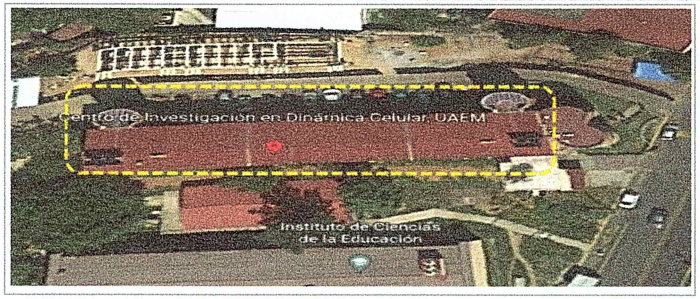


CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

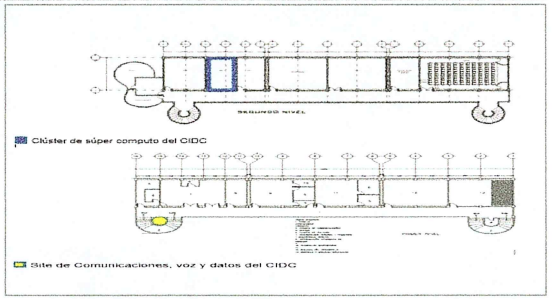


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

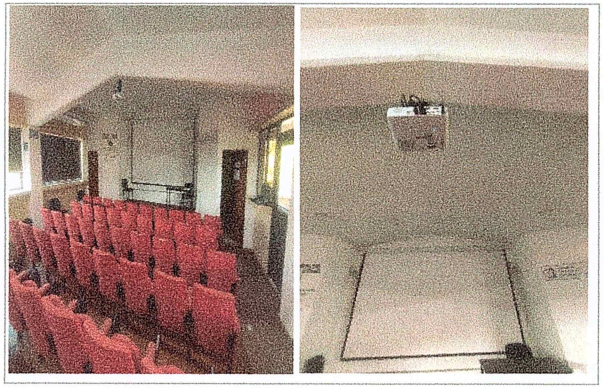

Se equipó el Auditorio con 1 videoproyector.

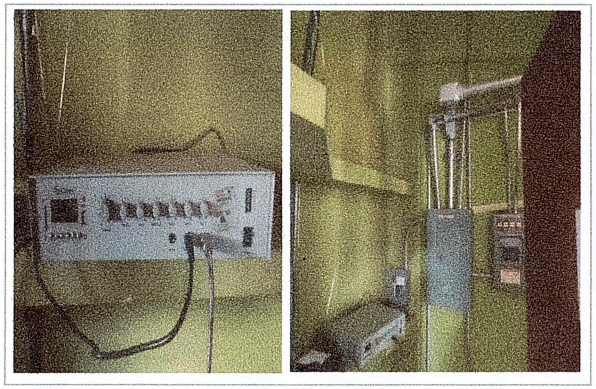

Se equipó el Auditorio con 1 piezas de Amplificador de audio.



Se equipó el Auditorio con Juego de 2 bocinas.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2025
EJERCICIO FISCAL	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración. 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

100%

PRIORIDAD 3 Nombre de la obra: **Mejoras de espacios académicos en materia de inclusión y protección civil para el Campus Norte. (Facultad de Arquitectura y Escuela de Turismo)**

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO


Circuito Universidad
Facultad de Arquitectura
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería
Facultad de Ciencias Biológicas
Facultad de Ciencias Agropecuarias
Facultad de Ciencias de la Educación
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Facultad de Ciencias Químicas
Facultad de Ciencias Farmacéuticas
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería
Facultad de Ciencias Biológicas
Facultad de Ciencias Agropecuarias
Facultad de Ciencias de la Educación
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Facultad de Ciencias Químicas
Facultad de Ciencias Farmacéuticas
Instituto de Ciencias de la Educación
Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas
Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas
Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD **3**

Nombre de la obra: **Mejoras de espacios académicos en materia de inclusión y protección civil para el Campus Norte. (Facultad de Arquitectura y Escuela de Turismo)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

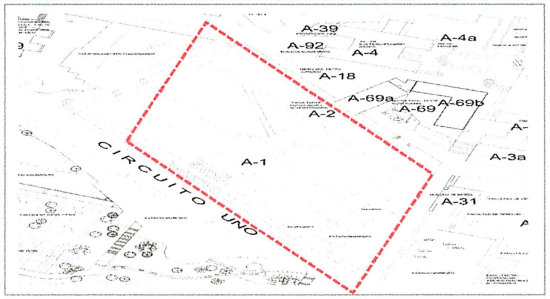

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

DURANTE



F1: Trabajos, Despalme de Terreno, en la Facultad de Arquitectura.



F1: Trabajos, Excavacion del Terreno y Cepas por medios manuales, en la Facultad de Arquitectura.



F1: Trabajos, Hechura de Plantilla de Concreto Hecho en Obra, en la Facultad de Arquitectura.



F1: Trabajos, Hechura de Plantilla de Concreto Hecho en Obra, en la Facultad de Arquitectura.



F1:Trabajos, Elaboracion de Muro a base se Piedra Braza /Cimentacion, en la Facultad de Arquitectura.



F1:Trabajos, Elaboracion de Muro a base se Piedra Braza /Cimentacion, en la Facultad de Arquitectura.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD 3

Nombre de la obra: **Mejoras de espacios académicos en materia de inclusión y protección civil para el Campus Norte. (Facultad de Arquitectura y Escuela de Turismo)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

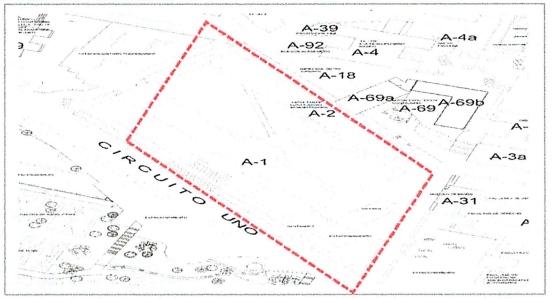

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.



F1:Trabajos, Suministro y Colocación de castillo ahogado en mamposteria, en la Facultad de Arquitectura.



F1: Trabajos, Suministro y Colocación de castillo ahogado en mamposteria, en la Facultad de Arquitectura.



F1: Trabajos, Suministro y Colocación de castillo ahogado en mamposteria, en la Facultad de Arquitectura.



F1: Trabajos, Habilitacion de acero para zapata aislada, dalas y columnas , asi como la hechura de concreto para zapata aislada y dalas D1 y D2, en la Facultad de Arquitectura.



F1:Trabajos, Suministro, colocación y compactación de Relleno de material inerte, en la Facultad de Arquitectura.



F1:Trabajos, Suministro, colocación y compactación de Relleno de material inerte, en la Facultad de Arquitectura.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD 3

Nombre de la obra: **Mejoras de espacios académicos en materia de inclusión y protección civil para el Campus Norte. (Facultad de Arquitectura y Escuela de Turismo)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

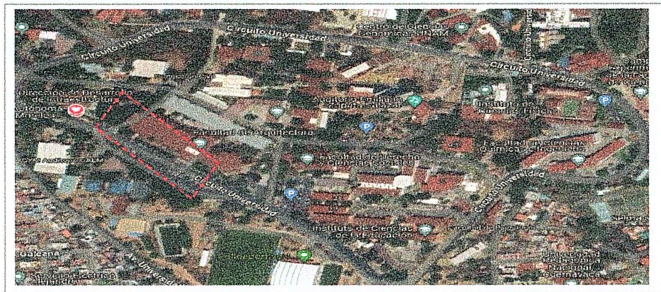

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

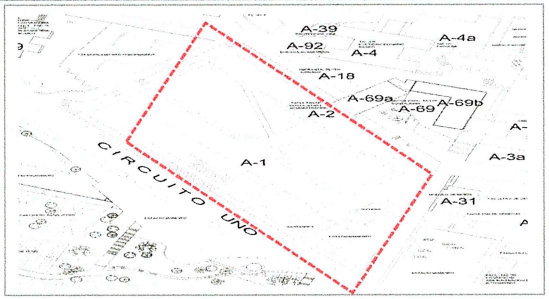

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.



F1: Trabajos, Suministro y colocación de concreto, reforzado con malla electrosoldada, en la Facultad de Arquitectura.




F1: Trabajos, Suministro y colocación de concreto, reforzado con malla electrosoldada, en la Facultad de Arquitectura.

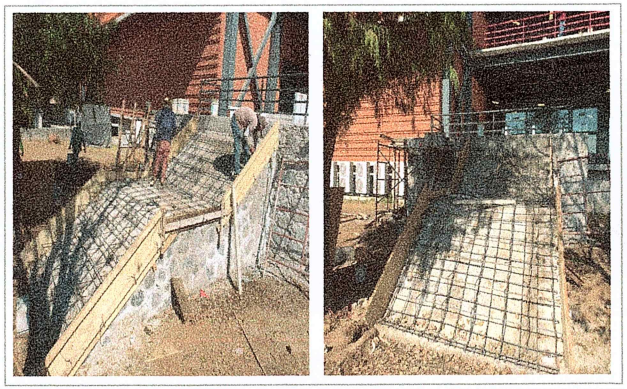


F1: Trabajos, Habilitacion de acero para refuerzo de firme y forjado para escalones, en la Facultad de Arquitectura.



F1: Trabajos, Cimbrado y elaboración de concreto hecho en obra para firme y escalones de escalera, en la Facultad de Arquitectura.

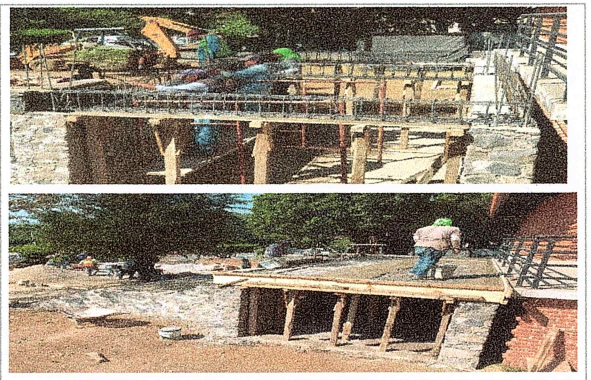

F1: Trabajos, Suministro y colocacion de Vigueta y Bovedilla, Asi como el Suministro y colocacion de concreto reforzado con malla para Losa (paso), en la Facultad de Arquitectura.

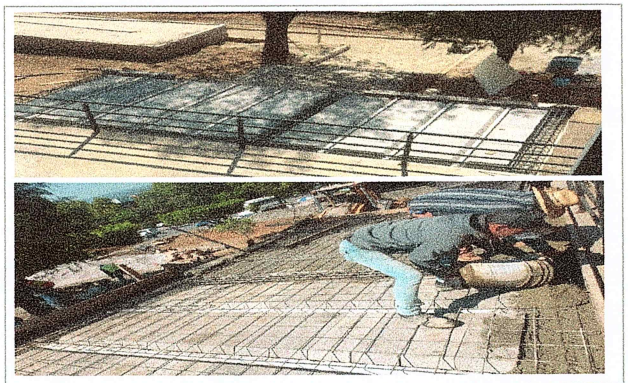

F1: Trabajos, Suministro y colocacion de Vigueta y Bovedilla, Asi como el Suministro y colocacion de concreto reforzado con malla para Losa (paso), en la Facultad de Arquitectura.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD 3

Nombre de la obra: **Mejoras de espacios académicos en materia de inclusión y protección civil para el Campus Norte. (Facultad de Arquitectura y Escuela de Turismo)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

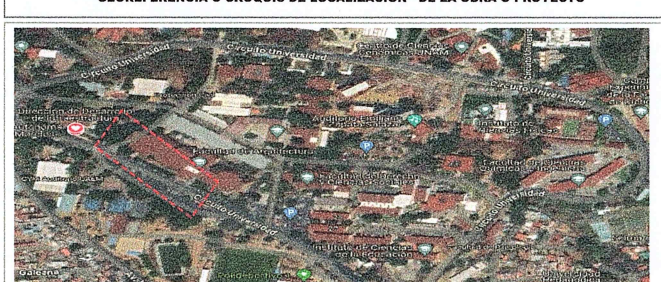

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

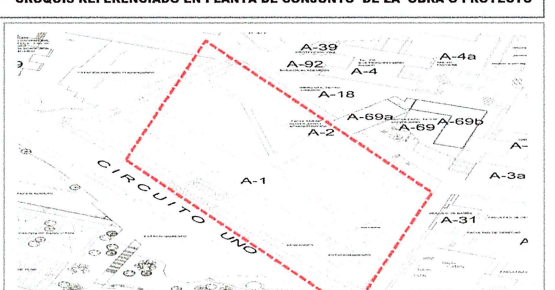

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.



F1: Trabajos, Suministro, Fabricación y colocación de Barandal de Herreria / Rampa y Escalera, en la Facultad de Arquitectura.



F1: Trabajos, Suministro, Fabricación y colocación de Barandal de Herreria / Rampa y Escalera, en la Facultad de Arquitectura.



F1: Trabajos, Reubicacion y Adecuacion de barandal de tubo de fierro, en la Facultad de Arquitectura.



F1: Trabajos, Limpieza Fina de la obra para entrega, en la Facultad de Arquitectura.



F1: Trabajos, Limpieza Fina de la obra para entrega, en la Facultad de Arquitectura.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD 3

Nombre de la obra: **Mejoras de espacios académicos en materia de inclusión y protección civil para el Campus Norte. (Facultad de Arquitectura y Escuela de Turismo)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

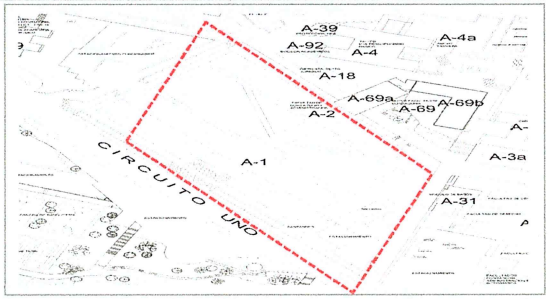


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

FOTOS DESPUÉS

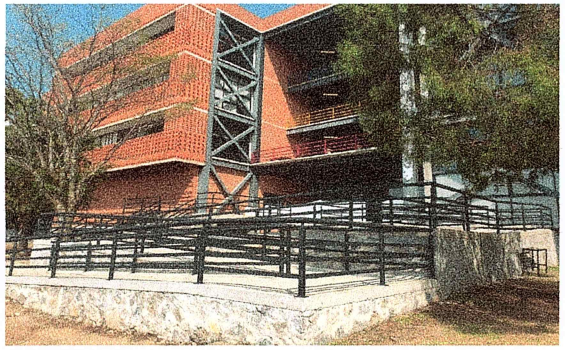

F1: Vista 1, de Rampa para accesiblidad, en la Facultad de Arquitectura.

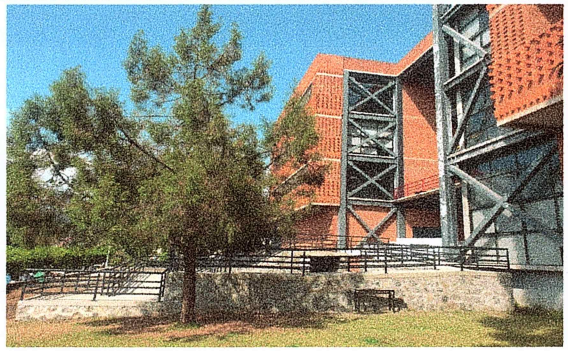

F1: Vista 2, de Rampa para accesiblidad, en la Facultad de Arquitectura.



F1: Vista 3, de Rampa para accesiblidad, en la Facultad de Arquitectura.



F1: Vista 4, de Rampa para accesiblidad, en la Facultad de Arquitectura.



F1: Vista 5, de Rampa para accesiblidad, en la Facultad de Arquitectura.



F1: Vista 6, de Rampa para accesiblidad, en la Facultad de Arquitectura.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

100%

PRIORIDAD 3

Nombre de la obra: **Mejoras de espacios académicos en materia de inclusión y protección civil para el Campus Norte. (Facultad de Arquitectura y Escuela de Turismo)**

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO


Circuito Universidad
Escuela Universidad
Facultad de Arquitectura
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería
Facultad de Ciencias Agropecuarias
Facultad de Ciencias Biológicas
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería
Facultad de Ciencias Básicas
Facultad de Ciencias Básicas
Facultad de Ciencias Básicas

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD 3

Nombre de la obra: **Mejoras de espacios académicos en materia de inclusión y protección civil para el Campus Norte. (Facultad de Arquitectura y Escuela de Turismo)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

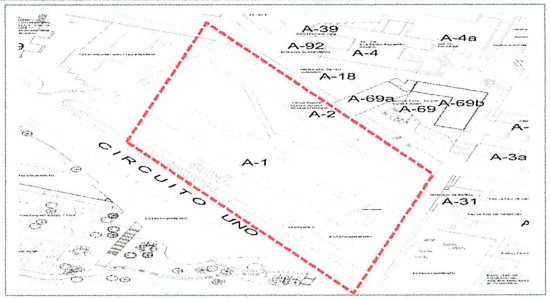

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

DURANTE



F1: Trabajos, Despalme de Terreno, en la Facultad de Arquitectura.



F1: Trabajos, Excavacion del Terreno y Cepas por medios manuales, en la Facultad de Arquitectura.




F1: Trabajos, Hechura de Plantilla de Concreto Hecho en Obra, en la Facultad de Arquitectura.



F1: Trabajos, Hechura de Plantilla de Concreto Hecho en Obra, en la Facultad de Arquitectura.



F1:Trabajos, Elaboracion de Muro a base se Piedra Braza /Cimentacion, en la Facultad de Arquitectura.

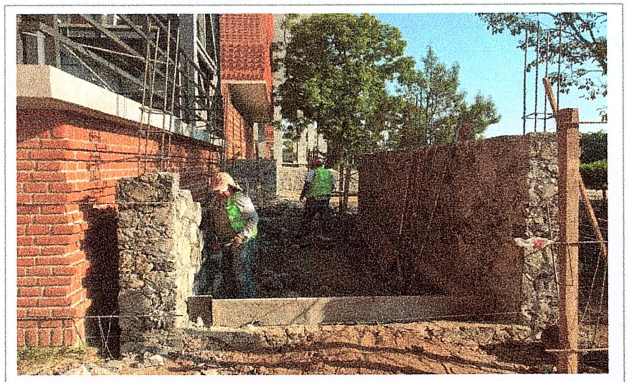

F1:Trabajos, Elaboracion de Muro a base se Piedra Braza /Cimentacion, en la Facultad de Arquitectura.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

100%

PRIORIDAD 3

Nombre de la obra: **Mejoras de espacios académicos en materia de inclusión y protección civil para el Campus Norte. (Facultad de Arquitectura y Escuela de Turismo)**

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO


Circuito Universidad
Facultad de Arquitectura
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería
Facultad de Ciencias Agropecuarias
Facultad de Ciencias Biológicas
Facultad de Ciencias Básicas
Facultad de Humanidades
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
Facultad de Psicología
Facultad de Ciencias de la Educación
Facultad de Medicina
Facultad de Enfermería
Facultad de Farmacia
Facultad de Ciencias de la Salud
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería
Facultad de Ciencias Agropecuarias
Facultad de Ciencias Básicas
Facultad de Humanidades
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
Facultad de Psicología
Facultad de Ciencias de la Educación
Facultad de Medicina
Facultad de Enfermería
Facultad de Farmacia
Facultad de Ciencias de la Salud
Instituto de Ciencias de la Educación
Universidad Virtual del Estado de Morelos
Universidad Tecnológica del Estado de Morelos
Universidad Politécnica del Estado de Morelos
Universidad Intercultural del Estado de Morelos
Universidad Nacional Rosario Castellanos
Universidad Nacional Rosario Castellanos
Universidad Nacional Rosario Castellan

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD: 3

Nombre de la obra: **Mejoras de espacios académicos en materia de inclusión y protección civil para el Campus Norte. (Facultad de Arquitectura y Escuela de Turismo)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

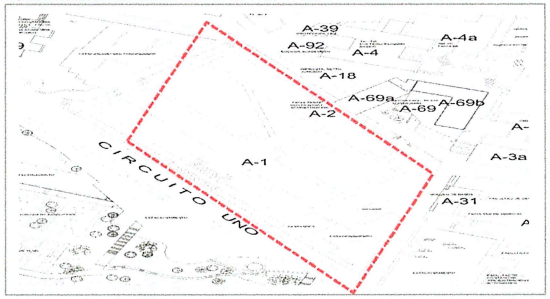

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.



F1: Trabajos, Suministro y colocación de concreto, reforzado con malla electrosoldada, en la Facultad de Arquitectura.




F1: Trabajos, Suministro y colocación de concreto, reforzado con malla electrosoldada, en la Facultad de Arquitectura.

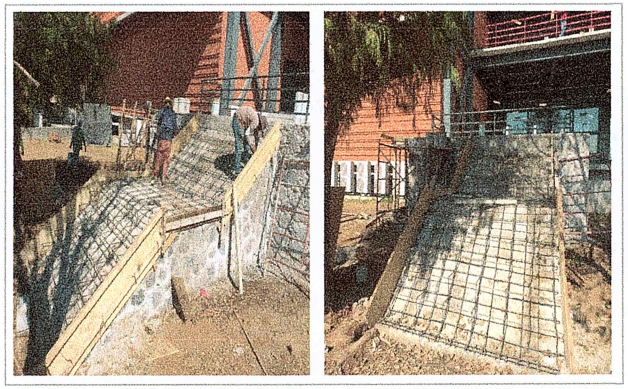


F1: Trabajos, Habilitacion de acero para refuerzo de firme y forjado para escalones, en la Facultad de Arquitectura.



F1: Trabajos, Cimbrado y elaboración de concreto hecho en obra para firme y escalones de escalera, en la Facultad de Arquitectura.

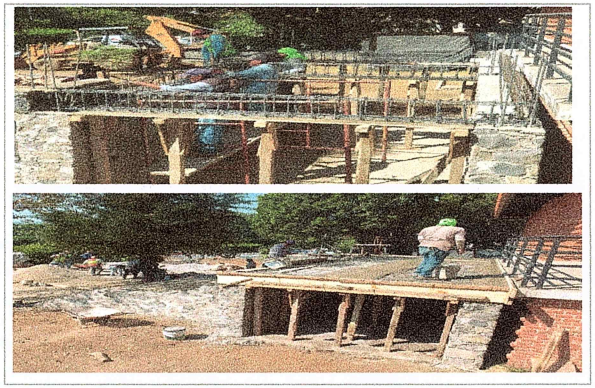

F1: Trabajos, Suministro y colocacion de Vigueta y Bovedilla, Asi como el Suministro y colocacion de concreto reforzado con malla para Losa (paso), en la Facultad de Arquitectura.

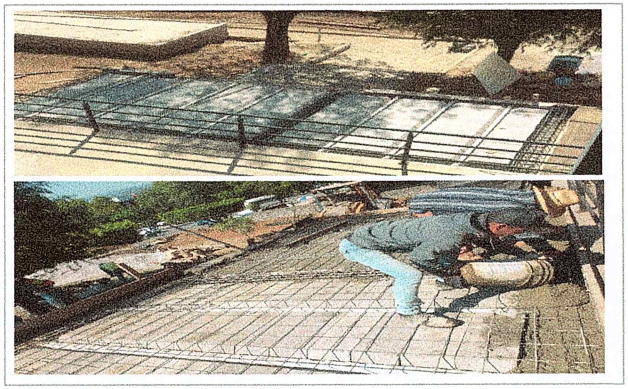

F1: Trabajos, Suministro y colocacion de Vigueta y Bovedilla, Asi como el Suministro y colocacion de concreto reforzado con malla para Losa (paso), en la Facultad de Arquitectura.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD 3

Nombre de la obra: **Mejoras de espacios académicos en materia de inclusión y protección civil para el Campus Norte. (Facultad de Arquitectura y Escuela de Turismo)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

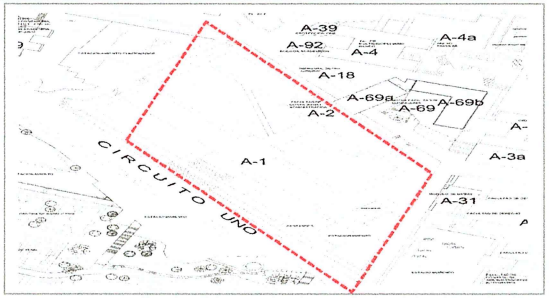

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.




F1: Trabajos, Suministro, Fabricación y colocación de Barandal de Herreria / Rampa y Escalera, en la Facultad de Arquitectura.




F1: Trabajos, Suministro, Fabricación y colocación de Barandal de Herreria / Rampa y Escalera, en la Facultad de Arquitectura.



F1: Trabajos, Reubicacion y Adecuacion de barandal de tubo de fierro, en la Facultad de Arquitectura.

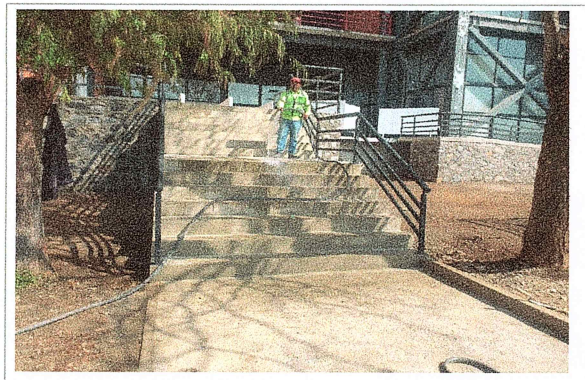

F1: Trabajos, Limpieza Fina de la obra para entrega, en la Facultad de Arquitectura.

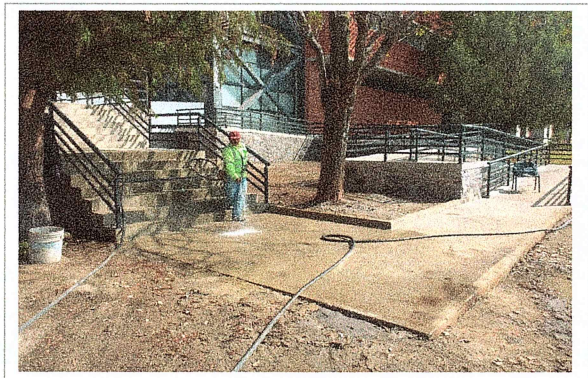

F1: Trabajos, Limpieza Fina de la obra para entrega, en la Facultad de Arquitectura.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance


100%

PRIORIDAD 3 Nombre de la obra: **Mejoras de espacios académicos en materia de inclusión y protección civil para el Campus Norte. (Facultad de Arquitectura y Escuela de Turismo)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

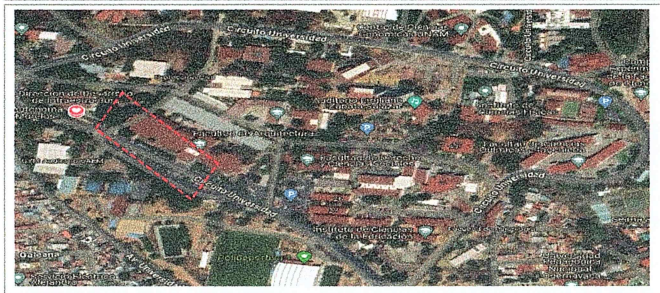

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

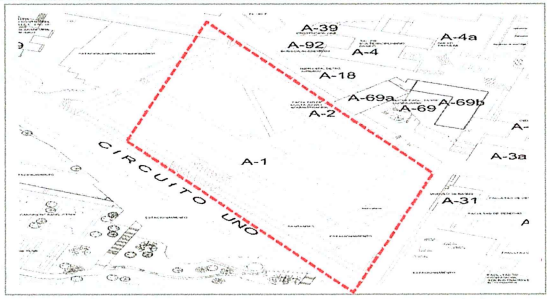


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

FOTOS DESPUÉS

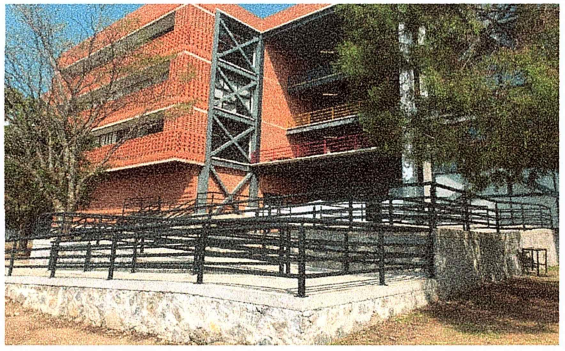

F1: Vista 1, de Rampa para accesiblidad, en la Facultad de Arquitectura.

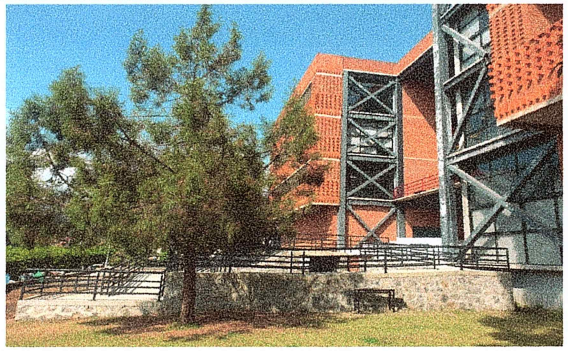

F1: Vista 2, de Rampa para accesiblidad, en la Facultad de Arquitectura.



F1: Vista 3, de Rampa para accesiblidad, en la Facultad de Arquitectura.



F1: Vista 4, de Rampa para accesiblidad, en la Facultad de Arquitectura.



F1: Vista 5, de Rampa para accesiblidad, en la Facultad de Arquitectura.



F1: Vista 6, de Rampa para accesiblidad, en la Facultad de Arquitectura.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2025
EJERCICIO FISCAL	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

PRIORIDAD 3 Nombre de la obra: **Mejoras de espacios académicos en materia de inclusión y protección civil para el Campus Norte. (Instituto de Ciencias de la Educación)**


Porcentaje de avance

100%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

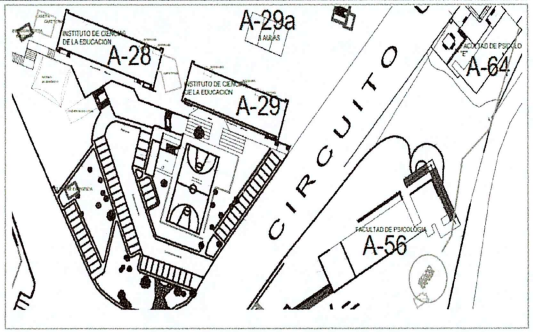

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

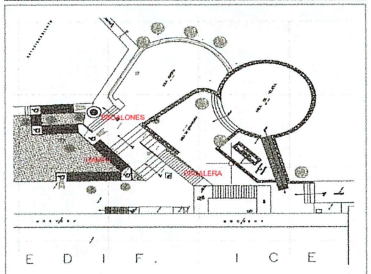


Dirección Postal:
Camino al Limón, ejido El Limón de Cuauchichinola, municipio de Tepalcingo, Morelos

FOTOS ANTES



Reorientación de salida en escalera de emergencia , Adecuación de escalones y descansos y Fabricación de rampa para accesibilidad en el Instituto de Ciencias de la Educación.

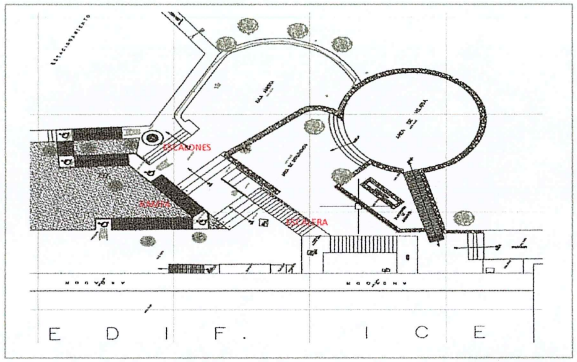


Planta arquitectónica con la ubicación de las áreas exteriores donde se realizarán los trabajos preliminares, de demoliciones y trabajos de obra civil para la Reorientación en la salida de la escalera de emergencia del Instituto de Ciencias de la Educación.

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del primer trimestre 2025, corresponde a los espacios que se intervinieron mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRITPTIVO.

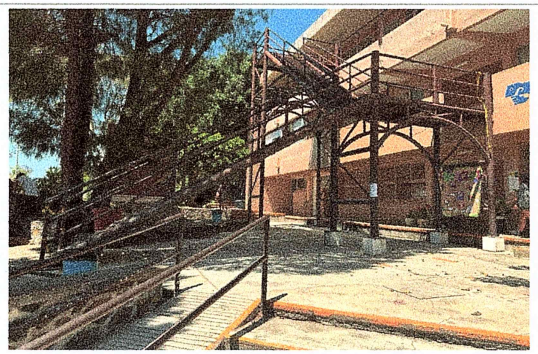

F1: Vista sur del espacio físico en donde se desarrollaran los trabajos preliminares, demoliciones y trabajos de obra civil para la Reorientación en la salida de la escalera de emergencia del Instituto de Ciencias de la Educación.



F1: Fachada principal donde se ubicaran los trabajos preliminares y demoliciones, para los trabajos de Adecuación de escalones y descansos del Instituto de Ciencias de la Educación.



F2: Imagen general donde se ejecutaran trabajos preliminares, de demoliciones, para la Fabricación de rampa para accesibilidad en el Instituto de Ciencias de la Educación.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2025
EJERCICIO FISCAL	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance


100%

PRIORIDAD 3 Nombre de la obra: **Mejoras de espacios académicos en materia de inclusión y protección civil para el Campus Norte. (Instituto de Ciencias de la Educación)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

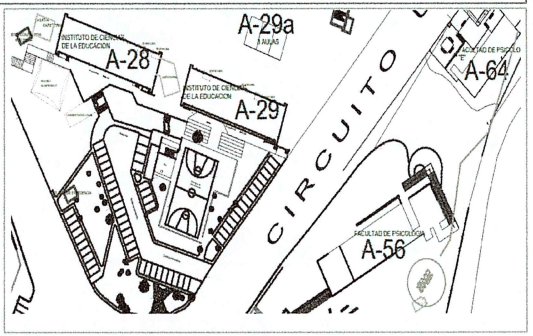


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

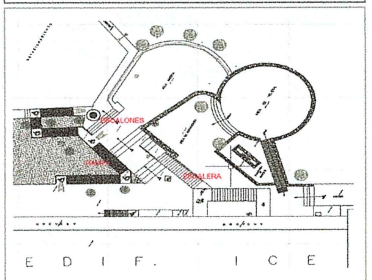


Dirección Postal:
Camino al Limón, ejido El Limón de Cuauchichinola, municipio de Tepalcingo, Morelos

DURANTE

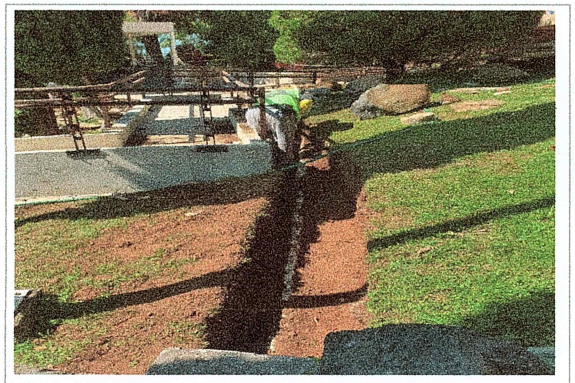

F1: Trabajos, Excavacion por medios Manuales, en el Instituto de Ciencias de la Educación.

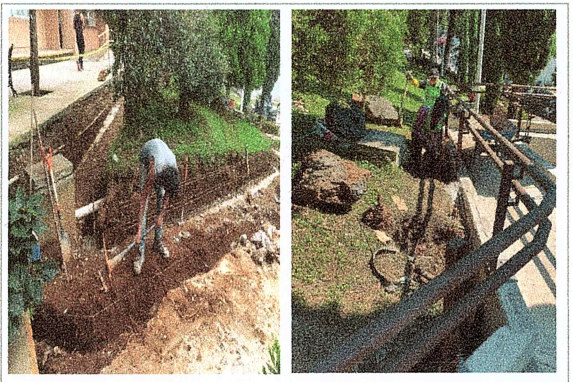

F1: Trabajos, Excavacion por medios Manuales, en el Instituto de Ciencias de la Educación.



F1: Trabajos, Habilitacion de Acero para Dala Perimetral, en el Instituto de Ciencias de la Educación.



F1: Trabajos, Habilitacion de Acero para Dala Perimetral, en el Instituto de Ciencias de la Educación.



F1: Trabajos, Cimbrado, Colado con concreto hecho en obra y Descimbrado para Dala Perimetral, en el Instituto de Ciencias de la Educación.



F1: Trabajos, Cimbrado, Colado con concreto hecho en obra y Descimbrado para Dala Perimetral, en el Instituto de Ciencias de la Educación.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

PRIORIDAD 3

Nombre de la obra: **Mejoras de espacios académicos en materia de inclusión y protección civil para el Campus Norte. (Instituto de Ciencias de la Educación)**


Porcentaje de avance

100%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

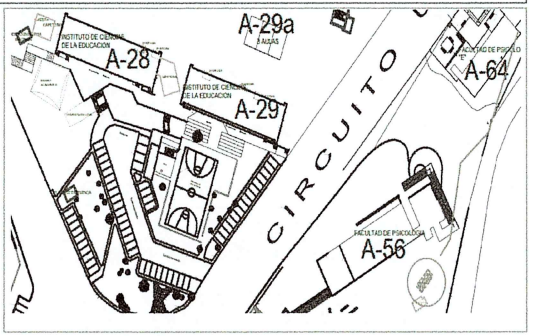

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

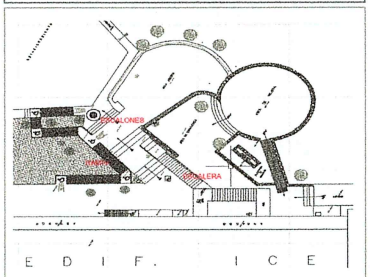


Dirección Postal:
Camino al Limón, ejido El Limón de Cuauchichinola, municipio de Tepalcingo, Morelos



F1: Trabajos, Habilitacion de acero, Cimbrado y Colado con concreto hecho en obra para Dado, en el Instituto de Ciencias de la Educación.



F1: Trabajos, Suministro, colocación y compactación de Material Inerte, del Instituto de Ciencias de la Educación.

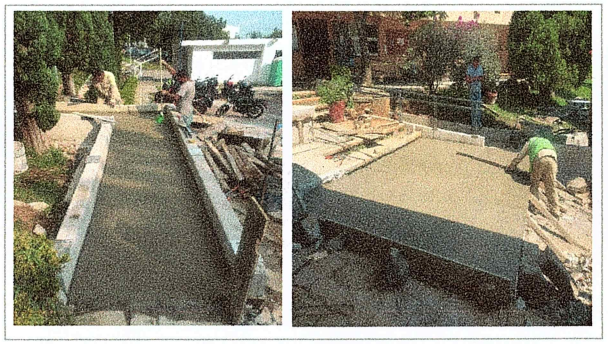


F1: Trabajos, Suministro y colocación de concreto hecho en obra reforzado con malla electrosoldada para firme, del Instituto de Ciencias de la Educación.



F1: Trabajos, Suministro y colocación de concreto hecho en obra reforzado con malla electrosoldada para firme, del Instituto de Ciencias de la Educación.



F1: Trabajos, Elaboración de Muro de piedra de la region, del Instituto de Ciencias de la Educación.

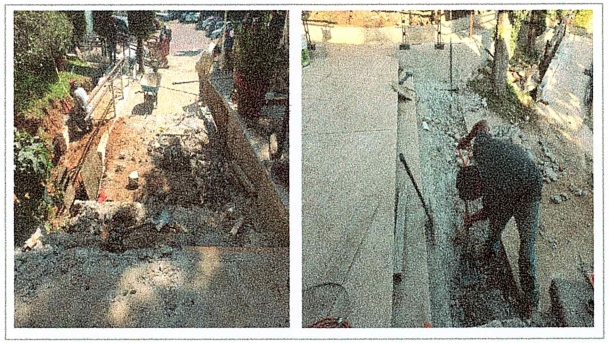

F1: Trabajos, Demolición de firmes de concreto existentes por medios manuales, en el Instituto de Ciencias de la Educación.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance


100%

PRIORIDAD 3 Nombre de la obra: **Mejoras de espacios académicos en materia de inclusión y protección civil para el Campus Norte. (Instituto de Ciencias de la Educación)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO




CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

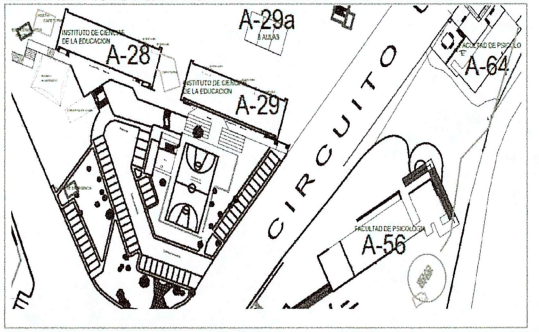


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

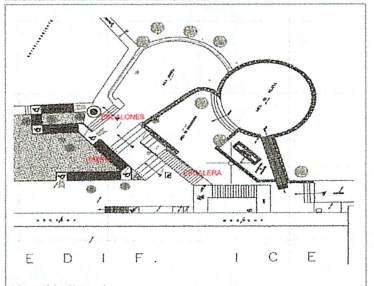


Dirección Postal:
Camino al Limón, ejido El Limón de Cuauchichinola, municipio de Tepalcingo, Morelos

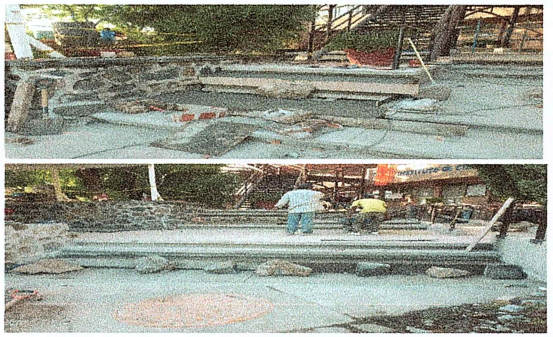


F1: Trabajos, Cimbrado, descimbrado y suministro y colocación de concreto para forjado de escalones con acabado lavado, del Instituto de Ciencias de la Educación.

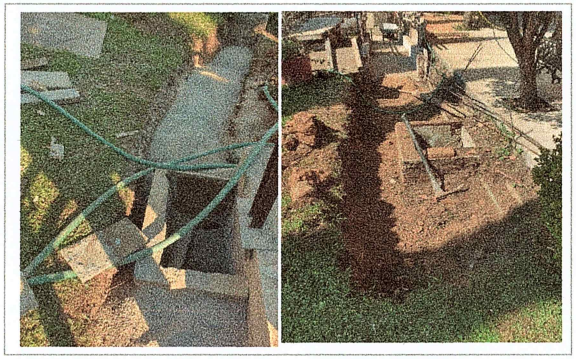

F1: Trabajos, Albañilerias para Renivelación de registros, del Instituto de Ciencias de la Educación.

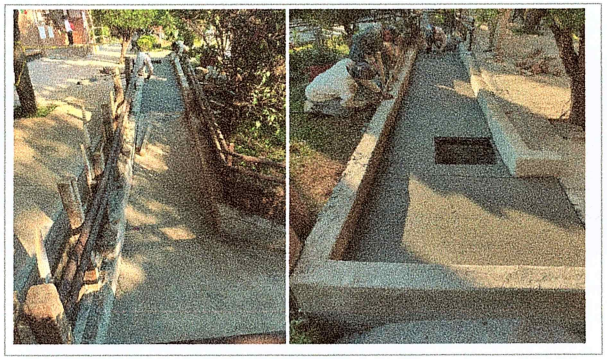


F1: Trabajos, Suministro y colocación de concreto hecho en obra reforzado con malla electrosoldada para firme, del Instituto de Ciencias de la Educación.

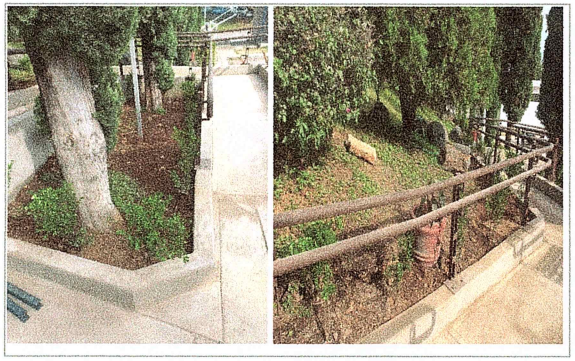

F1: Trabajos, Suministro y colocación de Vegetación, en el Instituto de Ciencias de la Educación.



F1: .Trabajos, Fabricación y colocación de barandal de herreria, en el Instituto de Ciencias de la Educacion.

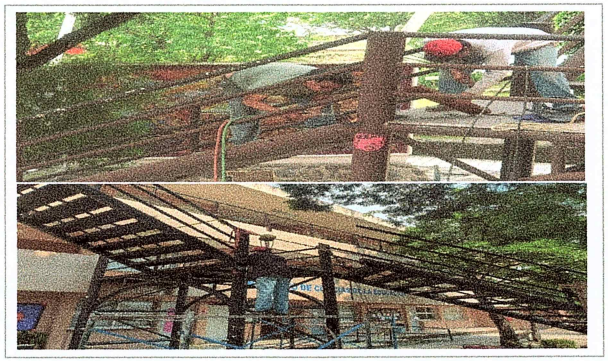

F1: Trabajos, Corte con equipo tubos laterales de la rampa de escaleras de salida de emergencia, en el Instituto de Ciencias de la Educación.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

PRIORIDAD 3

Nombre de la obra: **Mejoras de espacios académicos en materia de inclusión y protección civil para el Campus Norte. (Instituto de Ciencias de la Educación)**


Porcentaje de avance

100%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO




CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

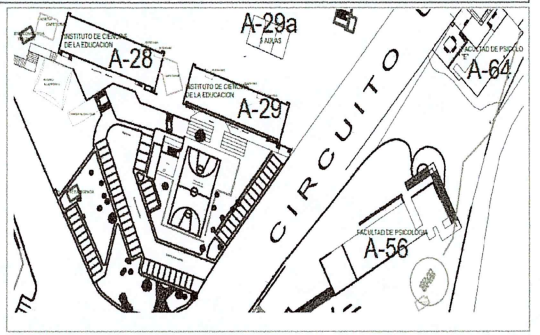


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

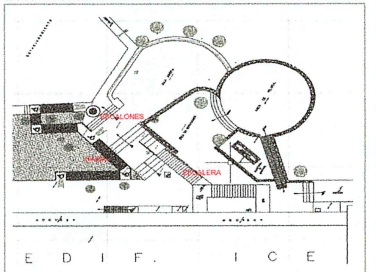


Dirección Postal:
Camino al Limón, ejido El Limón de Cuauchichinola, municipio de Tepalcingo, Morelos

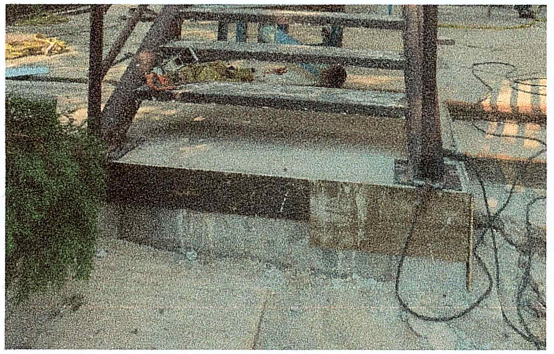

F1: Trabajos, Suministro y colocación de Placa de acero en dados, en el Instituto de Ciencias de la Educación.

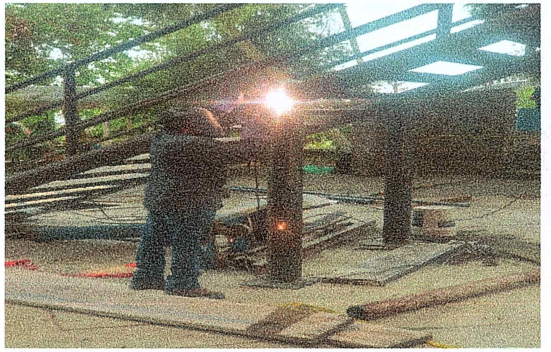


F1: Trabajos, Suministro e instalación de Columnas a base de tubos de acero, así como resanes y el empotre de estas a tubos laterales por medios mecánicos en escalera de emergencia, del Instituto de Ciencias de la Educación

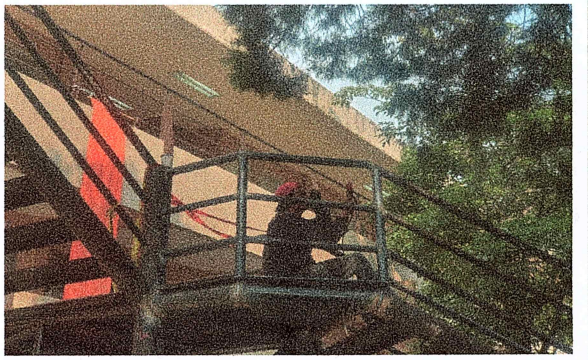

F1: Trabajos, Suministro, instalación y empotres de Nuevos apoyos (Trabes) para la escalera de emergencia, del Instituto de Ciencias de la Educación



F1: Trabajos, Suministro e instalación de placa de lámina anti derraparte (descanso) para ampliación de escalera de emergencia, del Instituto de Ciencias de la Educación

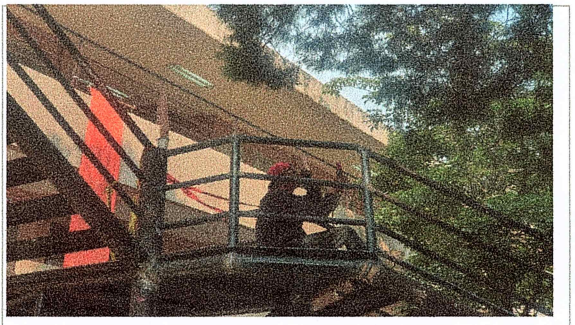

F1: Trabajos, Suministro e instalación de barandal para ampliación de la escalera de emergencia, del Instituto de Ciencias de la Educación



F1: Trabajos, Limpieza Fina de la obra para entrega, en el Instituto de Ciencias de la Educación.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2025
EJERCICIO FISCAL	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


PRIORIDAD: 3

Nombre de la obra: **Mejoras de espacios académicos en materia de inclusión y protección civil para el Campus Norte. (Instituto de Ciencias de la Educación)**


Porcentaje de avance

100%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

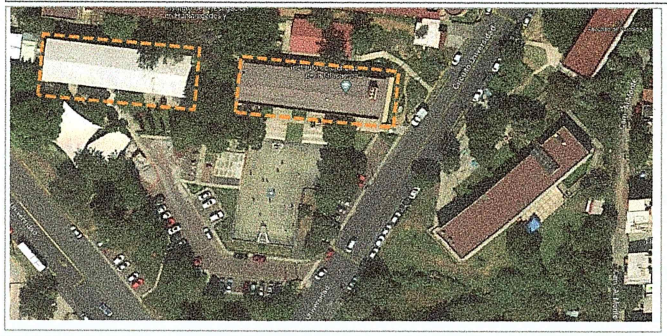

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

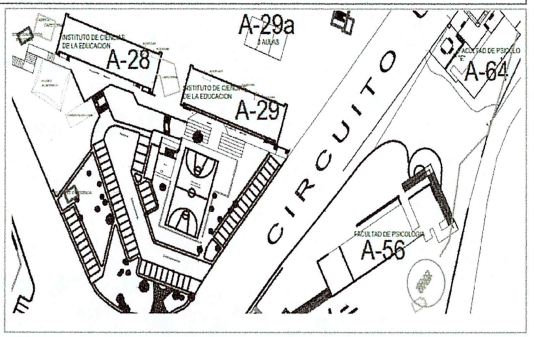


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

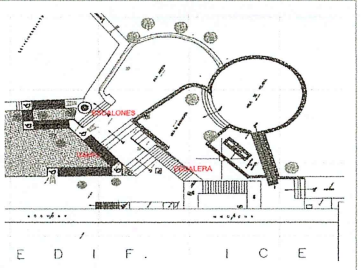


Dirección Postal:
Camino al Limón, ejido El Limón de Cuauchichinola, municipio de Tepalcingo, Morelos


FOTOS DESPUES

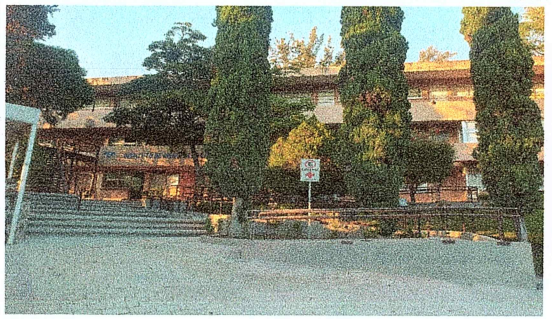


F1: Vista 1 de los trabajos pertenecientes a la obra Adecuacion en plaza de acceso y adecuacion de escalera de emergecnia metalica, en el Instituto de Ciencias de la Educación.

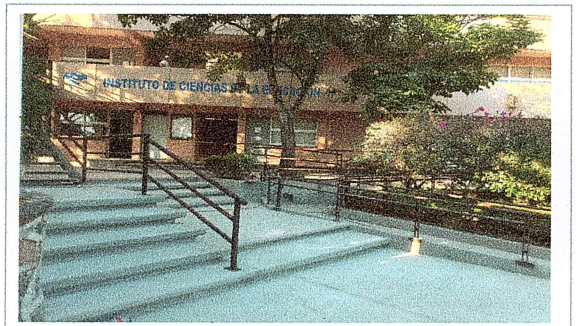

F1: Vista 2 de los trabajos pertenecientes a la obra Adecuacion en plaza de acceso y adecuacion de escalera de emergecnia metalica, en el Instituto de Ciencias de la Educación.

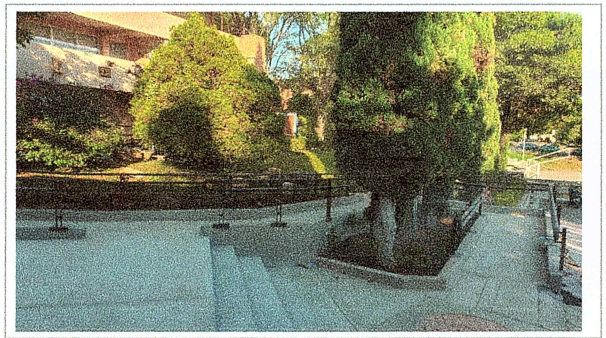

F1: Vista 3 de los trabajos pertenecientes a la obra Adecuacion en plaza de acceso y adecuacion de escalera de emergecnia metalica, en el Instituto de Ciencias de la Educación.

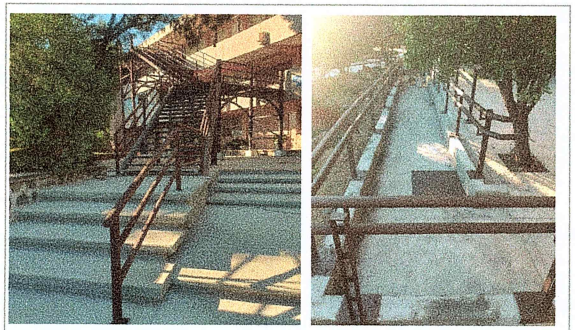

F1: Vista 4 de los trabajos pertenecientes a la obra Adecuacion en plaza de acceso y adecuacion de escalera de emergecnia metalica, en el Instituto de Ciencias de la Educación.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD: 3

Nombre de la obra: **Mejoras de espacios académicos en materia de inclusión y protección civil para el Campus Norte (Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

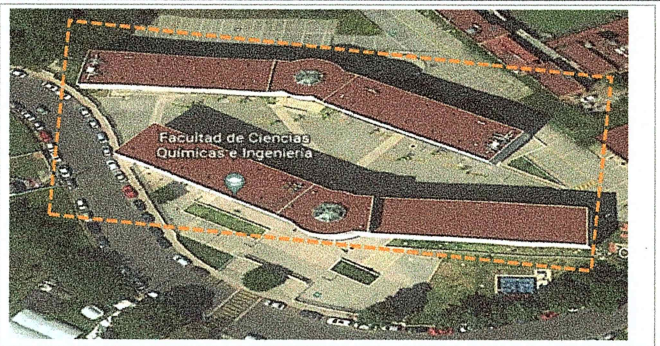

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

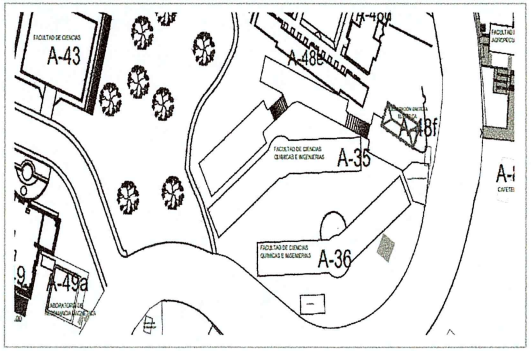

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

FOTOS ANTES



Fachada de la Facultad de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería FCQel

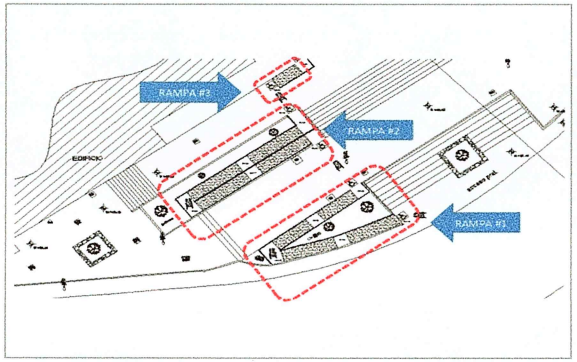

3 Rampas de accesibilidad en el edificio A-36 de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería.

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del primer trimestre 2025, corresponde a los espacios que se intervinieron mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRITPTIVO.



F1: Vista sur del sitio donde se desarrollarán los trabajos preliminares y de albañilerías para la construcción de Rampa 1 en el acceso del edificio A-36 de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería.



F2: Imagen general del área exterior en el que se implementaran trabajos preliminares y de albañilerías en la construcción de Rampa 2 de accesibilidad del edificio A-36 de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería.



F3: Fachada oriente del sitio en el que se ejecutaran trabajos preliminares y de albañilerías en la consecución de la construcción de Rampa 3 de acceso del edificio A-36 de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD 3

Nombre de la obra: **Mejoras de espacios académicos en materia de inclusión y protección civil para el Campus Norte (Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

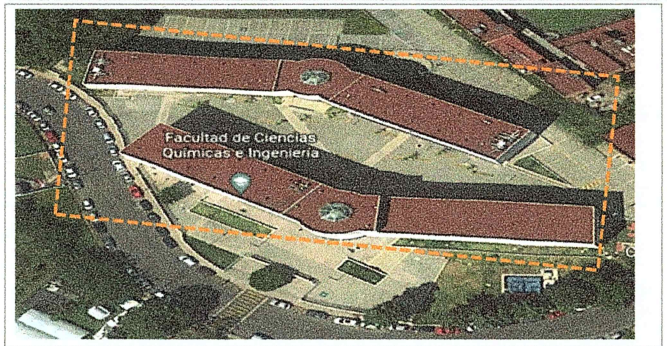

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

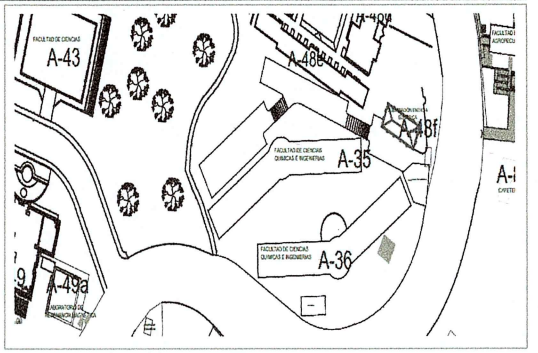


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

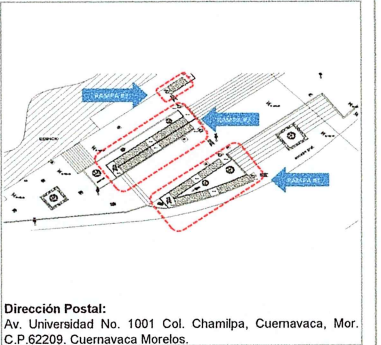


Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

DURANTE

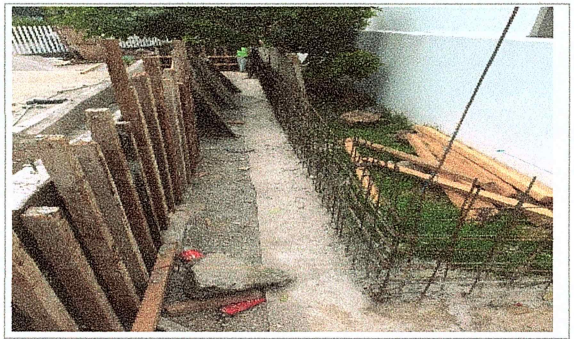


F2:Trabajos, Habilitación de Acero y Cimbrado para Muro, en el edificio A-36 de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería.

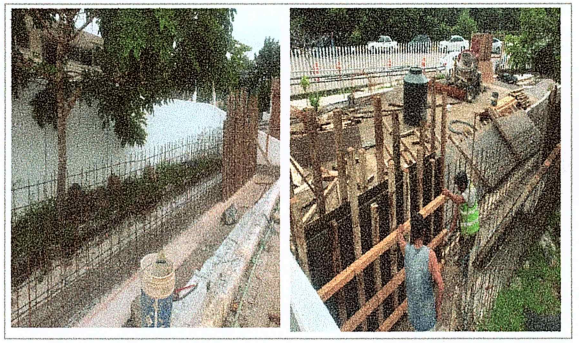


F1:Trabajos, Habilitación de Acero y Cimbrado para Muro, en el edificio A-36 de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería.




F2:Trabajos, Colado de Concreto para Muro y Descimbrado, en el edificio A-36 de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería.

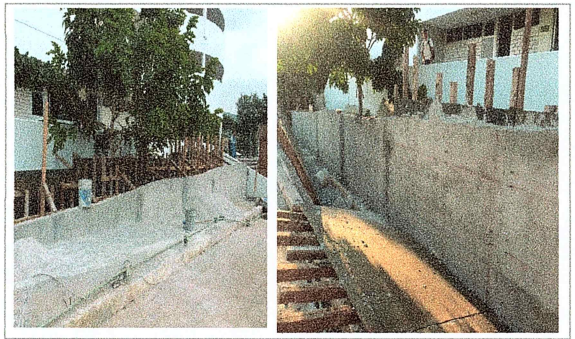

F2:Trabajos, Colado de Concreto para Muro y Descimbrado, en el edificio A-36 de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería.

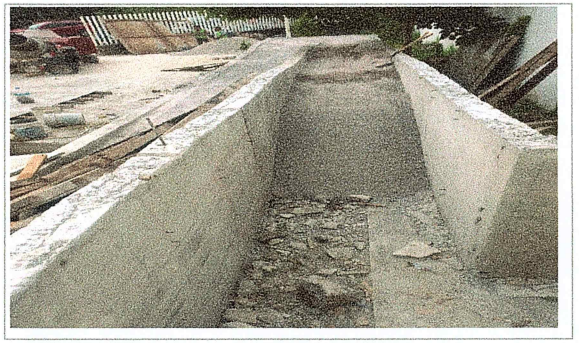

F2:Trabajos, Suministro de Relleno de Material Inerte, en el edificio A-36 de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería.

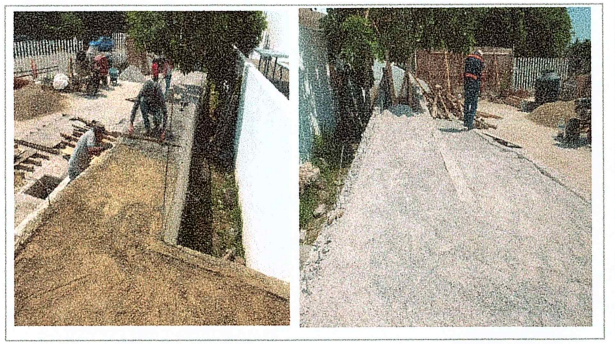

F3: Trabajos, Suministro de Relleno de Material Inerte, en el edificio A-36 de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD 3

Nombre de la obra: **Mejoras de espacios académicos en materia de inclusión y protección civil para el Campus Norte (Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

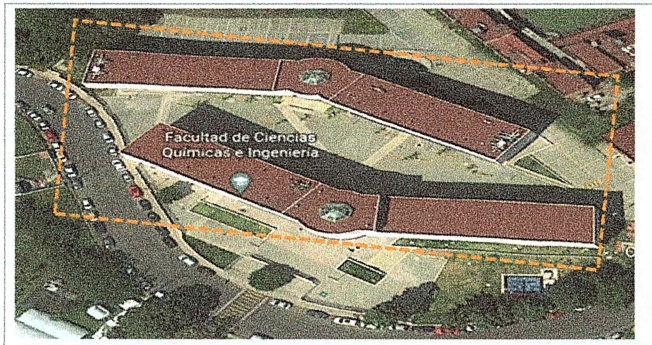


CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

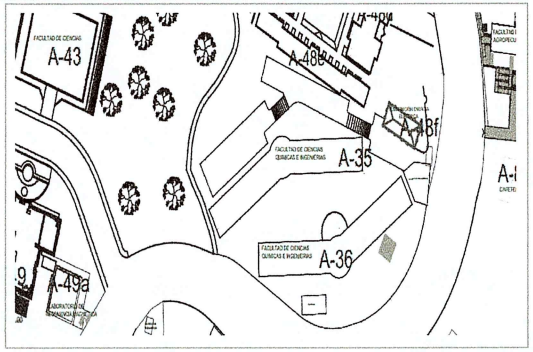

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

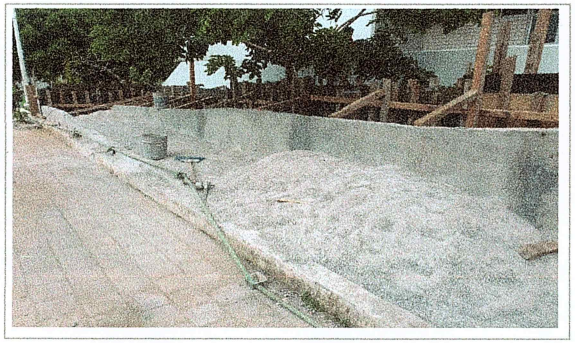

F3: Trabajos, Adecuacion de Linea de Alimentacion Electrica, en el edificio A-36 de la Facultad de Ciencias Quimicas e Ingenieria.



F1:Trabajos, Elaboracion de Piso de Concreto Reforzado con Malla Electrosoldada, en el edificio A-36 de la Facultad de Ciencias Quimicas e Ingenieria.




F1: Trabajos, Demolición por medios manuales de Guarnición existente, en el edificio A-36 de la Facultad de Ciencias Quimicas e Ingenieria.



F1:Trabajos, Habilitación de Acero, Cimbrado y Colado de Guarnición de Concreto hecho en sitio, en el edificio A-36 de la Facultad de Ciencias Quimicas e Ingenieria.



F1:Trabajos, Suministro y colocación de Tapa para cuarto de Maquinas en el edificio A-36 de la Facultad de Ciencias Quimicas e Ingenieria.

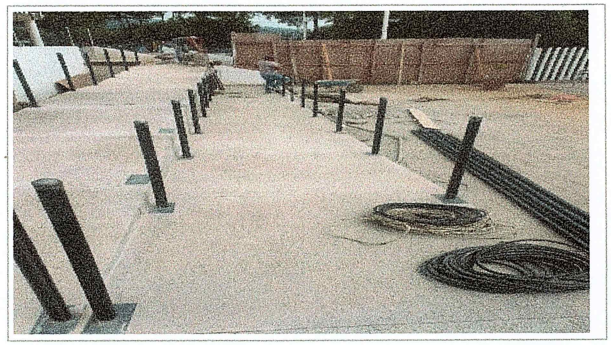

F1:Trabajos, Fabricación e Instalación de Barandal de Herreria en el edificio A-36 de la Facultad de Ciencias Quimicas e Ingenieria.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD 3

Nombre de la obra: **Mejoras de espacios académicos en materia de inclusión y protección civil para el Campus Norte (Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

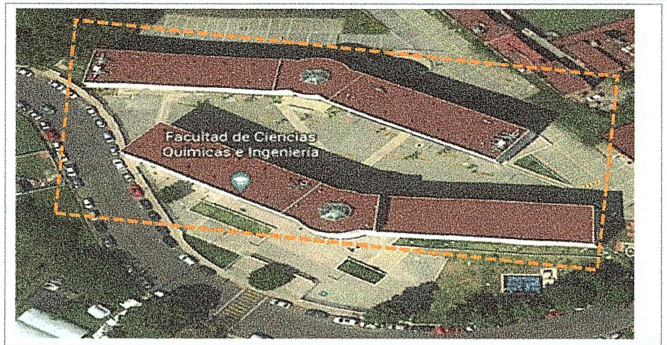


CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

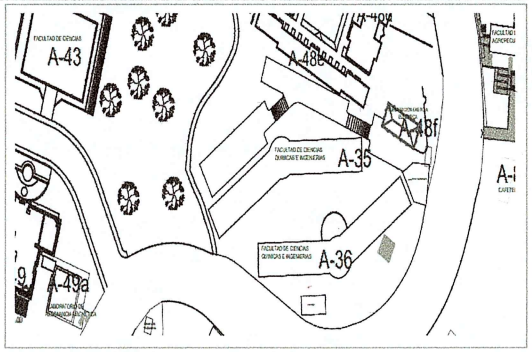

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

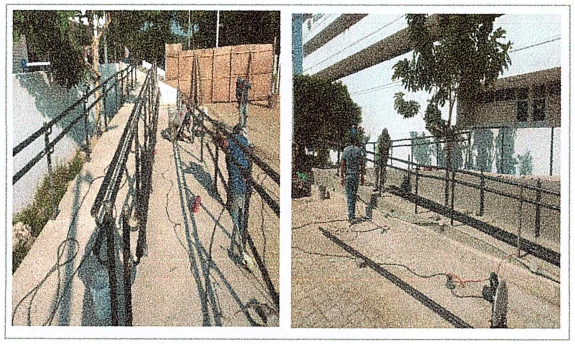

F2:Trabajos, Fabricación e Instalación de Barandal de Herrería en el edificio A-36 de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería.



F1:Trabajos, Habilitación de acero y Elaboracion de concreto reforzado con acero para columna, en el edificio A-36 de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería.

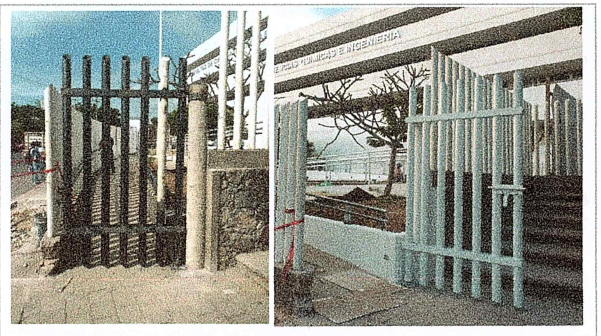

F1:Trabajos, Fabricación de Puerta Abatible a base de Herrería en el edificio A-36 de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería.



F1:Trabajos, Suministro y colocación de Vegetación, en el edificio A-36 de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería.



F1: Trabajos, Elaboración de Señalización, en el edificio A-36 de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería.



F1,2 y3: Trabajos, Limpieza Fina de la obra para entrega, en el edificio A-36 de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD 3

Nombre de la obra: **Mejoras de espacios académicos en materia de inclusión y protección civil para el Campus Norte (Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

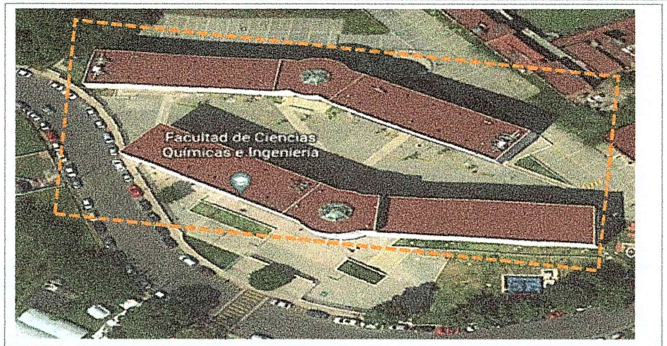

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

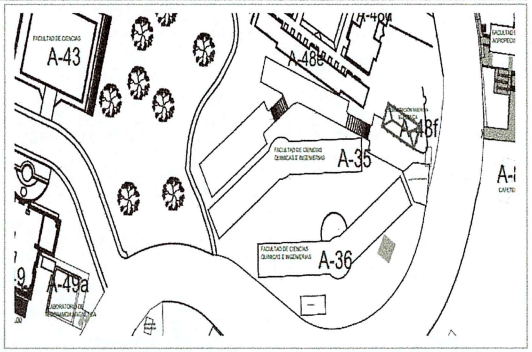

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.


FOTOS DESPUÉS



Vista 1, de los trabajos pertenecientes a la obra Construccion de Rampas de accesibilidad, en el edificio A-36 de la Facultad de Ciencias Quimicas e Ingenieria.



Vista 2, de los trabajos pertenecientes a la obra Construccion de Rampas de accesibilidad, en el edificio A-36 de la Facultad de Ciencias Quimicas e Ingenieria.

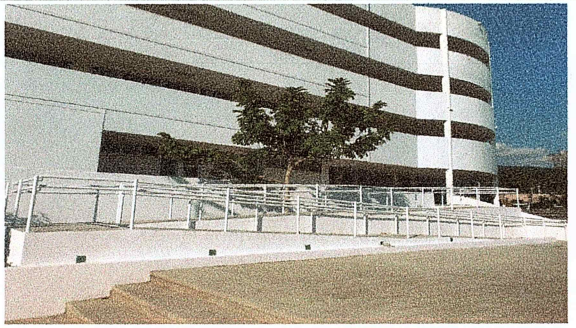

Vista 3, de los trabajos pertenecientes a la obra Construccion de Rampas de accesibilidad, en el edificio A-36 de la Facultad de Ciencias Quimicas e Ingenieria.



Vista 4, de los trabajos pertenecientes a la obra Construccion de Rampas de accesibilidad, en el edificio A-36 de la Facultad de Ciencias Quimicas e Ingenieria.



Vista 5, de los trabajos pertenecientes a la obra Construccion de Rampas de accesibilidad, en el edificio A-36 de la Facultad de Ciencias Quimicas e Ingenieria.



Vista 6, de los trabajos pertenecientes a la obra Construccion de Rampas de accesibilidad, en el edificio A-36 de la Facultad de Ciencias Quimicas e Ingenieria.

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydee León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2025
EJERCICIO FISCAL	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

100%

PRIORIDAD 3 Nombre de la obra: **Mejoras de espacios académicos en materia de inclusión y protección civil para el Campus Norte (Facultad de Enfermería)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Dirección Postal:
Pico de Orizaba #2, Col. Los Volcanes, C.P. 62350, Cuernavaca, Morelos.

FOTOS ANTES

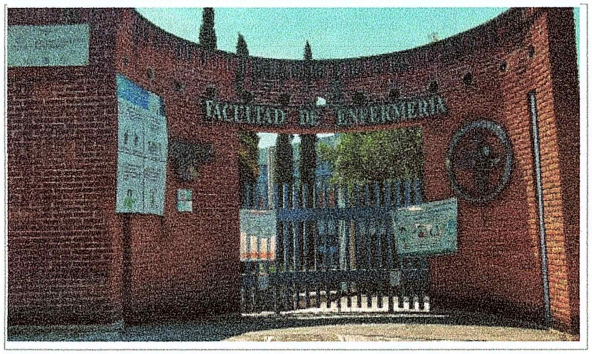

Fachada de la Facultad de Enfermería.

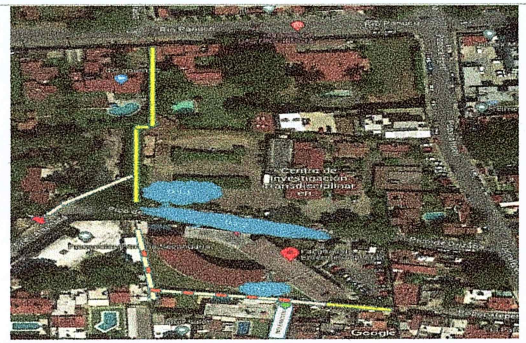

Vista aerea con la ubicación del sitio en que se ejecutaran los trabajos para la Posición de escalera de emergencia y condensador en la Facultad de Enfermería.

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del primer trimestre 2025, corresponde a los espacios que se intervinieron mediante el fondo.


VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRITPTIVO.



F1: Construcción de escaleras de emergencia e intervención de espacios para traslado a sitio de punto de reunión seguro en la Facultad de Enfermería



F1: Vista sur del espacio donde se ejecutaran los trabajos preliminares, demoliciones, acarreos así como trabajos de estructura para la construcción de escalera de emergencia en la Facultad de Enfermería.

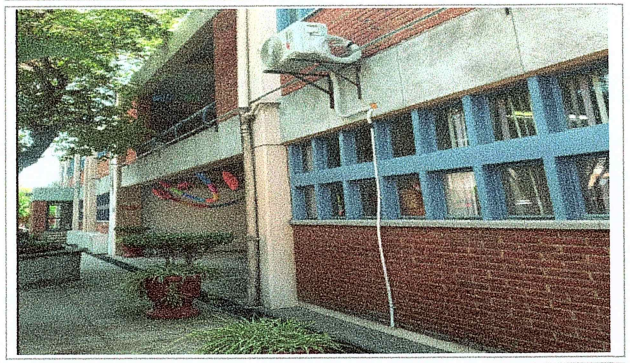

F1: Fachada principal donde se implementaran los trabajos de albañilerías para la reubicación de condensador en la Facultad de Enfermería.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

100%

PRIORIDAD 3 Nombre de la obra: **Mejoras de espacios académicos en materia de inclusión y protección civil para el Campus Norte (Facultad de Enfermeria)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Dirección Postal:
Pico de Orizaba #2, Col. Los Volcanes, C.P. 62350, Cuernavaca, Morelos.



F1: Área donde se ejecutaran acciones preliminares, demoliciones, acarreos para los trabajos de Adecuación de rejilla pluvial y cimentación de Escalera de emergencia en la Facultad de Enfermería.

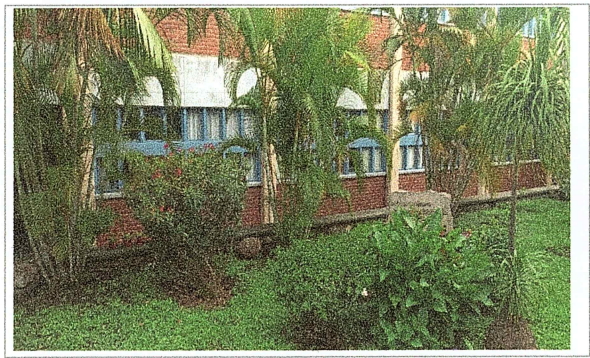



F1: Área jardinada frente a edificio donde se realizaran trabajos de Trasplante de flora para acceso de escalera de emergencia en la Facultad de Enfermería.

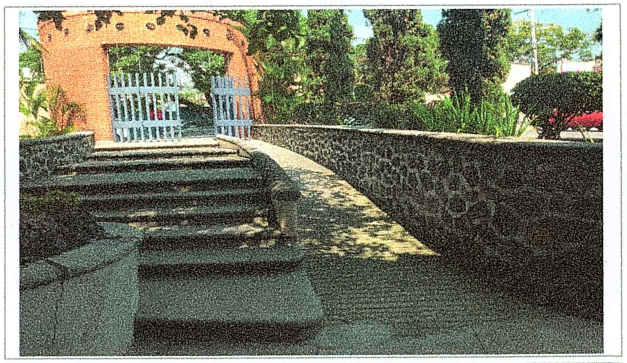

F1: Vista norte del área donde se generaran trabajos preliminares, demoliciones, acarreos para la construcción de muro de mampostería, escalones en acceso a punto de reunión, en acceso de la Facultad de Enfermería.

FOTOS DURANTE

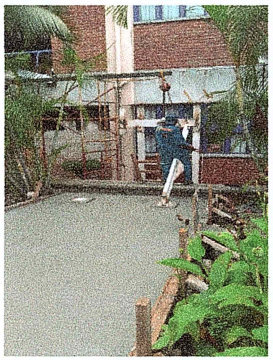


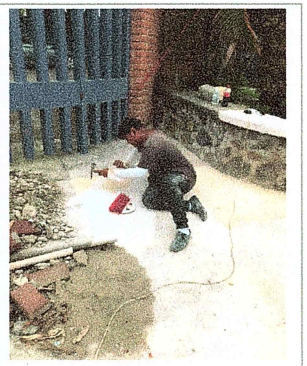


F1: Trabajos, Colocación de Concreto hecho en obra para Firme de Rampa, en el Centro de Investigación en Ciencias.



F1: Trabajos, Colocación de Concreto hecho en obra para Firme de Rampa, en el Centro de Investigación en Ciencias.

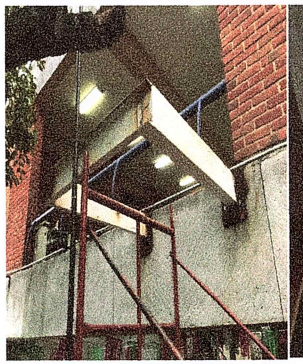

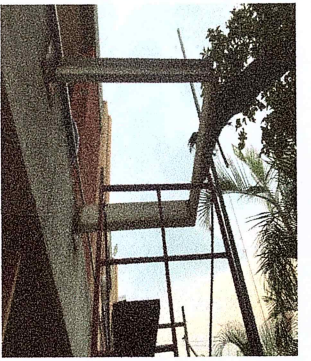

F1: Trabajos, Elaboracion y Colocacion de Barandal de Herreria, en el Centro de Investigación en Ciencias.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

100%

PRIORIDAD **3** Nombre de la obra: **Mejoras de espacios académicos en materia de inclusión y protección civil para el Campus Norte (Facultad de Enfermería)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
Pico de Orizaba #2, Col. Los Volcanes, C.P. 62350, Cuernavaca, Morelos.




F1: Trabajos, Habilitado de Acero Misceláneo/Estructura para Escalera de Emergencia, en la Facultad de Enfermería.

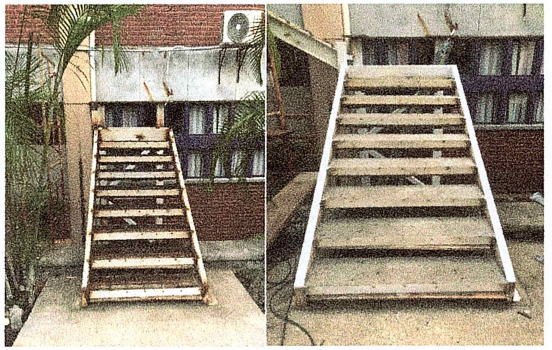


F1: Trabajos, Colocación de Piso de Concreto hecho en obra para escalones /escalera de Emergencia, en la Facultad de Enfermería.




F1: Trabajos, Suministro y Colocación de Barandal de Herrería, para escalera de Emergencia, en la Facultad de Enfermería.

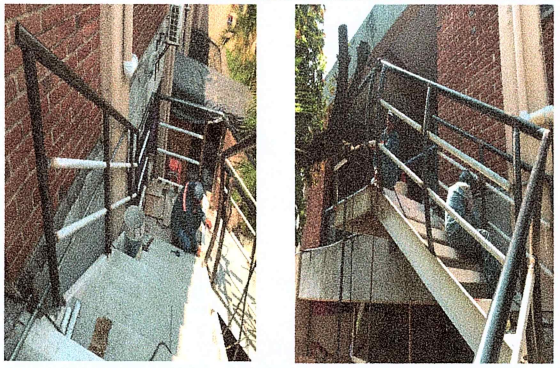

F1: Trabajos, Aplicación de Pintura en Estructura /Escalera de Emergencia, en la Facultad de Enfermería.

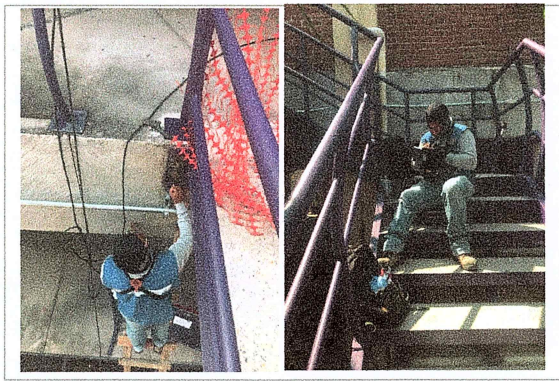

F1: Trabajos, Aplicación de prueba de líquidos penetrantes en escalera, en la Facultad de Enfermería.

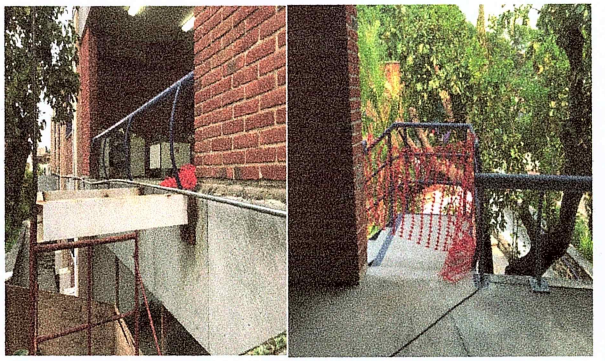

F1: Trabajos, Desmontaje y adecuación de barandal Metálico, para acceso a escalera de emergencia, la Facultad de Enfermería.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

100%

PRIORIDAD 3

Nombre de la obra: **Mejoras de espacios académicos en materia de inclusión y protección civil para el Campus Norte (Facultad de Enfermería)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO




CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

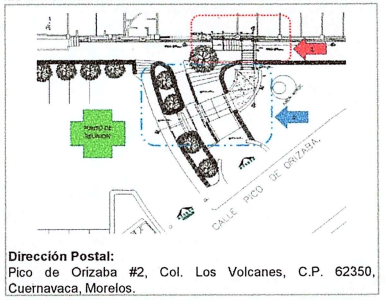

Dirección Postal:
Pico de Orizaba #2, Col. Los Volcanes, C.P. 62350, Cuernavaca, Morelos.

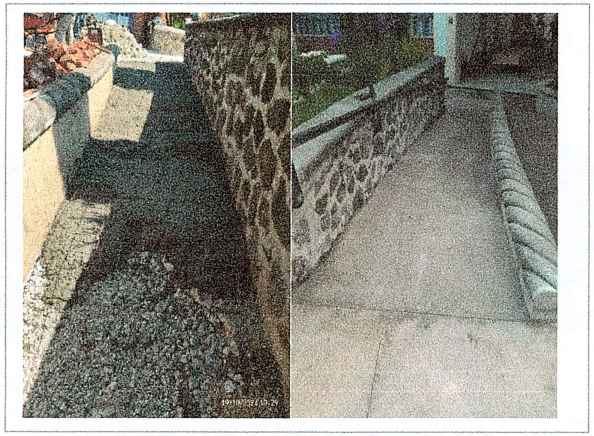


F1: Trabajos, Suministro y Colocación de Piso de Concreto hecho en obra Reforzado con malla electrosoldada para rehabilitacion de rampa, en la Facultad de Enfermería.

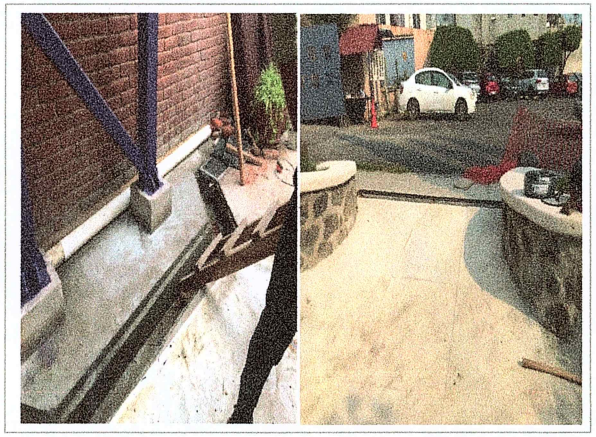


F1: Trabajos, Forjado de Trinchera Pluvial de concreto, en la Facultad de Enfermería.



F1: Trabajos, Fabricación y colocación de rejilla pluvial, en la Facultad de Enfermería.

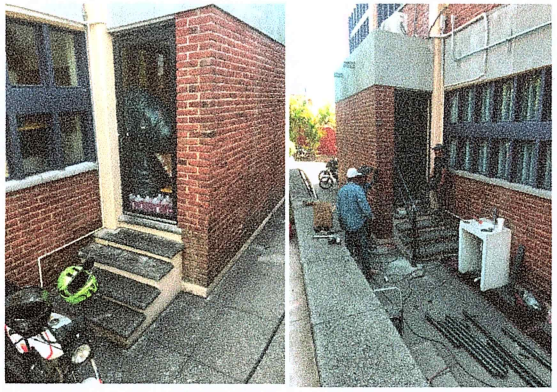

F1: Trabajos, Aplicación de pintura, en columnas trabes y plafones así como la Elaboración, suministro y colocación de Brandal de herrería , en la Facultad de Enfermería.

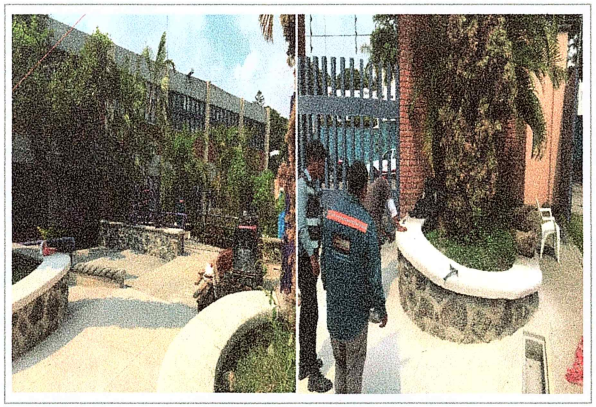

F1: Trabajos, Elaboración de acabados en corona de muro de Piedra existentes elaborados con martelina en la Facultad de Enfermería.



F1: Trabajos, Reubicación de Arbustos, así como el suministro y sembrado de pasto, dentro del área del proyecto, en la Facultad de Enfermería.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

100%

PRIORIDAD 3

Nombre de la obra: **Mejoras de espacios académicos en materia de inclusión y protección civil para el Campus Norte (Facultad de Enfermería)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO




CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Dirección Postal:
Pico de Orizaba #2, Col. Los Volcanes, C.P. 62350, Cuernavaca, Morelos.

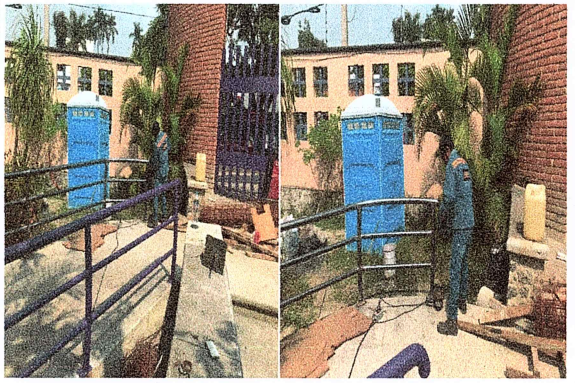

16. Trabajos, Suministro y Colocación de Barandal de Herreria sobre andador, en la Facultad de Enfermería.



17. Trabajos, Suministro y Aplicación de Pintura de esmalte en portón de acceso en la Facultad de Enfermería

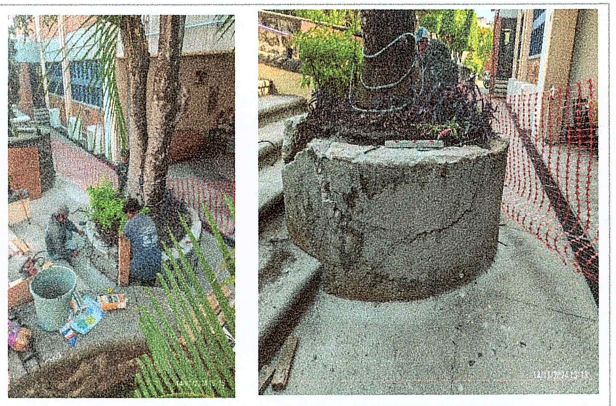


18. Trabajos, Rehabilitación de Jardinera existente, en la Facultad de Enfermería



F1: Trabajos, Desmantelamiento de Línea de alimentación eléctrica, así como la desconexión y conexión eléctrica de equipo de aire acondicionado con tubería Conduit y cable sobre muro, en la Facultad de Enfermería.



F1: Trabajos para Elaboración de señalización, en la Facultad de Enfermería.

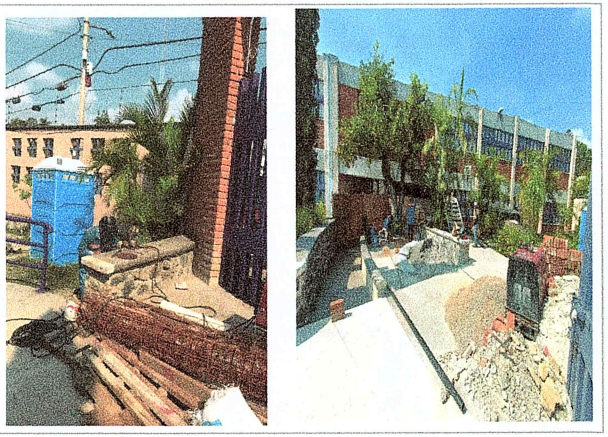

F1: Trabajos, Limpieza Fina de la obra para entrega, en la Facultad de Enfermería.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

100%

PRIORIDAD 3

Nombre de la obra: **Mejoras de espacios académicos en materia de inclusión y protección civil para el Campus Norte (Facultad de Enfermería)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Dirección Postal:
Pico de Orizaba #2, Col. Los Volcanes, C.P. 62350, Cuernavaca, Morelos.

FOTOS DESPUES




F1: Vista 1, de los trabajos pertenecientes a la obra Construccion de Escalera de emergencia y adecuacion de pasillos, vestibulos de acceso, en la Facultad de Enfermería.

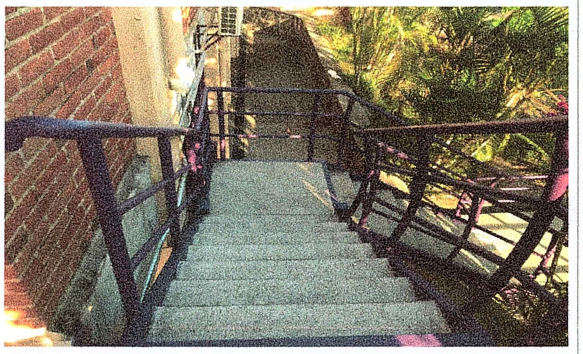


F1: Vista 2, de los trabajos pertenecientes a la obra Construccion de Escalera de emergencia y adecuacion de pasillos, vestibulos de acceso, en la Facultad de Enfermería.



F1: Vista 3, 4 y 5, de los trabajos pertenecientes a la obra Construccion de Escalera de emergencia y adecuacion de pasillos, vestibulos de acceso, en la Facultad de Enfermería

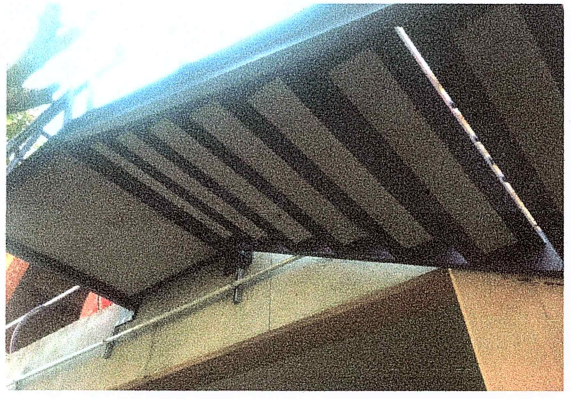

F1: Vista 3, 4 y 5, de los trabajos pertenecientes a la obra Construccion de Escalera de emergencia y adecuacion de pasillos, vestibulos de acceso, en la Facultad de Enfermería

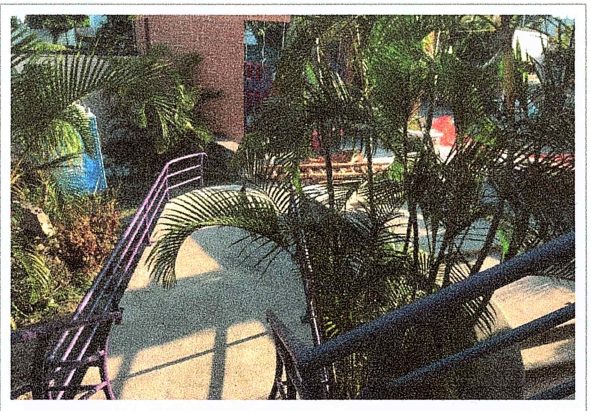

F1: Vista 3, 4 y 5, de los trabajos pertenecientes a la obra Construccion de Escalera de emergencia y adecuacion de pasillos, vestibulos de acceso, en la Facultad de Enfermería



F1: Vista 6 y 7, de los trabajos pertenecientes a la obra Construccion de Escalera de emergencia y adecuacion de pasillos, vestibulos de acceso, en la Facultad de Enfermería

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

2024	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2025
EJERCICIO FISCAL	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

100%

PRIORIDAD 3 Nombre de la obra: **Mejoras de espacios académicos en materia de inclusión y protección civil para el Campus Norte (Facultad de Enfermería)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

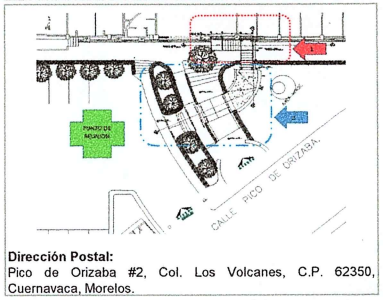

Dirección Postal:
Pico de Orizaba #2, Col. Los Volcanes, C.P. 62350, Cuernavaca, Morelos.




F1: Vista 8, de los trabajos pertenecientes a la obra Construccion de Escalera de emergencia y adecuacion de pasillos, vestibulos de acceso, en la Facultad de Enfermería



F1: Vista 9, de los trabajos pertenecientes a la obra Construccion de Escalera de emergencia y adecuacion de pasillos, vestibulos de acceso, en la Facultad de Enfermería



F1: Vista 10 y 11, de los trabajos pertenecientes a la obra Construccion de Escalera de emergencia y adecuacion de pasillos, vestibulos de acceso, en la Facultad de Enfermería

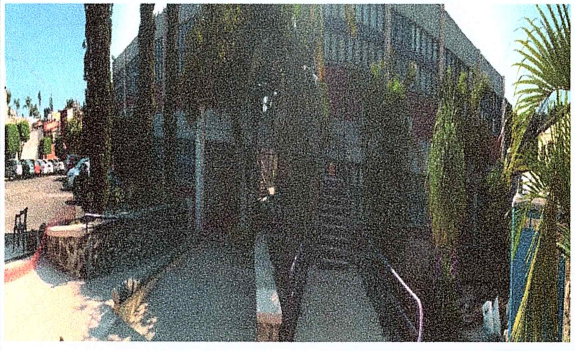

F1: Vista 12, de los trabajos pertenecientes a la obra Construccion de Escalera de emergencia y adecuacion de pasillos, vestibulos de acceso, en la Facultad de Enfermería

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2025
EJERCICIO FISCAL	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

PRIORIDAD 3 Nombre de la obra: **Mejoras de espacios académicos en materia de inclusión y protección civil para el Campus Norte(Centro de Investigación en Ciencias (CInC)**


Porcentaje de avance

100%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

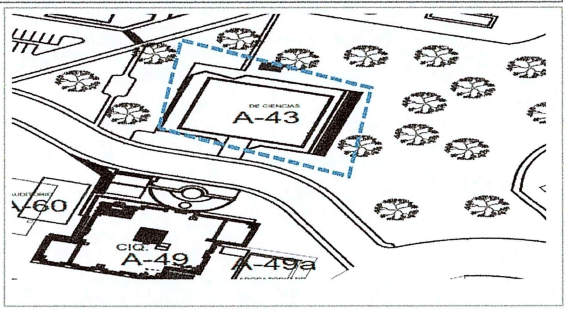

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

FOTOS ANTES



Fachada del Centro de Investigación en Ciencias CInC.



F1: Vista norte de la zona donde se ejecutaran los trabajos preliminares y de albañilerías en la construcción de Rampa para personas con discapacidad del Centro de Investigación en Ciencias.

Observaciones :

Lo presentado en el Reporte Fotográfico del primer trimestre 2025, corresponde a los espacios que se intervinieron mediante el fondo.

VER DETALLE EN INFORME DE REPORTE DESCRITPTIVO.



F1: Vista norte de la zona donde se ejecutaran los trabajos preliminares y de albañilerías en la construcción de Rampa para personas con discapacidad del Centro de Investigación en Ciencias.



F1: Imagen oeste del área exterior donde se generaran los trabajos preliminares y de albañilerías para la construcción de Rampa para personas con discapacidad, Centro de Investigación en Ciencias.



F1: Vista Sureste de la zona donde se ejecutaran los trabajos preliminares y de albañilerías en la construcción de Rampa para personas con discapacidad del Centro de Investigación en Ciencias.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024

EJERCICIO FISCAL

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre
2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

100%


PRIORIDAD: 3

Nombre de la obra: **Mejoras de espacios académicos en materia de inclusión y protección civil para el Campus Norte(Centro de Investigación en Ciencias (CInC)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

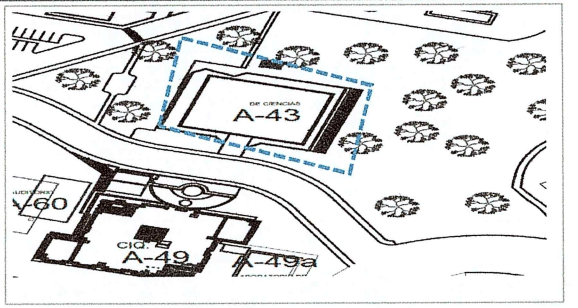

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.


FOTOS DURANTE



F1: Trabajos, Colocación de Concreto hecho en obra para Firme de Rampa, en el Centro de Investigación en Ciencias.



F1: Trabajos, Elaboracion y Colocacion de Barandal de Herreria, en el Centro de Investigación en Ciencias.

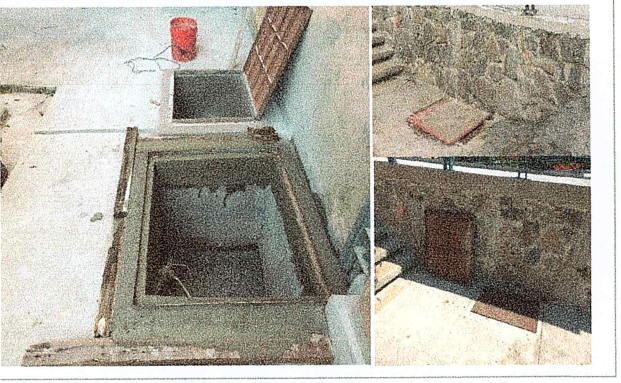

F1: Trabajos, Albañilerias para la Renivelacion de Registros, en el Centro de Investigación en Ciencias.



F1: Trabajos, Suministro y colocación de Vegetación como: pasto, bugambilia, ciprés y arrayan, en área exterior, del Centro de Investigación en Ciencias



F1: Trabajos, Suministro y colocación de Vegetación como: pasto, bugambilia, ciprés y arrayan, en área exterior, del Centro de Investigación en Ciencias



F1: Trabajos, Elaboración de señalización del Centro de Investigación en Ciencias

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2024	FAM	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Primer Trimestre 2025
EJERCICIO FISCAL	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

PRIORIDAD 3 Nombre de la obra: **Mejoras de espacios académicos en materia de inclusión y protección civil para el Campus Norte(Centro de investigación en Ciencias (CInC)**


Porcentaje de avance

100%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

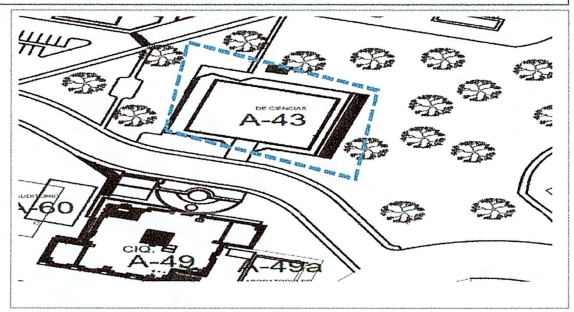

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P.62209. Cuernavaca Morelos.

FOTOS DESPUÉS



F1: Vista Frontal de la Rampa para personas con discapacidad en el Centro de Investigación en Ciencias



F1: Vista 2 de la Rampa para personas con discapacidad en el Centro de Investigación en Ciencias



F1: Vista 3 de la Rampa para personas con discapacidad en el Centro de Investigación en Ciencias

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Aydeé León Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".
